

南安市九都镇大中型水库 “润泽库区、造福移民”工程实施方案

(修编稿)



福建省水利水电勘测设计研究院有限公司

2025. 2



审查：蔡 侃 朱能兵 陈义华 林秀娥 林 晓

校核：黄勇冰 王海燕 陈恩理 林若雅 孙仁杭

编写：程菲婕 杨维强 黄勇冰 谢晓凡 任舒雯 王骏伟

黄颖森 郑妙

福建省水利厅

闽水函〔2024〕1280号

福建省水利厅关于开展 2025年度大中型水库“润泽库区、造福移民” 工程建设工作的通知

各设区市水利局，相关县（市、区）水利局：

为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，认真落实省委、省政府有关部署要求，学习运用“千万工程”经验，推动大中型水库库区和移民安置区乡村全面振兴，经研究，决定开展全省2025年度大中型水库“润泽库区、造福移民”工程建设。现就有关事项通知如下：

一、工作安排

按照《福建省大中型水库“润泽库区、造福移民”工程实施方案》，经前期申报、专家评选、会议审议，研究确定全省2025年度大中型水库“润泽库区、造福移民”工程项目10个，其中：福清、诏安、新罗、建阳等4个县（市、区）申报项目评选为B档；蕉城、福安、南安、南靖、三元、松溪等6个县（市、区）申报项目评选为C档。10个县（市、区）项目50%补助资金已下达。

二、实施要求

（一）严格实施程序。各地要按照“产业兴旺、生态宜居、

乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴发展总要求，在专家评选通过的实施方案基础上，因地制宜优化完善“润泽库区、造福移民”工程建设内容，项目中包含安征迁任务的，必须充分论证、评估风险。项目确定后，由设区市水利局组织实施方案审批，县（市、区）组织实施，项目竣工后，由设区市水利局组织竣工验收。

（二）限期按时完成。各地要把“润泽库区、造福移民”工程项目建设作为 2025 年度重点工作来抓，加大统筹协调力度，配齐配强人员力量，全力以赴，有效推进，切实把工作抓紧抓实抓到位，确保工程项目建设序时推进。2025 年一季度各地要完成前期工作，全面开工，2025 年 9 月底完成主体建设任务，2025 年 10 月份组织开展完工验收、结算审核，11 月完成量价复核，2026 年一季度完成竣工验收、决算审计等有关工作。

（三）加强监督管理。各级水利部门要加强“润泽库区、造福移民”工程项目建设事前、事中、事后全过程监管，发现问题及时解决。省移民发展中心专项推进，对项目建设实行点对点全程跟踪督导，并在项目建设完工后组织实施建设项目绩效评价工作。



（此件依申请公开）

抄送：福建省水利水电工程移民发展中心。



南安市九都镇大中型水库“润泽库区，造福移民”工程 实施方案专家组意见

2025年1月16日，南安市水利局组织召开《南安市九都镇大中型水库“润泽库区，造福移民”工程实施方案》评审会。与会专家查阅了相关资料，听取了编制单位福建省水利水电勘测设计研究院有限公司关于项目实施方案编制情况的介绍，结合参会各单位提出的意见和建议，专家组经认真讨论，形成意见如下：

一、总体评价

《南安市九都镇大中型水库“润泽库区，造福移民”工程实施方案》需修改完善后，方可作为下一步工作依据。

二、具体意见和建议

- 1、补充完善项目区现状基本情况、存在的主要问题、项目建设必要性，合理确定项目建设内容和规模。
- 2、核实项目建设用地的土地属性；复核环库湾线性公园和观景平台等用地是否位于山美水库的管理范围之内，确保项目顺利实施。
- 3、明确道路等级和设计标准。
- 4、补充交安设施，优化路面结构。
- 5、环境综合整治提升需整体考虑，提升设计时需与现状环境协调一致。
- 6、植物组团配置建议疏密有致、适当留白，为后续人群活动提供户外的活动场地，调整地被密度。
- 7、应考虑后续露营和房车营地的预留规划、多考虑和预留后续能够盈利、造血的项目，为后续的管维提供资金的保障。

8、饰面材料运用上不要太杂，选择当地特色元素材料，规格尽量简洁，符合相关标准即可。

9、复核材料预算价格及取费标准。

10、根据闽水建设（〔2021〕5号）的规定采用概算定额重新编制工程概算。

11、其他意见详见各专家个人意见表。

专家组：罗毅 孙阿华 叶超 郑素萍

专家组长：叶超

2025 年 1 月 16 日

南安市九都镇大中型水库 “润泽库区，造福移民”工程 实施方案专家组意见回复函

具体意见和建议

1、补充完善项目区现状基本情况、存在的主要问题、项目建设必要性，合理确定项目建设内容和规模。

回复：已补充，详见5—26页。

2、核实项目建设用地的土地属性；复核环库湾线性公园和观景平台等用地是否位于山美水库的管理范围之内，确保项目顺利实施。

回复：已核实

3、明确道路等级和设计标准。

回复：已核实，详见30页。

4、补充交安设施，优化路面结构。

回复：已补充，详见65—73页。

5、环境综合整治提升需整体考虑，提升设计时需与现状环境协调一致。

回复：已按照意见要求进行优化修改

6、植物组团配置建议疏密有致、适当留白，为后续人群活动提供户外的活动场地，调整地被密度。

回复：已修改，详见85—87页。

7、应考虑后续露营和房车营地的预留规划、多考虑和预留后续能够盈利、造血的项目，为后续的管维提供资金的保障。

回复：已修改，详见85页

8、饰面材料运用上不要太杂，选择当地特色元素材料，规格尽量简洁，符合相关标准即可。

回复：已修改

9、复核材料预算价格及取费标准。

回复：已修改，详见103—107页。

10、根据闽水建设（〔2021〕5号）的规定采用概算定额重新编制工程概算。

回复：已修改，详见107—108页。

11、其他意见详见各专家个人意见表。

回复：已参考专家个人意见并进行修改

目录

前言	1
1 概述	3
1.1 项目区经济社会状况	4
1.2 水库移民基本情况	7
1.3 九都镇“十四五”移民后扶工作情况	9
1.4 项目区水库移民基本情况及移民生产生活现状	10
1.5 项目区移民生产生活现状	15
1.6 目前存在的主要问题和困难	15
2 建设目标和总体布局	18
2.1 建设目标	18
2.2 总体布局	19
2.3 设计主题	22
3 建设任务和方案	25
3.1 设计依据	25
3.2 设计规模 and 标准	26
3.3 新东村建设方案	31
3.4 金圭村建设方案	81
4 施工组织设计	89
4.1 施工条件	89
4.2 主体工程施工	92
4.3 施工交通运输	98
4.4 施工总布置	99
4.5 施工期水环境保护措施	99
4.6 施工总进度	101
4.7 各类措施汇总表	101

5 投资规模及资金筹措	103
5.1 项目总投资	103
5.2 投资指标及资金筹措方案	107
5.3 设计概算表	107
6 项目实施效益预测分析	109
6.1 经济效益预测分析	109
6.2 社会效益预测分析	110
7 实施保障措施	113
7.1 制度建设	113
7.2 环境效益预测分析	113
7.3 组织保障	114
7.4 移民权益保障	116

附件一：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程实施方案概算书（附本册后）

附件二：南安市九都镇大中型水库“润泽库区、造福移民”工程实施方案附图（另见单行本）

前言

为贯彻党的十九大精神，加强福建省大中型水库农村移民后期扶持工作，根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《水利部关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》（水移民〔2018〕208号）、《福建省水利水电工程移民发展中心关于做好2025年度大中型水库移民重点项目储备工作的通知》（闽移发函〔2024〕74号）、福建省《关于实施乡村振兴战略的实施意见》、2021年1月25日出台的《福建省水利厅关于印发〈“十四五”大中型水库移民后扶项目示范区建设总体方案〉的通知》等政策文件要求，南安市九都镇为改善南安山美水九都镇移民安置点的人居环境问题，进一步打造乡村振兴示范点，特申报2025年福建省移民后期扶持建设项目。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“十六字”治水方针，认真贯彻落实《中共福建省委、福建省人民政府关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》，以美丽移民村建设和产业转型升级为重点助力乡村振兴、融合水利发展，以生态塑形、以文化铸魂、以产业造血，推进库区和移民安置区经济社会可持续性发展，不断增强库区移民的幸福感、获得感、安全感，满足库区移民对美好生活的向往。全力实施大中型水库“润泽库区、造福移民”工程，推动水库库区和移民安置区特色产业发展、人居环境改善、基础设施建设、公共服务提升，促进水库移民后扶工作与乡村振兴有机融合，提高库区移民扶持实效，加快建设库区宜居宜业和美乡村。

为顺利开展后期扶持项目建设，因地制宜、科学规划、统筹兼顾，充分发挥库区移民后期扶持项目优势特点，推进我省新时期水利水电事业健康发展，维护社会主义和谐社会、助力乡村振兴战略实施，按照《福建省水利水电工程移民发展中心关于印发《福建省大中型水库“润泽库区、造福移民”工程建设指南》的通知》（闽移发函〔2024〕74号）相关要求，受南安市九都镇人民政府委托，

我院编制了《南安市九都镇大中型水库“润泽库区、造福移民”工程实施方案》，建设的主要内容是在充分征求移民诉求、意愿，结合现场实际情况，与九都镇人民政府、九都镇水利局（移民中心）反复讨论后形成的，以实现“村美、业兴、人和、民富”为主要设计目标，以切实改善移民安置区人居环境，完善基础设施，提高移民生活质量为最终落脚点。

1 概述

工程项目位于福建省南安市九都镇，该镇因建设水库而经历了两次大规模移民，约有 2.3 万多人口外迁。这一过程始于 1972 年和 1997 年，导致九都镇成为福建省南安市移民人口最多的乡镇之一。根据省移民中心、省财政厅的要求，本项目将认真落实“润泽库区、造福移民”工程专项资金使用。

南安市九都镇大中型水库“润泽库区、造福移民”工程主要建设内容以“美丽移民村建设”为主，完善、加强库区和移民安置区基础设施和环境建设，改善移民生活条件和生活环境；同时结合现有低空经济产业及文旅产业，加快旅游康养产业发展，打造旅游康养精品工程，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，加快补齐移民民生社会事业短板，打通“绿水青山变成金山银山”的转换通道，改“输血”为“造血”，实现“产业优、百姓富、生态美”的设计目标。

南安市九都镇大中型水库“润泽库区、造福移民”工程建设表

建设地点		项目类型		建设内容
乡镇	建制村			
九都镇	新东村	美丽移民村建设	旧建筑改造提升	移民文化展示中心立面提升 754 m²，库湾路戏台改造 130 m²，水泵房立面改造 256 m²
			环库绿化景观提升	移民文化广场绿化提升 1700 m²，移民文化广场入口提升 440 m²，环库湾线性公园 4113 m²
			村容村貌提升	库湾路路口提升 100 m²，休闲长廊提升 290 m²，库湾路起点文化展示墙 27m，观景平台提升 150 m²，亭子及周边修复 1 项，小挡墙建设 180m，垃圾桶 16 个，智慧导览导视系统及夜景 1 项
		公共基础设施建设	农村交通设施	库湾路路面提升 1405m
		乡村文化建设	文化卫生设施	水利文化园 1536 m²，库湾路公共停车场 1293 m²，无动力公园 1965 m²
	金圭村	美丽移民村建设	环库绿化景观提升	步道提升 665 m²，园路挡墙 310m，花池提升 160m，绿化提升 3200 m²；智慧导览导视系统及夜景 1 项
			村容村貌提升	垃圾桶设施 10 个

本工程总投资 1458.70 万元，包括：建筑工程 1158.27 万元，临时工程 57.91 万元，独立费用 173.06 万元，基本预备费 69.46 万元。项目的建设将从多个层面深远地影响九都镇及其周边地区的发展。

首先，基础设施的建设和公共环境的改善将直接提升移民村的生活品质，确保移民居民能够享受到更加便利和舒适的生活条件。项目还将充分利用山美水库的文旅资源及低空经济相关产业，如滑翔伞俱乐部、无人机起降等，吸引外地游客，推动旅游业的发展。项目的建设将为九都镇的移民居民带来更为显著的经济和社会效益。提供更好的生活环境，同时还将创造新的就业机会和收入来源，帮助移民居民增加收入，提高生活水平。

1.1 项目区经济社会状况

1.1.1 南安市社会经济概况

南安市位于福建省东南沿海，与台湾岛隔海相望，是举世闻名的“海上丝绸

之路”的起点和民族英雄郑成功的故乡。三国东吴置县，距今已有一千七百多年的历史。1993 年经国务院批准，撤县设市。全市陆地面积 2036km²，海域面积 61.6km²，海岸线长 32.8km，辖有 23 个乡镇，3 个街道，2 个经济开发区，常住人口 151 万。

南安历史悠久，人杰地灵。置县于三国东吴永安三年（公元 260 年），名“东安县”。之后朝代更迭，曾改用晋安、梁安等，隋开皇九年（公元 589 年）始称南安县，唐嗣圣初（684）置武荣州，故南安又别称武荣。南安历史上曾一度是闽南的政治、经济和文化中心，素有“海滨邹鲁”之称，境内丰州金鸡古港曾是古代“海上丝绸之路”的起点。唐代开八闽文化之先声的欧阳詹，明代杰出的思想家李贽，民族英雄郑成功，一代名将叶飞，知名爱国华侨李光前、黄仲咸，祖籍地都在南安。

南安区位优势，交通便捷。东接泉州中心市区，西靠厦门经济特区，处于闽南金三角中心地带。福厦高速公路，国道 324 线，省道 307、308 线，沿海大通道，漳泉肖铁路以及建设中的泉三高速公路、福厦高速铁路过境而过，国家二类口岸石井港可直航香港、金门、马祖、澎湖和厦门、上海、广州等沿海大中城市，市区距晋江机场 30km，距厦门机场 80 多 km，交通四通八达、方便快捷，是福建东南沿海大通道的重要节点。

南安市自然景观和人文景观多样，境内旅游资源丰富，有民族英雄郑成功陵墓、九日山摩崖石刻、五里桥和蔡氏古民居建筑群等全国重点文物保护单位 11 处，陀罗尼经幢、开化洞、凤山寺、天心洞、山美湖、光前学村等省、市文物保护单位 83 处（省级 18 处、市级 65 处）。其中，九日山祈风石刻、安平桥（五里桥）是“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申报世界文化遗产的重要组成部分，蔡氏古民居建筑群入选中国世界文化遗产预备名单。

南安人具有爱拼敢赢的精神、重商善贾的传统、开放兼容的特性。南安籍海外侨胞和港澳台同胞热心支持、积极参与家乡经济建设和社会公益事业建设，连

续十几年华侨捐资额逾 1 亿元人民币，居福建省各县（市）首位。同时，南安还拥有在祖国大江南北打拼的工商实业人士，以及遍布全国各大、中城市的异地商会，他们是闽商的重要组成部分，是推动南安经济社会发展的新兴力量。

经过改革开放 40 年来的建设与发展，南安这一千年古邑以崭新的时代风貌展现在世人面前。撤县建市以来，南安发展理念不断提升，发展思路不断拓展，发展实践不断深化，特别是“十一五”以来，南安以“振兴南安形象、走在全省前列”为目标，持续深入开展“项目建设和招商选资系列年”活动，大力实施“回归创业”工程，全面推进“两个加快”建设，经济社会各项事业进入了历史上最好的发展时期，地区生产总值、人均生产总值、财政收入均翻了一番，经济发展速度和效益不断提升。先后荣获中国改革十佳县市、全国科技示范市、体育先进市、文化先进市、科普示范市、全国双拥模范城、全国商标品牌十强县（市）和中国龙眼之乡、建材之乡等称号。

1.1.2 九都镇社会经济概况

九都镇位于南安市东北部，地处“泉州人民的生命库”——泉州山美水库库区，四面环山，环境优美北连永春县，离省道 305 线 10 公里，至南安 38 公里。九都镇境内多山，四季分明，常年温和，夏长少酷暑，冬短无严寒，光热充足，无霜期长，雨量充沛，降雨集中。九都历史悠久，早在西晋丰年，中原动荡，晋人南迁，溯晋江而上，于此开疆拓土，繁衍生息，曾是南安八大重镇之一。1972 年，应国家建设需要，在九都境内蓄水建成山美水库，两万余九都人民先后移民至长泰、同安等九县一市，余六千多人就地迁高，组建成九都公社。1992 年，九都撤乡建镇，下辖墩兜、彭林、新东、新峰、新民、金圭、美星、和安、秋阳 9 个行政村，2001 年 4 月向阳林坑划归九都管辖，目前共有 10 个行政村。

1.2 水库移民基本情况



九都镇位置图

1.2.1 水库基本概况

山美水库是泉州人民“生命库”。九都因国家建设山美水库而造成大量的移民，九都因山美水库的建设而被评为福建省环境优美乡镇，国家级生态乡镇。山美水库位于晋江支流东溪中游，是晋江流域唯一集防洪、供水、灌溉、发电和生态等综合利用的大型水利枢纽工程。水库流域上游为丘陵地带，山岭海拔一般为500~1300m。水库流域集雨面积1023km²，总库容6.55亿立方米，水库正常蓄水位96.48米，相应库容4.72亿立方米。坝址以上流域多年平均降雨量1798.9毫米（1973~2008年），年最大值2421.1毫米（1990年），最小值1371毫米（2004年），多年平均来水量12.1亿立方米，接近多年调节功能。水库功能作

用突出，社会效益和经济效益显著，为泉州经济社会发展做出重要贡献，被誉为“泉州人民的生命库”和“泉州的生态调节器”。至 2010 年底，山美水库已调蓄水量 395 亿立方米，在枯水期每天向下游供水 200~400 万立方米，供水区受益人口达 400 多万人；错峰排洪 57.53 亿立方米，减轻下游地区的防洪压力，保护人口达 300 多万人。水电站发电量累计达 39.3 亿千瓦时，实现销售收入 6.9 亿元，创利润 1.19 亿元，上缴税收 1.13 亿元，取得显著的社会效益和经济效益。

1.2.2 移民基本情况

库区移民起始于建设大型水库，晋江专区从 20 世纪 50 年代开始兴建水库，起初移民数量不多。1955 年以后，随着水利水电建设大规模的开展，移民数量大为增加，任务日益繁重。1966 年，社会主义教育后，政府组织移民山区，支援山区建设。1966 年，九都部分群众自愿移民泰宁县共 540 户 2817 人，但因居住环境、生产条件、生活习惯及水土不适等原因，部分倒流回来。党和各级政府对移民工作很重视，建立移民迁建领导机构负责移民安置工作，淹没耕地由国家发给补偿费，并拨给钢材、水泥、木材等物资，对移民大都做了比较妥善的安置，有的还通过库区建设，使移民的生活有了较大的改善。

山美水库 1958 年就开始兴建，因种种因素在 10 年间“三上两下”，1967 年经周恩来总理批准复建。山美水库是一个集灌溉、防洪、供水、发电等多功能的大型水库，库容量 6.56 亿立方米，水库面积 20.29 平方公里，建成后需迁移南安九都、码头，永春的东平 3 个公社 12 个大队的 2 万多名社员，其中九都公社占多数，10 个大队计 4264 户 23347 人，分别移居外县市及本县 3 个公社。库区移民经历淹没区调查、制定迁移措施及组织实施等阶段。水库淹没区移民包括水库建设期间和扩蓄期间两个阶段。建设期间移民自 1972 年 1 月开始迁出，居民点按淹没线 92.48 米高程加 4 米影响范围，即 96.48 米（相当于百年一遇洪水）高程以下迁移，计划移民总人数 23347 人，其中就地安置 2347 人、外迁 21000 人，至同年 4 月底，移民任务基本完成。扩蓄移民于 1993 年开始淹没区调查，

1995 年成立相应的领导和办事机构；移民水位线南安市为 98.58 米，移民涉及南安及永春两县（市）三个镇，移民安置以“就地、就近、后靠、迁高”为原则。九都镇自 1996 年 6 月至 1997 年 6 月实施扩蓄工作，共拆除动迁房屋 61533.34 m²（包括集体房屋及临时搭盖），移民新村分布 27 个移民安置点，扩容受淹 9 个村 388 户 1428 人，已建主房 384 户，计 46080 m²。淹没耕地 1260 亩，受淹果树 327 亩 25340 株，1998 年底完成种果 2000 亩。

1.3 九都镇“十四五”移民后扶工作情况

2006 年 5 月 17 日，《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发[2006]17 号，以下简称国务院 17 号文件)印发，决定对大中型水库移民实施新的后期扶持政策。移民后期扶持政策主要通过移民后期扶持相关规划实施。移民后期扶持相关规划包括大中型水库移民后期扶持规划(以下简称“后扶规划”)、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划(以下简称“项目规划”)，是后期扶持政策实施的基本依据。目前，第一、第二、第三个五年移民后期扶持相关规划已实施完成，第四个五年规划正在实施之中。实行项目扶持后，能解决好移民反映的湖塘治理等问题，改善移民群众和当地居民的生产生活条件：通过实施种植业、乡村旅游业等生产开发项目，拓宽移民家庭经济收入来源，增加移民收入。项目的实施，改善了农村的脏、乱、差，人居环境得到美化，生态环境将逐年好转。通过实施湖塘整治，可涵养水源，遏制水土流失，有利于生态环境的建设和保护，和合理调整土地利用结构、农村产业结构，繁荣当地经济，促进农村两个文明的健康发展。

1.3.1 实施成效

随着移民村人居环境整治项目的展开，移民生活人居环境明显改善。用房乱搭盖、生产资料乱堆放、生活垃圾乱丢弃、各类网线乱搭接等突出问题得到有效治理。

当前，九都镇的基础设施基本完善。目前镇内安全饮水、村内路面硬化、污

水治理等基础设施基本完备。接下来将继续完成移民村沟渠整治、路灯建设、停车场、文化公园、破损道路修补等基础服务设施建设。

1.4 项目区水库移民基本情况及移民生产生活现状

1.4.1 山美水电站情况简介

山美水电站位于原九都公社山美大队（今南安市码头镇诗南村），地处晋江支流东溪中游，距泉州市约 40km。坝址以上控制流域面积 1023 平方公里，是一座以灌溉为主，结合防洪、供水、发电等综合利用的大型水利工程，总库容 6.56 亿立方米，调节库容 4.53 亿立方米，为不完全多年调节水库。电站总装机容量为 60MW，年设计发电量 1.6104 亿 kW·h。水电站装机容量为 2 台 1.5 万千瓦水轮发电机组，年设计发电量 1.05 亿千瓦时。山美水电站水库正常高水位库容 3.95 亿立方米，以灌溉为主，结合发电。大坝为粘土心墙土石混合坝。实际坝高 75.2 米，顶长 305 米，底宽 360 米，上宽 8 米。1971 年 12 月，开始设备安装，装置 1 台天津发电设备厂制造的 HL-211-LJ25 型 1.5 万千瓦水轮发电机组。次年 9 月 30 日试车成功，并送电至 110 千伏后茂变电站。1973 年 9 月 22 日，又 1 台同厂同类型 1.5 万千瓦水轮发电机组投产，并入山泉电网运行。该站 1980 年并入福建电网，担负泉州地区调峰的电站。水库电站原设计年发电量 1.05 亿千瓦时。电站枢纽主要建筑物由拦河坝、引水系统、发电厂房及升压开关站组成。大坝为粘土心墙土石混合坝，最大坝高 75.5m，顶长 305 米，底宽 360 米，上宽 8 米。副坝高 40m，溢洪道位于坝址左岸 300m 的山凹处，泄水道长 306m，闸室由 6 扇净宽 12m 的弧形钢闸门控制，引水系统进水口布置在右岸。山美水电站为地下式厂房和坝后电站组成，地下厂房安装 1 台 HLTF15-LJ-225 型水轮发电机组，装机容量为 30MW，地面厂房安装 2 台 HL211-LJ-315 型 30MW 的水轮发电机组，升压开关站户外式，山美至泉州 110kV 线路并入省电网，至永春、德化 110kV 线路与龙门滩电站联接。

1.4.2 移民安置情况

1968 年 12 月底，晋江地区革委会召开有关县、市革委会负责人会议，专门研究山美水库兴建问题，着重研究移民问题，提出向山区和沿海围垦两个移民方案。

1969 年 5 月，山美水库移民调查小组根据 1967 年 2 月中央建委关于山美水库移民问题的指示精神，多次组织人员到淹没区调查摸底，广泛征求意见，并根据 1968 年 12 月晋江地区革委会召开有关县市革委会负责人的会议精神，着重研究围海造田移民的方案，并具体研究移民工作计划，提交《关于山美水库移民问题情况报告》。该方案计划围垦洛阳江及后海埭等两片相邻的海滩可耕地面积 34000 亩（其中洛阳江 20000 亩，后海埭 14000 亩）作为移民的耕地和房建用地。报告计划水库淹没耕地 8705 亩，迁移人口 22066 人，涉及 11 个大队。

1971 年 8 月 31 日，晋江地区革命委员会生产指挥处发“(71)晋地革产字第 162 号”文《关于加强对山美水库移民房屋建筑领导的通知》，对移民房屋建筑的任务、地点作了初步的安排。

1971 年 9 月 19 日，晋江地区革命委员会发“晋地革(71)93 号”文《晋江地区革命委员会批转移民领导小组关于山美水库移民房屋等财产的补偿办法》，对水库移民财产的补偿标准和计算方法作了详细规定。

1971 年 12 月 4 日，晋江地区革命委员会山美水库移民领导小组发“(71)晋革移字 008 号”文《关于认真做好山美水库移民运输工作的意见》，对移民搬迁运输工作作了周密安排。

1971 年 12 月 6 日，移民领导小组根据上级有关规定和“补偿办法”，结合实际情况，以“晋革移后字 008 号”文提出《移民经费预算和用款计划》，该计划移民总人数 23336 人，就地安置 2336 人，外迁 21000 人（其中迁往同安 10000 人，迁往龙溪地区 11000 人）。

1972 年 1 月 12 日，库区开始迁出移民，至 3 月 10 日，库区已迁出移民 17685

人，占应迁人数的 74.6%；至 4 月底，库区迁出移民 23204 人，基本完成移民任务。

九都公社山美大队第一批移民于 1972 年 1 月 12 日开始搬迁，至 4 月底，基本完成移民任务，迁移安置到同安、南靖、漳浦、长泰、华安等县。具体移民情况：安置在南安县东田公社、洪濑镇、康美公社等地 178 户 1028 人，就地迁移安置 676 户 3618 人，在同安县的有 1486 户 8531 人；长泰县 822 户 4335 人；南靖县 516 户 2854 人；漳浦县 196 户 1049 人；华安县 186 户 991 人；平和县 52 户 308 人；永安县 33 户 171 人；三明市郊 18 户 119 人；投亲靠友及原居住泉州等地的 101 户 343 人。

九都公社实际移民 4264 户，23347 人。移民任务的落实，保证山美水库的顺利建成。

库区工程共拨付移民建筑材料包括钢材 69.96 吨、水泥 1093.05 吨、木材 10902 立方米，淹没区（相当于 5 年一遇洪水）淹没耕地 8851 亩，决算移民经费 1300.2 万元。水库淹没区原住民，为水库建设牺牲个人利益迁离家园。山美水库移民搬迁安置工作是在当时无产阶级文化大革命期间这个特定历史时期进行的，移民工作只讲政治、讲奉献，执行的是极低的补偿标准，对工作复杂性认识不足，没有做耐心、细致的思想工作，甚至采用水库关闸蓄水迫使群众迁移，在极短的 3 个月时间把 2 万多移民搬迁，移民安置区生产和配套建设严重不足，移民的生活水平明显落后于当地农村平均水平，生活极其艰苦，造成严重的遗留问题。南安市委、市政府积极协同上级有关部门，采取各种优惠政策和扶持措施，帮助移民群众发展生产，积极处理移民遗留问题，成立“南安市山美水库库区移民遗留问题处理工作办公室”，制定《福建省南安市山美水库移民遗留处理 2002～2007 年规划及总体规划》，从根本上全面解决山美水库移民的遗留问题，使库区建设逐步跟上我国及南安市经济发展步伐，库区移民生活逐步进入小康水平。

1.4.2.1 扩蓄移民

移民安置以“就地、就近、后靠、迁高”为原则，结合库区资源开发及其综合利用，以扶持发展乡镇企业为主，适当调整农业内部结构开荒造田、种果等，引导“农转非”的劳动力向第二及第三产业转移，解决劳动力出路。

工程共迁移安置人口 2791 人，其中南安市动迁人口 388 户 1597 人，永春县动迁人口 261 户 1194 人；建设安置房 664 座共计 92789.4 m²。南安市设置 27 个移民安置点，建房 345 座，安置 384 户，面积 46080 m²。永春县设置 9 个移民安置点，建房 319 座，安置 319 户，面积 34702.4 m²。其中东美村安置在 3 个安置点（桥尾、铺口和“下心幕”）共安置 217 幢，24518 m²；美星村安置在 3 个安置点（黄乾、莲内、山后）共安置 65 幢，6636 m²；溪南村安置在 1 个安置点 26 幢，2474 m²；东关村安置在 1 个安置点 11 幢，1074.4 m²。

1.4.3 项目区基础设施和经济发展现状

九都镇下辖 10 个建制村，辖区内有中学 1 所、小学 4 所、幼儿园 4 所。全镇拥有一个卫生院，医生 7 名，床位数 30 个。现今，所有村均通电、通电话、通公路、通有线电视，2011 年全镇用电量 2119 万千瓦时。全镇现有文化站 1 个、菜市场 2 个、九都建有日供水 500 吨自来水厂一座，35 千伏变电站一座，年供电量达 1000 万度以上，目前垃圾中转站正在建设，农村电网改造全部完成。

鞋业是九都的支柱产业，九都现有企业 11 家，规模以上的企业有 4 家(波辉鞋服有限公司、菲克体育用品有限公司、隆鹰鞋业有限公司、剑桥鞋服有限公司)。其中，波辉鞋服有限公司、菲克体育用品有限公司为南安市明星企业。两家企业旗下品牌七波辉和菲克均获得“中国驰名商标”、“国家免检产品”等称号。

近年来，九都镇认真贯彻落实泉州市民营企业“二次创业”大会精神，按照苏树林省长及泉州市委徐钢书记提出的“企业转型，政府转变”的要求，以南安市“创新发展推进年”活动为抓手，引导扶持企业“二次创业”，推动企业转型升级因泉州山美水库建设需要，1972 年移民 2 万多人至同安、长泰、南靖、漳浦、

三明级。同时九都镇以旅游开发为依托，培育经济发展新支柱。九都镇是省级环境优美乡镇，为进一步发挥九都镇库区乡镇独特优势，打好旅游开发这张牌，推进旅游规划，加大招商力度，引导民间资本投入我镇旅游开发产业。重点做好五台国家级森林公园、龙虎山休闲公园等旅游精品项目的规划建设。挖掘九都历史文化资源，开发美星村千年古院“资胜院”、陇西彭口李氏移民纪念碑等文化景观项目。

九都镇地理条件特殊，泉州市的“大水缸”山美水库位于我镇境内，生态建设是我镇的一大重要任务，在综合分析本镇特点、经济基础、自然资源等条件，提出了以“绿色兴镇、生态强镇”的发展思路，以“建设生态工程，创立生态品牌，发展生态经济”为总体目标，立足自身资源优势、生态环境特点以及经济技术基础，以提高人民生活质量和环境质量为根本目的，通过优化区域经济结构，合理利用自然资源，强化自然保护和生态恢复，治理环境污染，提高生态系统活力，大力发展生态效益经济，促进生态优势向经济优势转变，把九都镇建设成为生态良性循环资源合理利用，生态效益型经济发达的可持续发展乡镇。作为典型库区移民乡镇，镇党委政府立足实际，充分用活用足用好库区后期扶持政策，不断改善库区移民群众生活。近年来，主动融入梅罗九新市镇建设大局，按照“生态型山水旅游小城镇”的发展思路，以项目建设完善城镇功能，不断提高自我发展能力。建设镇区改造综合项目，扎实推进曾鞍山地块开发建设，推进市民广场、农贸市场建设工程。加快镇区入口门楼、湖畔地块九都第一城项目建设，优化中心镇区整体布局。用足、用活、用透库区移民后期扶持政策，建设一批农村道路、农田水利、社会事业、文化设施项目，进一步改善库区移民群众的生产生活环境，提高生活质量。先后组织实施后期扶持项目 37 个，不断改善库区基础设施建设。严格按照政策核定直补人员，及时足额发放库区移民扶持直补资金，每年有 9600 多名群众享受每月 50 元的移民直补政策，目前，全镇有 8658 名移民，享受到移民直补政策，近年来镇村面貌显著改善，移民群众生活水平切实提高。因泉州山

美水库建设需要，1972 年移民 2 万多人至同安、长泰、南靖、漳浦、三明等地。为加强九都海内外乡亲的沟通和联系，促进共同发展，在原厦门市人大主任李秀记、原华东政法学院院长陈鹏生、菲律宾华侨郑远明等众多九都乡贤的积极响应和大力支持下，2010 年 4 月组织成立了南安市九都经济文化促进会。

九都镇突出抓班子、选干部，加强基层组织建设“三项工程”，为科学发展提供坚强有力的组织保障和人才支撑。紧密结合各项中心工作，深入开展创先争优活动。认真组织、严格要求，做好村级组织换届选举工作，选好配强村两委班子，进一步加强农村基层组织建设。继续推广“168”党建机制运用，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。要严格党员发展程序，切实做好党员干部的发展、教育和管理工作的。紧紧围绕经济发展、社会和谐、文明新风唱响发展的主旋律，在全镇倡导新文明、树立新风尚。

镇党委政府将立足九都实际，秉承宏扬九都优良传统，积极实施“生态型山水旅游小城镇”的发展战略，贯彻“培育中心、环湾保护、拥湾发展”工作主线，在全镇上下共同努力下，我镇经济和社会事业协调持续、健康发展，生态型旅游小城镇格局将逐步显现。

1.5 项目区移民生产生活现状

近年来，九都镇以实施乡村振兴战略为统领，以水库移民美丽家园建设、产业转型升级、移民就业创业能力建设为重点，制定重点工作和任务目标。扶持移民发展生产，拓宽移民增收渠道;加强环境整治，推进美丽乡村建设;加快补齐移民村民生社会事业短板，推动移民村基础设施提档升级，提升公共服务水平;不断增强移民群众获得感和幸福感。

1.6 目前存在的主要问题和困难

1.6.1 目前存在的主要问题

1.6.1.1 美丽移民村建设

1.移民文化展示中心立面缺乏当地建筑特色与文化氛围，店招简陋且风格杂

乱不统一；

2.库湾路戏台为简易的钢架结构，风格突兀，缺乏特色；

3.水泵房位于库湾路路口，外立面为瓷砖贴饰，不够美观，影响村容村貌，有待提升；

4.移民文化广场植物配置单一，绿化效果欠佳，缺乏仪式感，影响文化广场整体形象；

5.移民文化广场入口现状植物杂乱，地块不平整，村民种菜泡沫箱随意摆放，影响美观；

6.库湾路人行步道现为红色透水砖路面，局部损毁、路面凹凸不平，杂草覆盖，沿湖一侧用地闲置，植物杂乱；

7.库湾路路口缺乏镇形象标志，植物杂乱，道路转角生硬，有待调整；

8.休闲长廊现为简易钢架结构，简陋且影响美观，功能单一；

9.库湾路起点现状为沿路的单排停车场，缺乏景观点缀与形象展示，整体形象不佳，景观有待提升；

10.观景平台现状为泥土地面，杂草覆盖，缺乏景观效果与实用性；

11.亭子破旧及周边环境杂乱，石块堆砌；

12.现状道路南侧为土坡台地，不牢固具有安全隐患且植物杂乱；

13.垃圾桶等环境卫生设施简陋或缺乏；

14.导览指示牌简易且不成系统，指示性不强且影响美观，整体灯光照明夜景效果欠佳，有待改善。

1.6.1.2 公共基础设施建设

1.库湾路路面缺乏维护导致部分路面陈旧，凹凸不平，有明显的水泥维修补丁痕迹，且有杂草影响美观。

1.6.1.3 乡村文化建设

1.村内缺少展示水利文化、供村民休憩的移民文化休闲场所；

2.村内缺乏集中停车的场地；

3.缺乏游客游玩活动场地；

1.6.2 目前存在困难

（1）如何准确对接地方和移民的需求

地方政府和库区移民对于移民后期扶持项目高度重视，寄予了深切的期待，九都镇围绕低空经济及山美水库天然优越的环境资源开展的经济活动，是镇政府所关注的重点。前期移民后期扶持工作已取得一定成绩，但需求往往随社会不断发展而发生变化。因此如何形成具有前瞻性思考的规划来统筹需求变量，从而进行分期分批有效的精准实施，这存在一定的挑战性。

（2）如何挖掘并体现地方特色

如何发掘九都镇的特色，将九都镇建设成为一个地域特色显著、配套完善、生态舒适、具有文化底蕴的美丽文明乡村。如何在本项目建设中，将其地方文化特色融入到工程实践中，通过有形的载体使传统文化互相映衬，相得益彰，发挥其广泛影响力，这是本项目的另一个困难。

（3）如何利用有限资金撬动具有经济效益和生态效益的杠杆

地区发展是一项系统工程，但本项目资金有限，故本项目将从以基础设施建设提升为主，完善美丽移民村的基础设施、公共服务设施，提升项目成效。如何利用有限的资金，通过重点扶持，进一步增强移民村的凝聚力和带动力，使移民群众更好地享受生产开发项目带来的“红利”，变“输血”为“造血”，这在一定程度上增加了项目策划阶段在决策分析上的难度。

2 建设目标和总体布局

2.1 建设目标

按照习近平总书记对水库移民工作提出的“稳得住、能发展、可致富”的总体要求，通过实施“润泽库区、造福移民”工程在努力打造“水资源”、“水环境”、“水生态”和“水安全”的基础上，高标准策划库区移民村发展新路径，精心营造和美乡村、积极扶持产业发展，努力实现“村美、业兴、人和、民富”的建设目标。

2.1.1 总体目标

1. “村美”是衡量高标准库区移民村的直观感受。

基于新东村、金圭村山、水生态环境格局，立足现有村落空间布局的基础，通过对村内道路、建筑立面、公园以及滨水环境等进行针对性的改造提升，推进库区移民人居环境整治，打造美丽移民村。

2. “业兴”是奠定高标准库区移民村的物质基础。

充分挖掘村庄文化和自然资源，依托乡村自然景观文旅资源、历史建筑、民俗风情、特色产业等优势资源，发展研学活动、文化教育等乡村旅游新业态。

3. “民富”是明确高标准库区移民村的目标导向。

生活富裕是乡村振兴的根本，是产业发展、生态建设、文化建设、社会治理的重要目标。通过完善美丽移民村基础设施，推进乡村数字化转型等举措，将新东文旅资源进行统筹推广，提高村民收益。

2.1.2 具体目标

1. 建设建筑风格协调统一、绿化景观美观实用、村容村貌和谐自然的生态美观美丽移民村。


2. 打造车行道宽敞舒适，步行道通畅美观，停车空间规范充裕的农村基础设施。

3. 建设功能完善、符合地域特征的移民文化场所，打造安全规范的活动空间，构建完善健全的文化服务设施。

2.2 总体布局

2.2.1 《南安市城市总体规划（2017-2030 年）（批复稿）》


九都在县域城镇职能定位中主导职能为 “生态农业与旅游型城镇”。依托良好的生态环境，发展都市农业和生态旅游职能，同时未来应注重生态环境保护

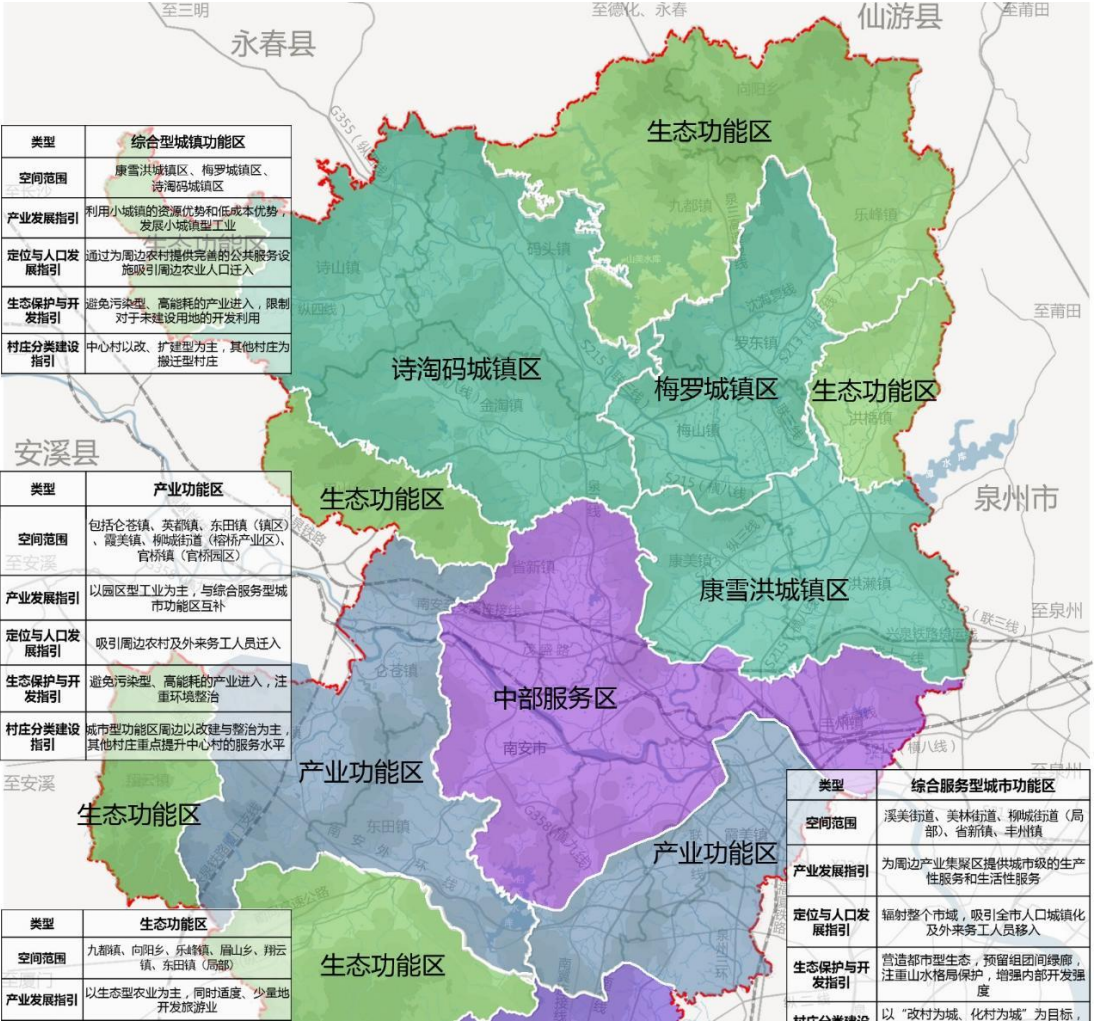

护和水源地保护，对位于保护区内的村庄逐步搬迁，引导人口逐步向中心城区及周边重点乡镇集聚，适度发展低污染工业，应严格控制对环境有影响的一切建设活动。

根据九都镇体系职能结构规划，九都镇属于生态功能区，产业发展以生态型农业为主，同时可以适度、少量的开发旅游业；区域内只进行极少量的生活性的开发建设，在其中生态保护核心区，完全禁止开发。


2.2.2 《南安市九都镇总体规划（修编）》

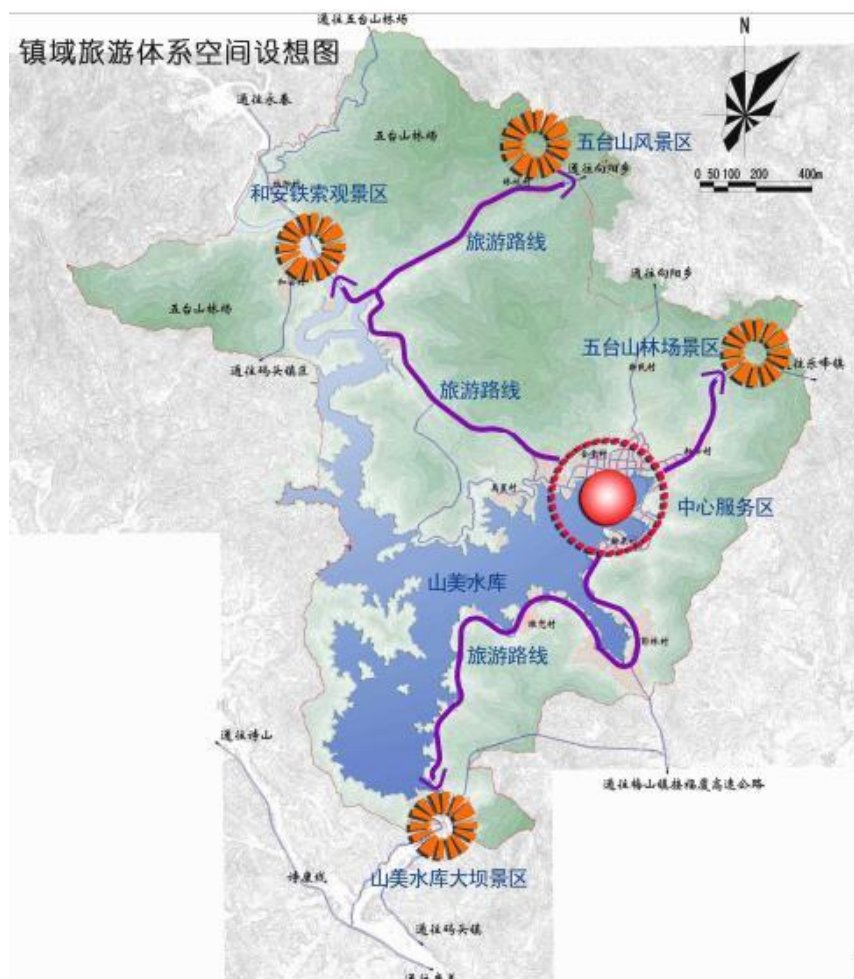

在镇域旅游体系空间中提出，镇区规划沿县道 333 公路形成的动态发展带，以新东村镇区村作为商贸行政文教中心，形成山美水库大坝景区、五台山林场景区、五台山风景区、和安铁索观景区等四个景区。本次项目在此基础上考虑实施“润泽库区、造福移民”工程，应通过坚持“人水和谐发展的基础上，根据移民生产生活实际需求和经济社会发展水平因地制宜推进美丽移民村建设，不断完善公共设施和提升公共服务，积极扶持产业发展和运营，结合当地旅游文化资源，努力实现和美共富、乡村振兴。

2.2.3 《南安市九都镇集镇区控制性详细规划》

九都镇集镇区的定位：现代商贸服务功能完善，宜居、宜业、宜游的生态型山水片区。近期对规划区内村庄用地尽量保留，减少拆迁。远期对村庄分策略分期进行改造。具体分为整治、拆迁集中安置两种类型。规划结合现状地形、水系等环境特征进行系统设计，规划形成“点、线、面”相结合融为一体的网状绿地系统。各种绿地相互渗透融合、和谐共存，为集镇区居民提供良好的户外休闲与交往环境。九都镇景观系统规划要结合绿地系统，构成“一带两心，山水景渗透”的开敞景观系。一带指是依托山美水库沿岸形成的滨水景观带；两心指是依托山美水库内湾形成的景观核心和文化广场形成的景观核心；山水景渗透即东面山体景观和西面山美水库景观对规划区渗透。

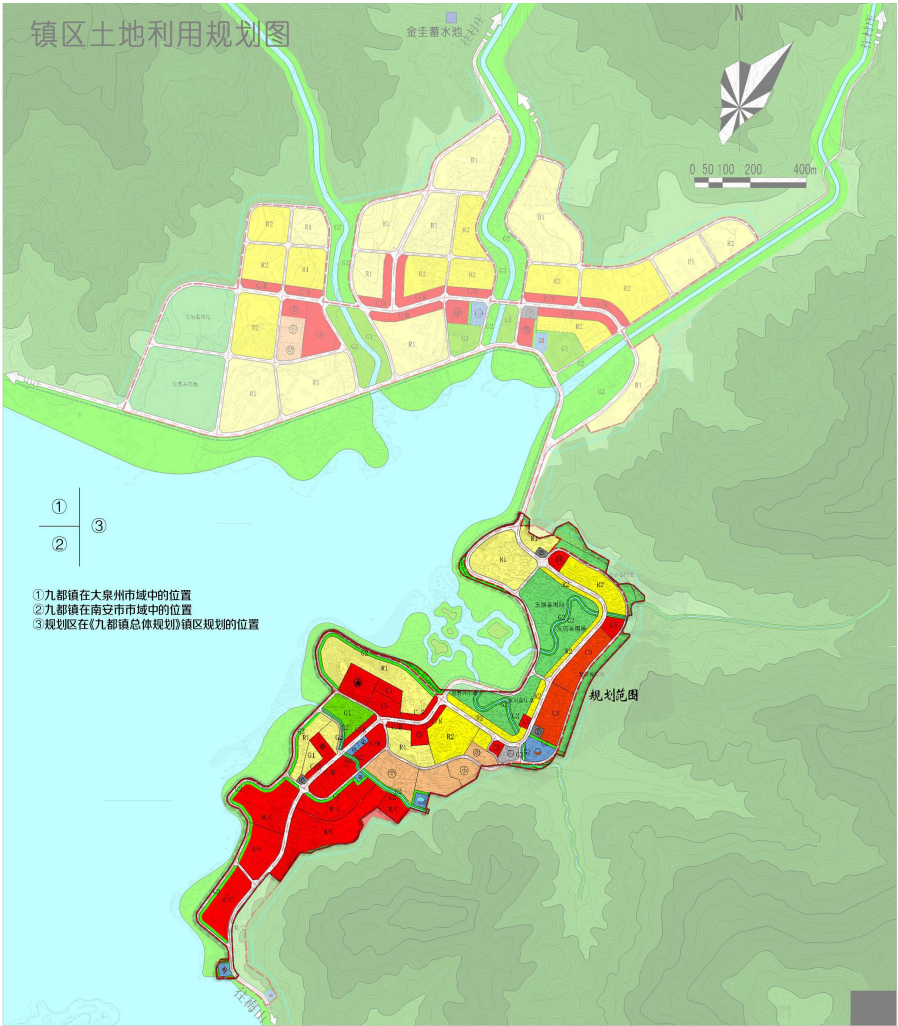


2.2.4 九都镇村域分布及总体布局





九都镇下辖新东、秋阳、和安、新峰、新民、金圭、美星、墩兜、彭林、向阳乡林坑村 10 个村委会。本次南安市九都镇大中型水库“润泽库区、造福移民”工程设计范围为新东村和金圭村。



2.3 设计主题

本次项目设计方案以新东村、金圭村山、水自然生态环境为本底，立足现有村落空间布局的基础，结合九都镇移民文化资源，因地制宜制定建设方案。提出“天空之城，山水九都”的设计主题。



南安市九都镇大中型水库“润泽库区、造福移民”工程建设表						
序号	建设类型	建设内容	建设子项	工程量	建安投资（万元）	图例
新东村						
一	美丽移民村建设	旧建筑改造提升	1. 移民文化展示中心立面提升	754㎡	40.86	
			2. 库湾路戏台改造	130㎡	98.85	
			3. 水泵房立面改造	256㎡	13.66	
		环库绿化景观提升	1. 移民文化广场绿化提升	1700㎡	132.16	
			2. 移民文化广场入口提升	440㎡	35.11	
			3. 环库湾线性公园	4113㎡	192.90	
		村容村貌提升	1. 库湾路路口提升	100㎡	8.12	
			2. 休闲长廊提升	290㎡	5.68	
			3. 库湾路起点文化展示墙	27M	10.80	
			4. 观景平台提升	150㎡	6.49	
			5. 亭子及周边修复	1项	3.45	
			6. 挡墙建设	180M	4.11	
			7. 垃圾桶	16个	1.96	
8. 智慧导览视系统及夜景	1项		90.53			
二	公共基础设施建设	农村交通设施	1. 库湾路路面提升	1405M	206.78	
三	乡村文化建设	农村休闲文化设施	1. 水利文化园	1536㎡	49.73	
			2. 库湾路公共停车场	1293㎡	26.82	
			3. 无动力公园	1965㎡	110.64	



南安市九都镇大中型水库
“润泽库区、造福移民”工程
——金圭村总体布局措施图——

南安市九都镇大中型水库“润泽库区、造福移民”工程建设表						
序号	建设类型	建设内容	建设子项	工程量	建安投资（万元）	图例
金圭村						
一	美丽移民村建设	环库绿化景观提升	1. 步道提升	665 m²	44. 61	
			2. 园路挡墙	310M	10. 68	
			3. 花池提升	160M	5. 95	
			4. 绿化提升	3200 m²	36. 72	
			5. 智慧导览导视系统及夜景	1项	20. 56	
		村容村貌提升	1. 垃圾桶	1项	1. 08	

3 建设任务和方案

3.1 设计依据

- (1) 《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》，2006 年；
- (2) 《水利部关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》2018 年；
- (3) 《福建省大中型水库移民后期扶持十四五规划》2021 年；
- (4) 《福建省大中型水库移民后期扶持项目建设指南》2021 年；
- (5) 《南安市城市总体规划（2017-2030 年）》；
- (6) 《南安市九都镇总体规划（修编）》；
- (7) 《南安市九都镇集镇区控制性详细规划》；
- (8) 《福建省大中型水库“润泽库区、造福移民”工程实施方案》（闽水〔2024〕52 号）；
- (9) 《福建省水利厅关于开展 2024 年度大中型水库“润泽库区、造福移民”工程建设工作的通知》（闽水函〔2024〕225 号）；
- (10) 《福建省“润泽库区、造福移民”工程建设指南》；
- (11) 《村庄整治技术标准》GB/T50445；
- (12) 《福建省农村人居环境整治技术指南》；
- (13) 《村庄景观环境工程技术规程》CECS285；
- (14) 《乡村绿化技术规程》LY/T2645；
- (15) 《城市户外广告和招牌设施技术标准》CJJ/T149；
- (16) 《村镇照明规范》（GB/T40995）；
- (17) 《乡村地区交通设施规划设计标准》DB11/T2102；
- (18) 《乡村道路工程技术规范》GB/T51224；
- (19) 《数字乡村标准体系建设指南》

3.1.1 相关资料

- (1) 《福建省主体功能区规划》2012 年；
- (2) 《福建省生态功能区划》2010 年；
- (3) 业主提供的相关资料等。

3.2 设计规模和标准

3.2.1 设计原则

“润泽库区、造福移民”工程应积极融合水利发展，在满足“水安全”的前提下，立足移民村自然禀赋、人文特色、产业结构和移民需求的基础上，建设中要突出以美丽移民村建设和产业转型升级为重点，坚持生态优先、布局合理、系统打造、规模适度、宜居宜业的原则，妥善保护乡村自然生态和传统形态，全力打造根植于地域文化的风貌特色，加大扶持乡村产业基础设施建设，推动库区移民村可持续发展。

3.2.2 设计规模

本项目建设范围点位于南安市九都镇新东村、金圭村，根据实际情况主要以美丽移民村建设、公共基础设施建设、乡村文化建设等内容，加强移民安置区基础设施和环境建设，改善移民生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，加快补齐移民民生社会事业短板，打通“绿水青山变成金山银山”的转换通道，改“输血”为“造血”，实现“产业优、百姓富、生态美”的目标。

一、新东村主要设计规模如下：

(1) 美丽移民村建设

1.旧建筑改造提升

- ①移民文化展示中心立面提升 754 m²；
- ②库湾路戏台改造 130 m²；
- ③水泵房立面改造 256 m²。

2.环库绿化景观提升

①移民文化广场绿化提升 1700 m²;

②移民文化广场入口提升 440 m²;

③建设环库湾线性公园 4113 m²。

3.村容村貌提升

①库湾路路口提升 100 m²;

②休闲长廊提升 290 m²;

③建设库湾路起点文化展示墙 27m;

④观景平台提升 150 m²;

⑤亭子及周边修复一项;

⑥建设挡墙 180m;

⑦新增垃圾桶 16 个;

⑧增加智慧导览导视系统，在水利文化园、停车场、无动力公园、戏台、环库湾线性公园、库湾路起点、移民文化广场周边等处景观设置展示牌 16 个，指示牌 20 个，警示牌 18 个。增加步步生花互动灯、感应式花灯、地面互动灯光、戏台工矿灯、庭院灯、壁灯、廊亭吊灯、射树灯、瓦楞灯、台阶侧壁射灯、龟背灯、埋地可调射灯、洗墙灯、灯带、麦穗灯、蒲公英灯、芦苇灯等内容。

（2）公共基础设施建设

1.农村交通设施

①库湾路路面提升 1405m。

（3）乡村文化建设

1.农村休闲文化设施

①水利文化园 1536 m²;

②库湾路公共停车场 1293 m²;

③无动力公园 1965 m²。

二、金圭村主要设计规模如下：

（1）美丽移民村建设

1.环库绿化景观提升

①步道提升 665 m²；

②园路挡墙 310m；

③花池提升 160m；

④绿化提升 3200 m²；

⑤智慧导览导视系统及夜景 1 项；

2.村容村貌提升

①垃圾桶设施 10 个。

3.2.3 设计标准

根据《“润泽库区、造福移民”工程建设指南》与本项目实际情况，建设标准如下：

一、新东村主要内容：

（1）美丽移民村建设

1.旧建筑改造提升

①对移民文化展示中心进行外立面改造，包括外立面墙体、吊顶以及店招改造，体现水文化与移民文化内涵；

②对库湾路戏台进行整体改造，使其符合当地建筑风格，融入当地建筑风貌。

③对水泵房立面进行外观改造，提升库湾路路口形象。

2.环库绿化景观提升

①对移民文化广场进行绿化提升，结合现状条件，选用易于养护、成活率高的本地树种，将广场东南台阶两侧的废弃水景改造为三级看台，增加钢架张拉膜顶棚，提升文化广场形象；

②对移民文化广场入口进行景观改造，台地提升，将现状泥土地块硬化处理，步道拓宽，增加休闲桌椅形成小型活动场地，考虑台阶连接广场与镇政府两个高差空间，改善入口景观形象；

③沿库湾路建设环库湾线性公园，打造既可正常通行又可赏湖观景的带状公园，在面域较为宽阔、视野良好的四个节点为村民、游客提供漫步、赏湖、休憩娱乐的场地。

3.村容村貌提升

①对库湾路路口进行提升，增加镇标，镇标结合“天空之城，山水九都”的设计主题进行设计，对生硬的道路转角进行优化，并进行绿化设计，提升库区文化形象；

②对休闲长廊进行提升改造，在现状钢架结构的基础上采用仿木纹漆饰面，增加吊顶，考虑线路收纳和检修问题，增加文化宣传、休憩等功能；

③增加库湾路起点文化展示墙，挖掘库区的水利文化内涵，展示库区的河流水系资源，宣传山美水库的建库历程和建库意义，风格上结合闽南建筑的红砖和出砖露石的做法，融入当地建筑风貌；

④对移民文化广场前的观景平台进行提升，平台地面增加硅金板木平台跟道牙平齐，增加雾森与夜景灯光，提升观景平台整体景观效果；

⑤将亭子清理并修复翻新，对亭子周边进行清理和局部修复，清理杂木，修复挡墙，以及亭子周边的绿化提升设计；

⑥移民文化广场西南侧道路建设挡墙，提高道路安全性；

⑦在村内重点干道、节点 布置垃圾桶。垃圾桶选择简单耐用的金属垃圾桶，完善环境卫生基础设施。

⑧增加智慧导览导视系统，打造数字化现代化的村庄形象，增加夜景灯光，提高夜景照明效果，增加智慧互动灯光，提高夜间漫游趣味性。

（2）公共基础设施建设

1.农村交通设施

①将库湾路路面进行提升改造，根据村庄风貌采用彩色沥青做法，提高美观性的同时保证道路通行的舒适度与安全性。

（3）乡村文化建设

1.农村休闲文化设施

①利用库湾路西南侧的闲置用地建设水利文化园，结合库区模型地雕和其他人文雕塑等，融入水库淹没前的老村庄文化等，体现文化展示与休闲游憩等功能；

②新建库湾路公共停车场，为游客提供基础停车场地，满足机动车停车需求，但需要为地块后的村民预留通行道路；

③利用库湾路西南侧的闲置用地建设无动力公园，利用高差地形采用无动力设施，强调人与自然和谐共处，为儿童提供安全的游玩场地，为住宿游客与一日游游客提供休闲娱乐的场所。

二、金圭村主要内容：

（1）美丽移民村建设

1.环库绿化景观提升

①步道提升，改造现有狭窄步道，在现有基础山拓宽至 1.5M 宽度，将凹凸不平的路面调整为石板路面，方便周边居民及游客的舒适通行；

②园路挡墙，绿地与步道之间存在一定的的高差，为了更好的巩固场地土方及增加休息场地，在路面拓宽之后增加挡墙内容，；

③花池提升，针对露营基地周边现有砖砌裸露比较杂乱的花池采用自然石饰面进行提升设计；

④绿化提升，沿线绿地内目前存在大量杂地，绿地杂乱，使用混乱，通过重新梳理场地，规整绿化内容，预留较多草坪空间，可作为草坪露营等使用。沿道路边缘增设房车停车空间，方便外来露营人员的使用。种植多年生草花植

被，增加观花观叶等灌木内容，增加沿线的风景；

⑤增加智慧导览导视系统，打造数字化现代化的村庄形象，增加夜景灯光，提高夜景照明效果，提高夜间漫游趣味性。

2.村容村貌提升

①垃圾桶设施 10 个沿篮球场至露营基地沿线布置垃圾桶，完善公共配套设施。

3.3 新东村建设方案：包含了美丽移民村建设，公共基础设施建设，乡村文化建设等内容。

3.3.1 美丽移民村建设主要包含：旧建筑改造提升、环库绿化景观提升、村容村貌提升等内容，具体建设规模如下：

（1）美丽移民村建设

1.旧建筑改造提升

- ①移民文化展示中心立面提升 754 m²；
- ②库湾路戏台改造 130 m²；
- ③水泵房立面改造 256 m²。

2.环库绿化景观提升

- ①移民文化广场绿化提升 1700 m²；
- ②移民文化广场入口提升 440 m²；
- ③建设环库湾线性公园 4113 m²。

3.村容村貌提升

- ①库湾路路口提升 100 m²；
- ②休闲长廊提升 290 m²；
- ③建设库湾路起点文化展示墙 27m；
- ④观景平台提升 150 m²；
- ⑤亭子及周边修复一项；

⑥建设挡墙 180m;

⑦新增垃圾桶 16 个;

⑧增加智慧导览导视系统，在水利文化园、停车场、无动力公园、戏台、环库湾线性公园、库湾路起点、移民文化广场周边等处景观设置展示牌 16 个，指示牌 20 个，警示牌 18 个。增加步步生花互动灯、感应式花灯、地面互动灯光、戏台工矿灯、庭院灯、壁灯、廊亭吊灯、射树灯、瓦楞灯、台阶侧壁射灯、龟背灯、埋地可调射灯、洗墙灯、灯带、麦穗灯、蒲公英灯、芦苇灯等内容。

3.3.1.1 新东村美丽移民村建设（老旧建筑改造提升）

一、移民文化展示中心立面提升

移民文化展示中心立面改造面积约 754 m²。现状建筑立面缺乏当地建筑特色与文化氛围，店招简陋且风格杂乱不统一，商铺较为零散，影响视觉上整体的观感与美观度；通过改善店铺外立面与店招样式，丰富政府埕前商铺视觉效果，以吸引更多顾客。



图 3-1 移民文化展示中心立面现场照片



图 3-2 移民文化展示中心立面提升效果一



图 3-3 移民文化展示中心立面提升效果二




图 3-4 移民文化展示中心立面图

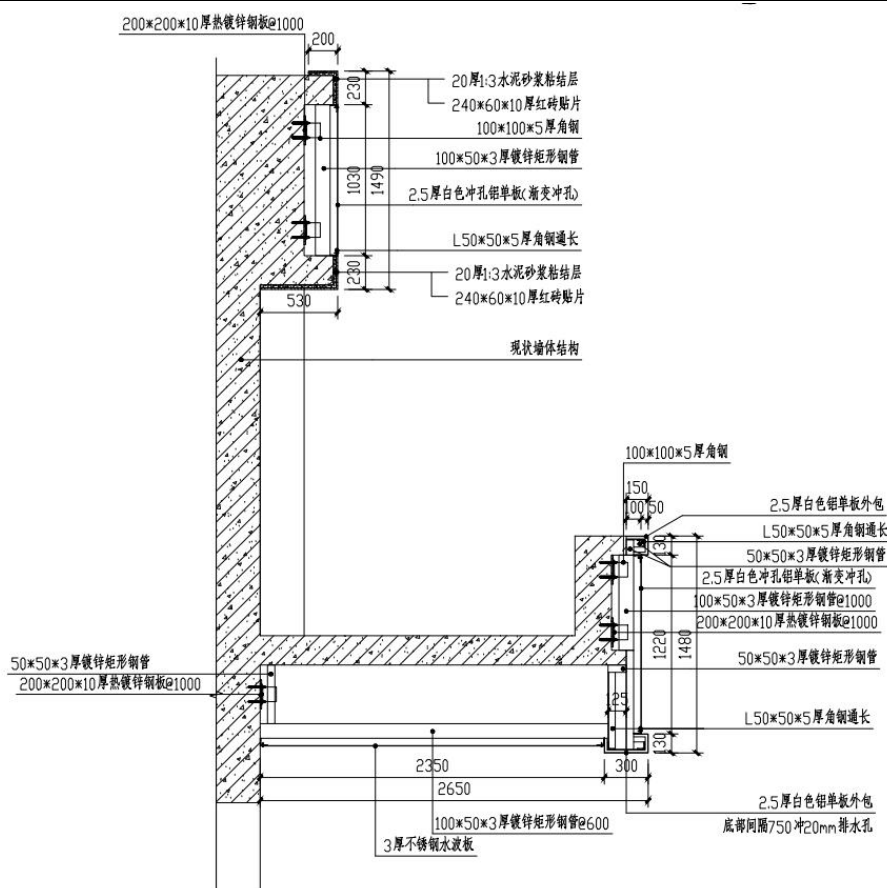


图 3-5 移民文化展示中心 1-1 断面图

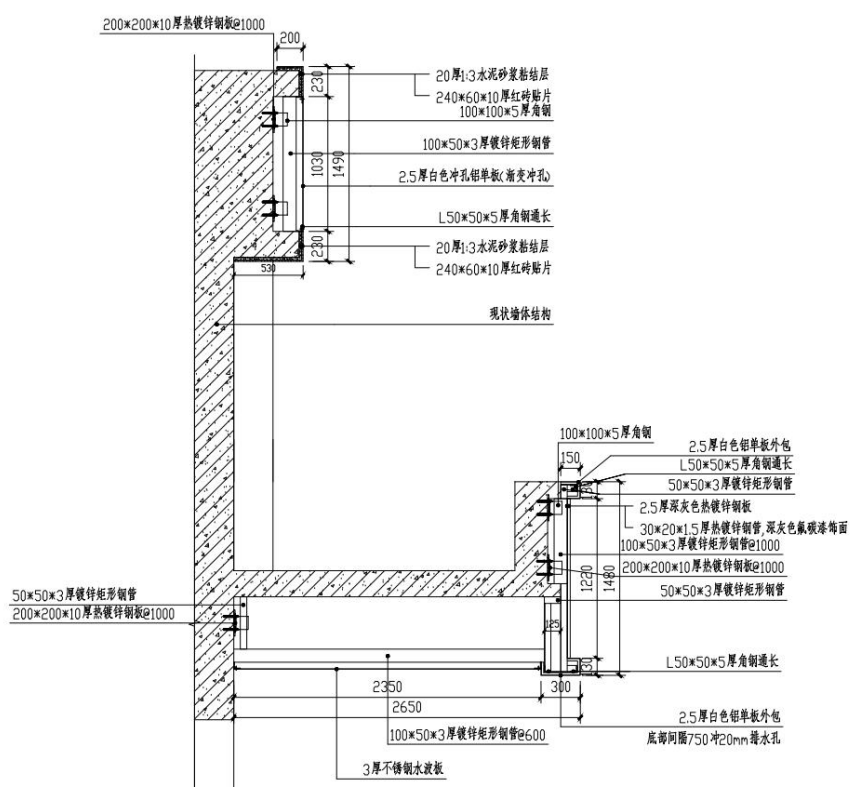


图 3-6 移民文化展示中心 2-2 断面图

移民文化展示中心改造实体墙部分按照当地建筑风格按红砖贴片做法，九都移民文化展示中心店铺保持现状黑色大理石立面，在墙面大面积空白处增加移民历史文化画框；一层及外面吊顶部分采用不锈钢水波板，与水文化契合，店招部分统一采用渐变冲孔铝单板作为底板，具有较好的透光效果，提升夜景商业氛围，局部采用格栅装饰，格栅做法采用热镀锌钢管，深灰色氟碳漆饰面，突出移民文化展示中心铺面，文字部分采用不锈钢广告字。

二、库湾路戏台改造

库湾路戏台距离库湾路起点约 700m 处,改造面积约 130 m²。现状戏台平整,整体为简陋的钢结构,戏台前有一小型活动广场,距离原村落宫庙约 30m,宫庙保护完好,宫庙建筑风格为传统闽南宫庙建筑风格。本次改造结合当地传统建筑,与宫庙建筑协调统一,改造成具有泉州特色的仿古戏台建筑,以满足移民村村民休闲娱乐与精神文化需求。



图 3-7 库湾路戏台现场照片



图 3-8 库湾路戏台提升效果

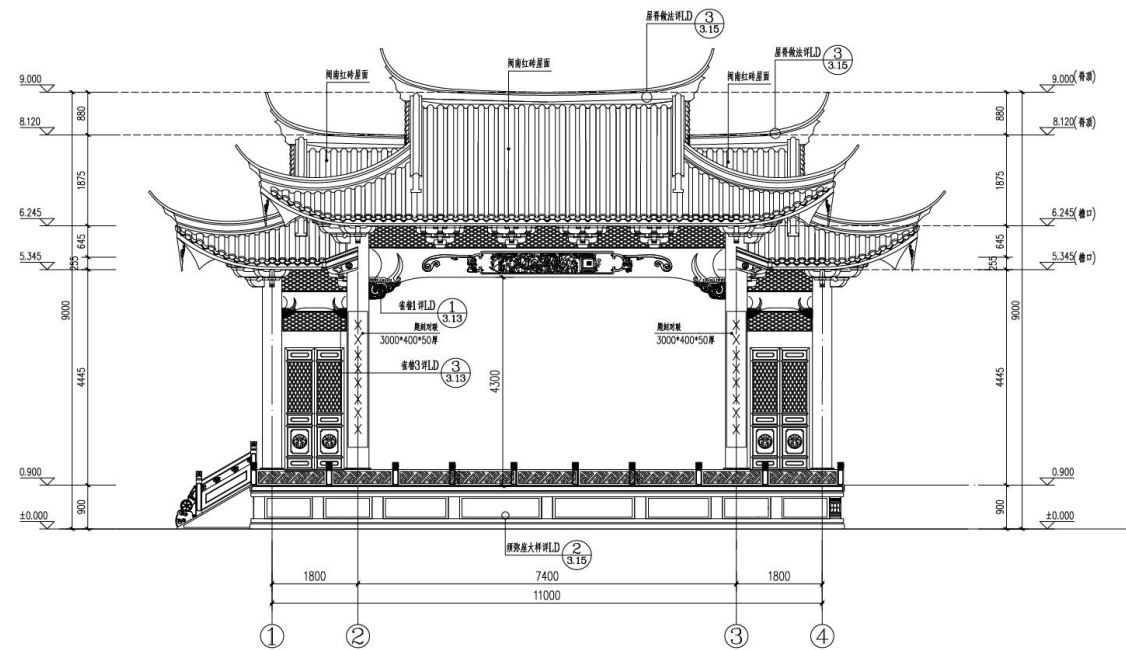


图 3-9 戏台正立面图

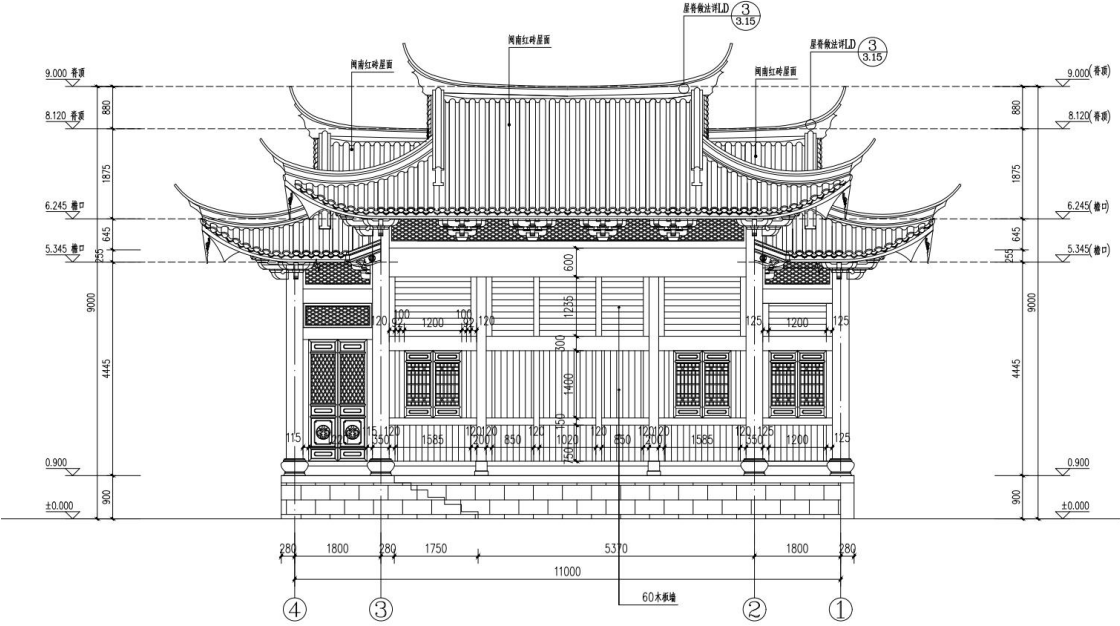


图 3-10 戏台背立面图

库湾路戏台依据闽南建筑风格进行改造，打造仿古戏楼，坡屋顶采用传统闽南红瓦，屋脊做法采用正瓦屋脊，立柱为芝麻白光面石柱，戏台基座整体采用芝麻白菠萝面工字铺，基座前侧以石浮雕装饰。

三、水泵房立面改造

现状水泵房位于库湾路与市政干道相交界处，立面改造面积约 256 m²。水泵房建设时未考虑于周边环境相协调，外立面为淡黄色和白色瓷砖贴饰，不够美观，未能体现当地建筑风格，且处于路口位置影响库区整体形象。



图 3-11 水泵房现场照片



图 3-12 水泵房提升效果

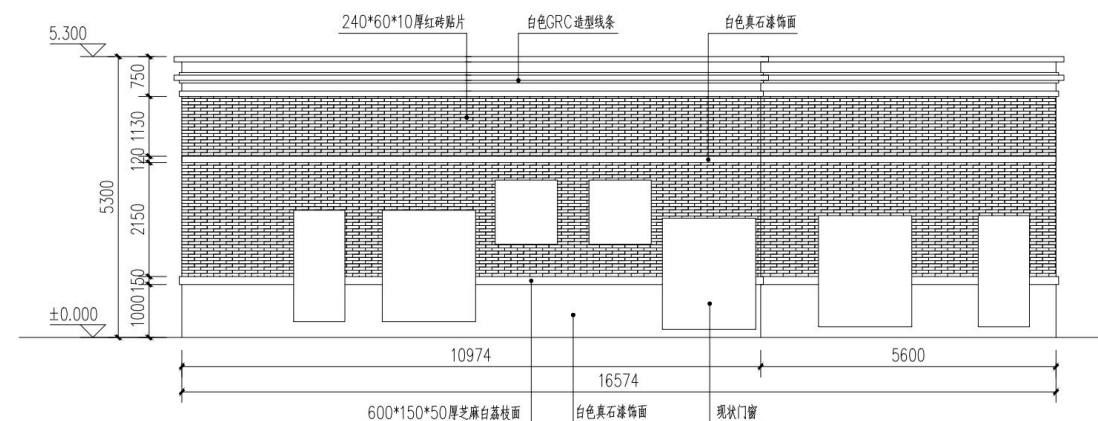


图 3-13 水泵房一立面图 A

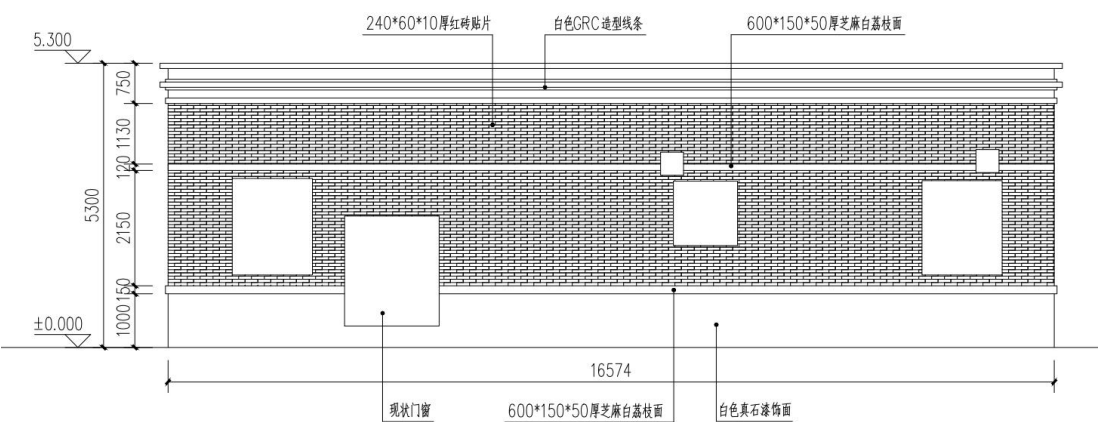


图 3-14 水泵房一立面图 B

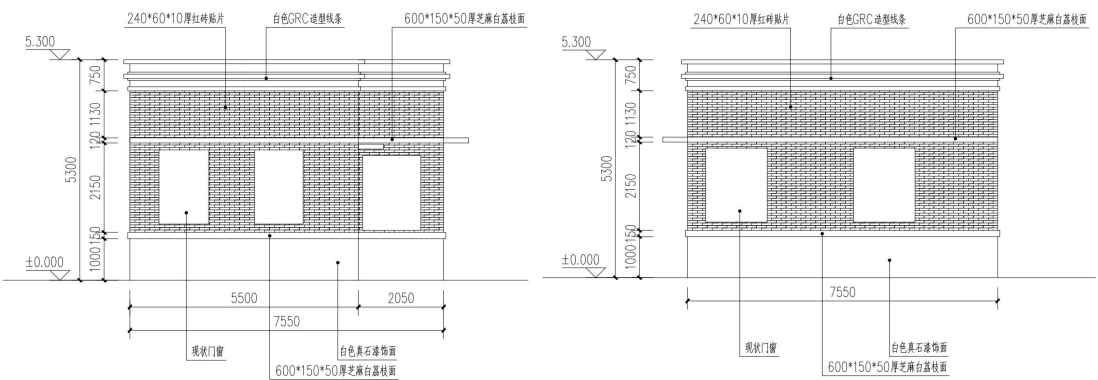


图 3-15 水泵房一立面图 C、D

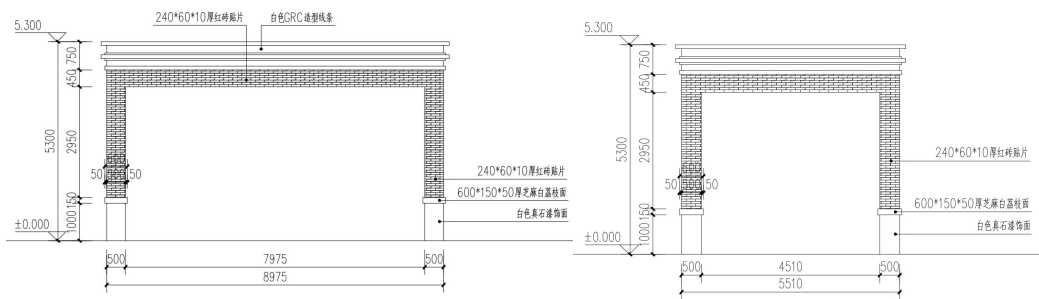


图 3-16 水泵房二正、侧立面图

将水泵房立面提升改造为具有闽南风格的建筑形式，使其融合当地村容村貌。外立面保留现状窗户，外墙主体部分采用红砖贴片，顶部以白色 GRC 造型线条装饰，距地面 1m 以下部分采用白色真石漆饰面，增加建筑层次感。

3.3.1.2 环库绿化景观提升

一、移民文化广场绿化提升

考虑到村庄的整体环境和现有的绿化条件，选择适宜的植物种类进行配置，以达到美化环境、提升景观效果的目的。同时，设计还将注重绿化的维护和管理，确保绿化成果能够长期保持，为村民提供整洁、宜人的公共空间。

移民文化广场目前植物配置单一，绿化效果欠佳，拟在东南侧台阶处的三处花坛种植特选罗汉松，在西北侧台阶处的三处花坛种植特选红花檵木，增强广场仪式感，广场外围种植观赏草本植物，如紫鸭跖草、紫花翠芦莉、大花芦莉、银边山营兰、麦冬、草坪等，避免影响无人机升降。

对于广场北侧不规整的花池进行拆除，对于广场西南侧的台阶与花池进行拆除与重新规整，将广场东南台阶两侧的废弃水景改造为三级看台，增加钢架

张拉膜顶棚，提升文化广场形象。



图 3-17 移民文化广场绿化提升平面示意



图 3-18 移民文化广场看台效果图

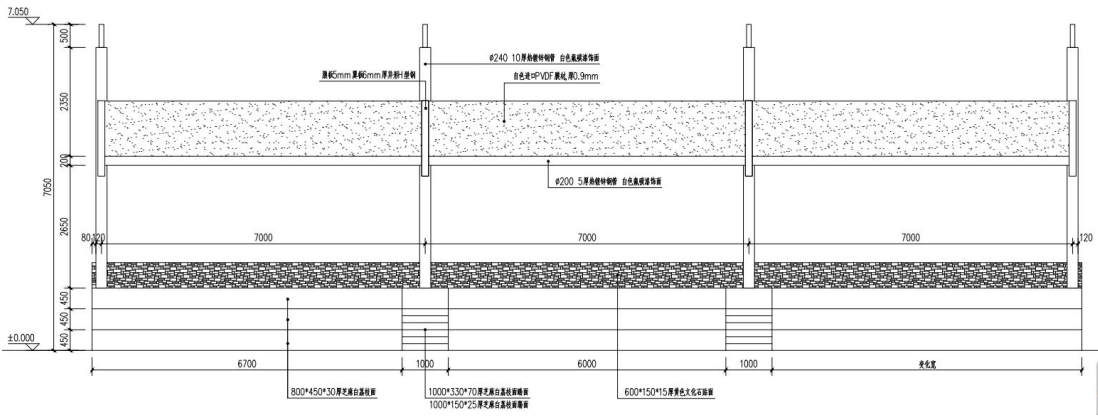


图 3-19 移民文化广场看台立面图

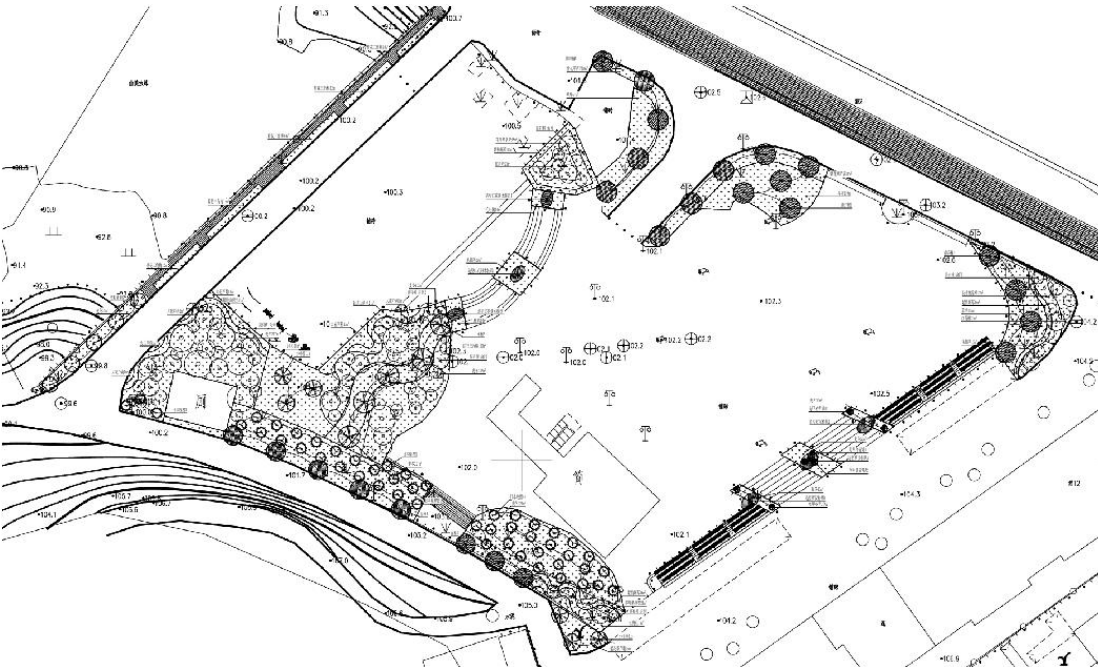


图 3-20 移民文化广场植物配置平面图

(环库绿化景观提升) 乔灌木数量统计表							(环库绿化景观提升) 灌木地被面积表						
序号	名称	规格	数量	单位	备注		序号	名称	规格	面积	单位	备注	
1	小叶榕	胸径13-14	>750	>200	25	株	1	小叶榕	40	15	36	m²	64株/m², 以不露土为准
2	南洋杉	胸径19-20	>550	>300	34	株	2	小叶榕	35	15	32	m²	49株/m², 以不露土为准
3	木棉	胸径30-35	>500	>300	5	株	3	红背桂	35	20	60	m²	49株/m², 以不露土为准
4	宫粉紫荆	胸径13-14	>450	>200	14	株	4	紫花黄桷	30	15	201	m²	64株/m², 以不露土为准
5	蓝花楹	胸径15-16	>380	>150	26	株	5	红花三角梅	30	20	100	m²	49株/m², 以不露土为准
6	香樟	胸径15-17	>350	>280	8	株	6	花叶黄桷	25	15	46	m²	49株/m², 以不露土为准
7	黄花风铃木	胸径13-14	>300	>200	25	株	7	黄桷	25	15	11	m²	64株/m², 以不露土为准
8	日本晚樱	D8-9	250-300	>150	49	株	8	毛杜鹃	20	15	72	m²	64株/m², 以不露土为准
9	造型红花继木桩景	D12-13	250-300	250-300	3	株	9	大花芦荻	20	15	37	m²	64株/m², 以不露土为准
10	造型罗汉松	D14-15	250-300	300-350	3	株	10	紫明四季	20	15	31	m²	81株/m², 以不露土为准
11	同安红三角梅	120-150	>80	>40	2	株	11	麦冬	10	10	1017	m²	120株/m², 以不露土为准
12	龟甲冬青球A	80-100	100	6	株		12	草坪			2197	m²	按0.3m深度
13	龟甲冬青球B	80	80	1	株		13	环库清淤			18226	m²	
							14	整理绿化地			4060	m²	
							15	种植土			1218	m²	

图 3-21 移民文化广场绿化提升苗木表

(1) 设计原则

①整个绿化设计遵从场地特征，呼应乡土景观设计的理念，采用自然种植的手法来打造乡野特色的植物景观，优化空间的延续性和层次感，烘托其特有

的场地氛围，满足不同场地的功能需求，形成具有地方特色的生态植物景观带。

②根据场地现状及功能需求，尽可能保留现状较好植被，运用多种植物景观特性，丰富空间景观效果。

③植物景观品种选用应以种植易存活、生命力强的绿化品种，减少维护成本，降低环境对植物的干扰，实现经济适用的绿化种植。

（2）设计手法

通过列植、片植、丛植的不同种植设计手法，以适应性较强的乡土植物作为生态基底，配置观赏性较高的花木、色叶木等乔灌木，局部点植高大乔木作为孤植树种，打造简洁、自然、开放的植物生态景观的观赏效果。

根据实地环境情况不同，植物的生态习性不同，部分节点以观花、观叶树种为主导，乔灌木搭配，营造独具生态特色植物景观。

（3）植物品种选择

绿化苗木品种选择必须体现地方特色，力求生物多样性，种植管理粗放、表现较好、价格便宜的乡土树种。乔木一般选用全冠假植苗或容器苗，树型美观，冠幅完整饱满，三级分支以上，不用截杆苗；位于交叉路口的乔木分支点要大于 2.1 米，以免影响行车视线；花灌木类等根据常用规格进行设计，树冠浓密，生长良好的树种。各地应根据实际情况，适地适树，就地取材，尽可能运用当地的特色苗木进行绿化，体现地方特色。具体品种推荐如下：

①乔木类：罗汉松、南洋楹、日本晚樱、香樟、木棉、小叶榄仁。



罗汉松



南洋楹

观花类品种：乐昌含笑、白玉兰、紫玉兰、丹桂、金桂、福建山樱花、红梅、碧桃。



日本晚樱



香樟



木棉



小叶榄仁

②灌木类：红花檵木桩景、红背桂、花叶鹅掌柴、红花三角梅、毛杜鹃、龟甲冬青球。



红花檵木桩景



红背桂



花叶鹅掌柴



红花三角梅



毛杜鹃



龟甲冬青球

③地被及草类

紫鸭跖草、紫花翠芦莉、大花芦莉、银边山营兰、麦冬、草坪。



紫鸭跖草



紫花翠芦莉



大花芦莉



银边山菅兰



麦冬



草坪

二、移民文化广场入口提升

对移民文化广场入口进行景观改造，台地提升，将现状泥土地块硬化处理，采用芝麻白荔枝面工字铺做法，步道拓宽，增加休闲桌椅形成小型活动场地，考虑台阶连接广场与镇政府两个高差空间，改善入口景观形象。



图 3-22 移民文化广场入口提升平面示意

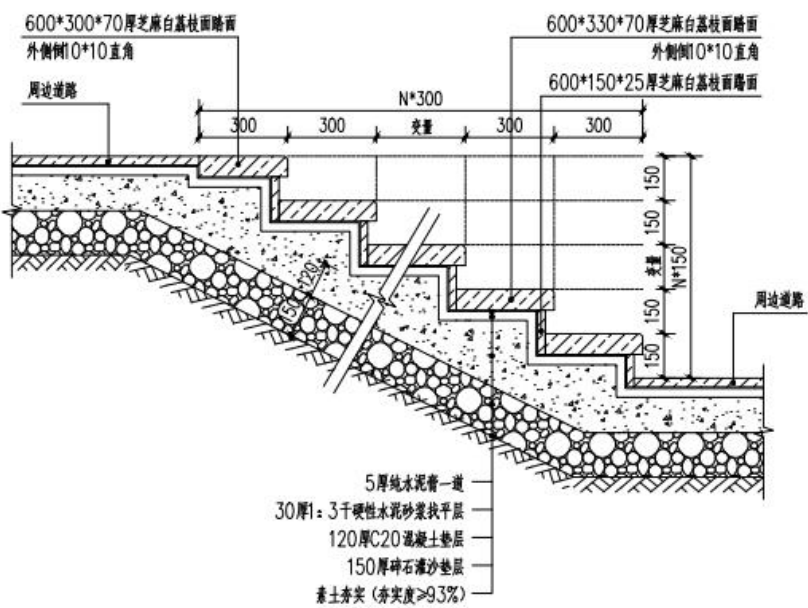


图 3-23 台阶做法大样图

三、环库湾线性公园

沿库湾路北侧打造环库湾线性公园，带状地块北临山美水库，在局部面域宽敞，视野开阔的场地设置休憩打卡景观节点，增加互动灯光漫游体验，并将现状人行道提升改造为石板路面，满足正常通行并能赏湖休憩娱乐。

环库湾线性公园主体设计以蓝色透水混凝土步道贯穿整个带状公园，形成一条蓝色飘带，犹如一条蜿蜒的水系，迎合库区水文化特色，地面材料增加荧光石，在夜间形成荧光步道，选取一段石材人行步道打造步步生花互动夜景灯光，增加夜间游玩体验感，满足游客的夜间娱乐游玩需求。立面上采用闽南传统红砖样式，使公园景观效果与整体环境相协调，在四个面域较为宽阔，视野良好的场地打造休憩娱乐的景观节点，做到既可正常通行又可赏湖观景。



图 3-24 环库湾线性公园平面图

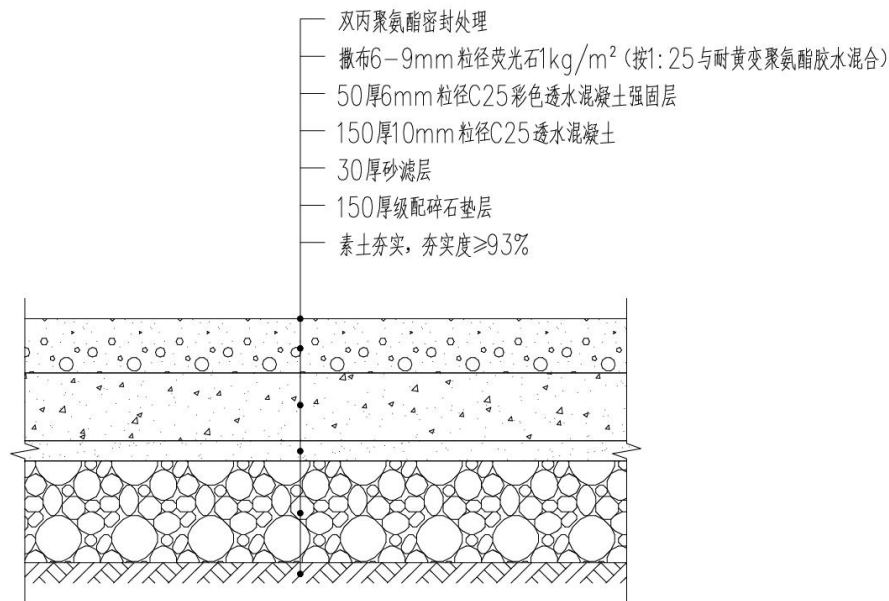


图 3-25 透水混凝土道路做法

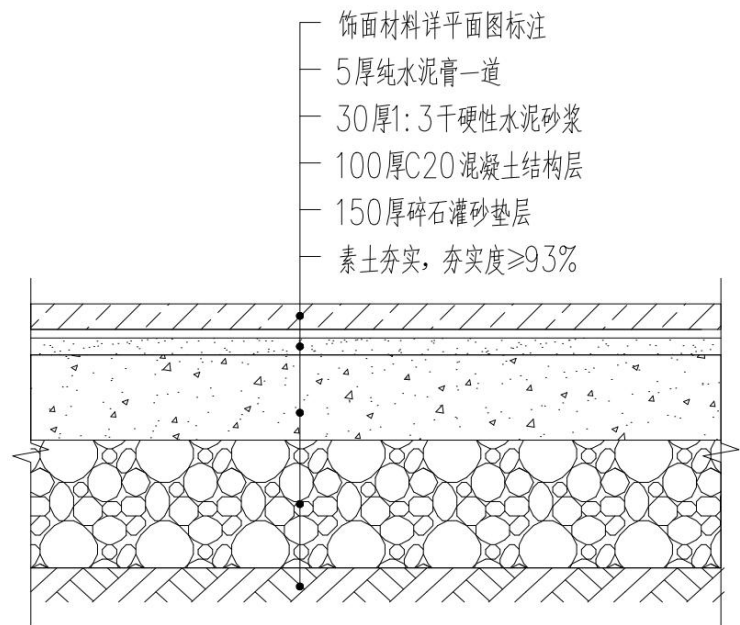


图 3-26 石材铺装地面做法

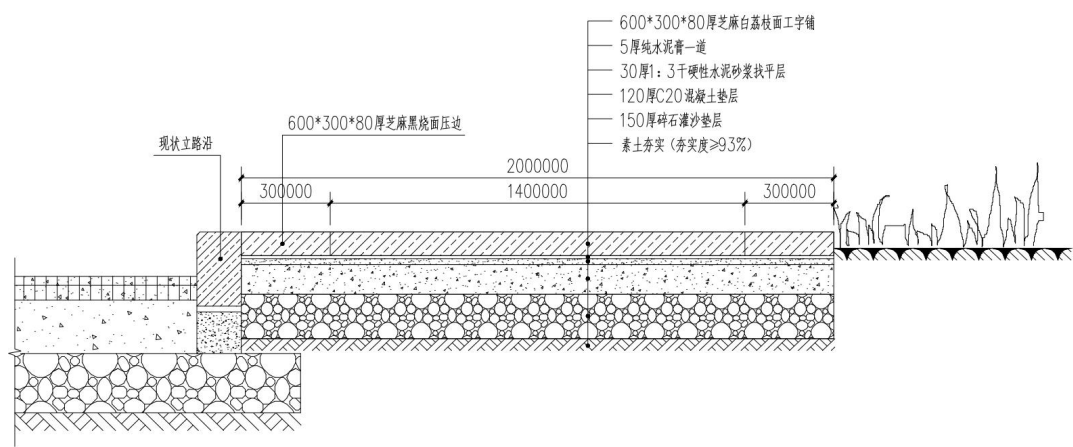


图 3-27 人行道做法

节点一：沿石板路一侧打造三个小型休憩空间，地面采用毛石碎拼做法，坐凳采用红砖砌筑，植物配置以乔木搭配观赏草为主，保证该区域视线通畅；设置三个人体感应花朵灯，增强人与景观的互动效果，也可满足游客的打卡需求，在空间较为宽敞处摆放水磨石坐凳，增强场地的实用性。



图 3-28 环库湾线性公园效果图



图 3-29 环库湾线性公园效果图

节点二：该节点位于小区入口对面，视线开阔，具有良好的观景效果，此处打造一个观景平台，平台设置栏杆保证游客安全，平台上设置画框打卡装置，画框整体呈现白色，框架结构采用热镀锌钢管、白色氟碳漆饰面，左上角白色 PVC 广告字，设计“至此已是画中人”字样，右下角彩色 PVC 广告字，“HELLO 南安”字样，具有较强的标志性，提升游客的打卡体验感；林下休憩平台既可休憩观景，也可作为民宿的外摆空间。



图 3-30 环库湾线性公园效果图



图 3-31 环库湾线性公园效果图二

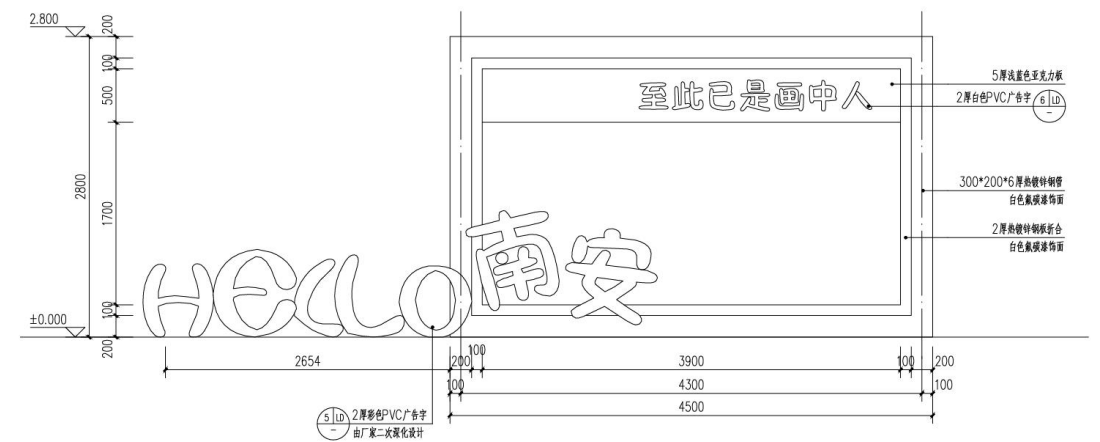


图 3-32 打卡画框做法

节点三：该节点位于库湾路西北侧转角，面域较宽，在此设计一处带状休憩节点，作为步道沿途的休憩空间。

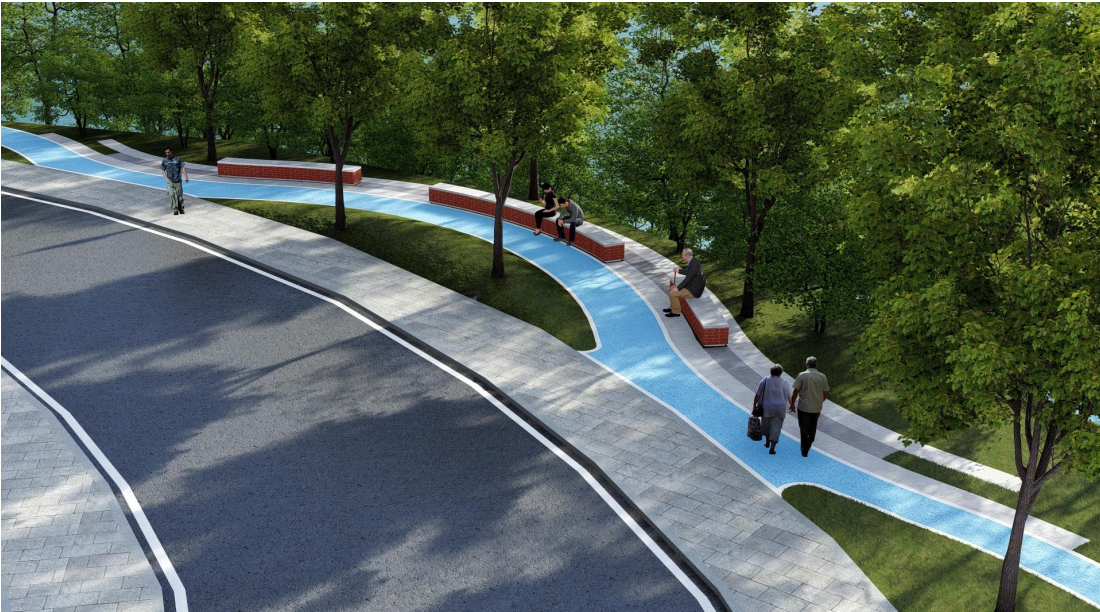


图 3-33 环库湾线性公园效果图

节点四：该节点位于库湾路起点约 100m 处，面域宽阔，视线良好，具有良好的观景效果，此处打造一个观景平台，穿插错落的观赏草围绕白色塔形廊架，打造舒适开阔的观景场地，同时也可作为打卡点。观景平台做法采用芝麻黑烧面齐缝铺与芝麻白荔枝面齐缝铺交替，白色廊架高 6.6m，宽 4.8m，主体结构采用热镀锌钢管，以白色氟碳漆饰面，整体轻盈不失格调。



图 3-34 环库湾线性公园效果图

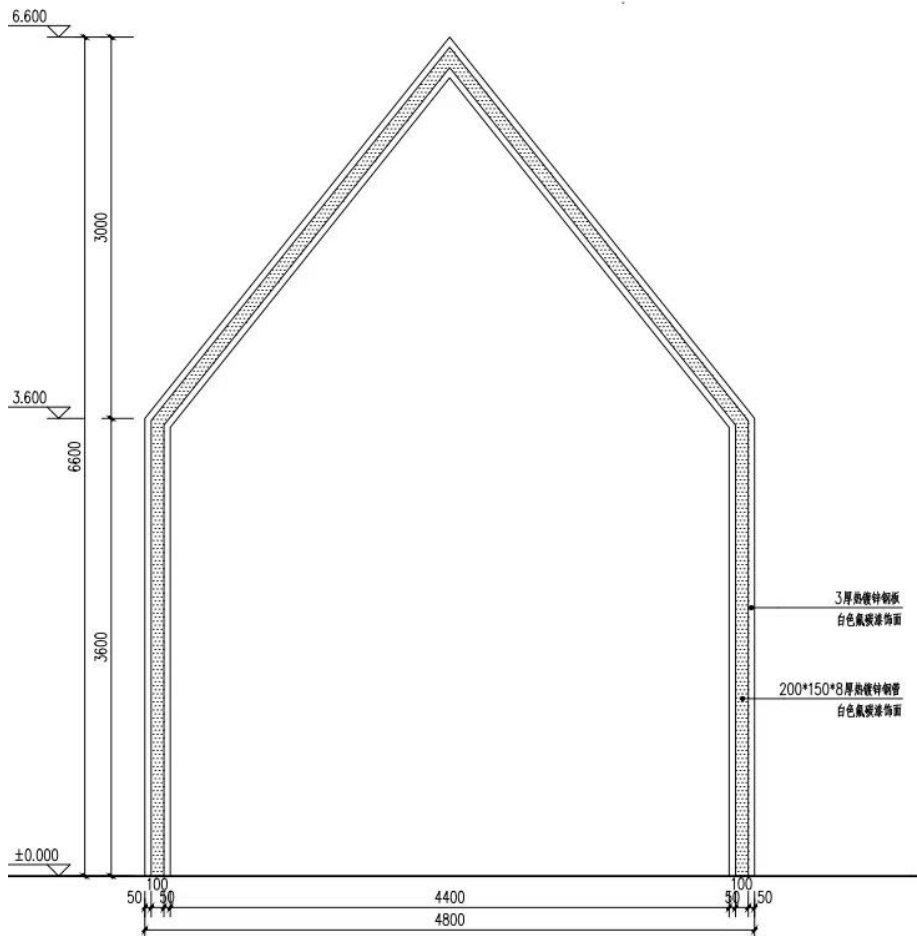


图 3-35 白色塔形廊架做法

3.3.1.3 村容村貌提升

一、库湾路路口提升

库湾路路口目前缺乏镇形象标志，植物较为杂乱，道路转角生硬，拟在路口增加九都镇镇标，结合“天空之城，山水九都”的主题打造具有九都文化特色的镇标，生硬的道路转角调整为弧形，并进行绿化提升设计。



图 3-36 库湾路路口现场照片



图 3-37 库湾路路口提升效果

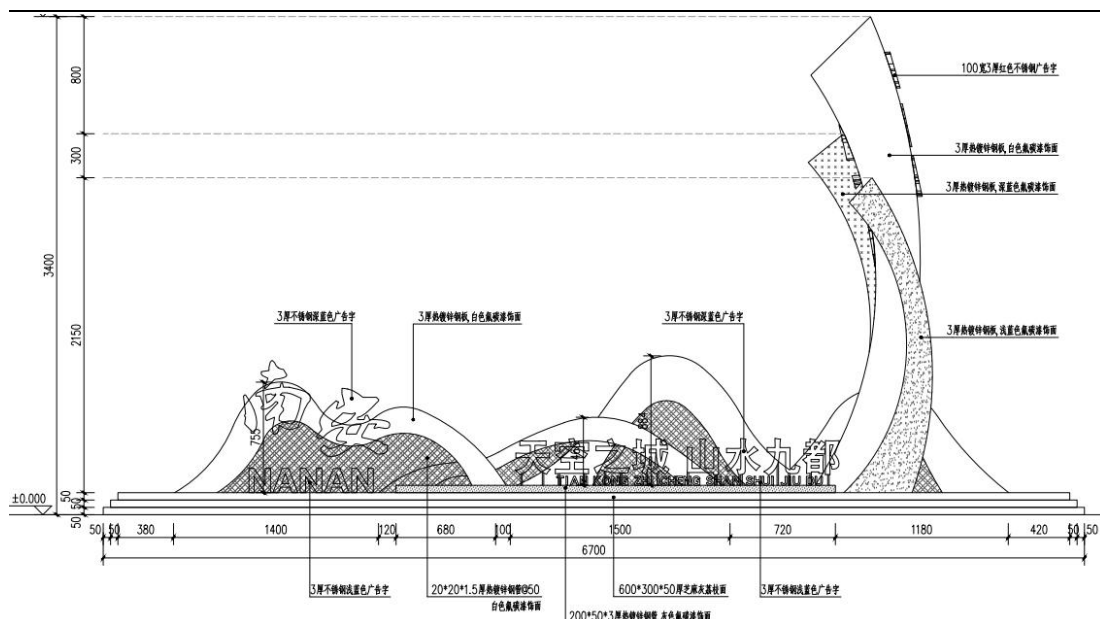


图 3-38 镇标做法

镇标整体高 3.4m，宽 6.7m，主体形式上契合山、水、天空的主题元素，颜色上提取水和天空的蓝白色调，整体材料使用热镀锌钢板，颜色使用深蓝色、白色氟碳漆饰面，底座采用芝麻灰荔枝面做法。

二、休闲长廊提升

休闲长廊现为简易钢架结构，简陋且影响美观，功能单一，将现有简易钢结构改为仿木纹漆饰面，增加吊顶，横梁底部增加挂落装饰，两侧加 0.3M 挑檐，靠水面一侧增加水利文化宣传栏及坐凳，具体为三个跨度为宣传栏，一个跨度为坐凳的节奏。



图 3-39 休闲长廊现场照片



图 3-40 休闲长廊提升效果

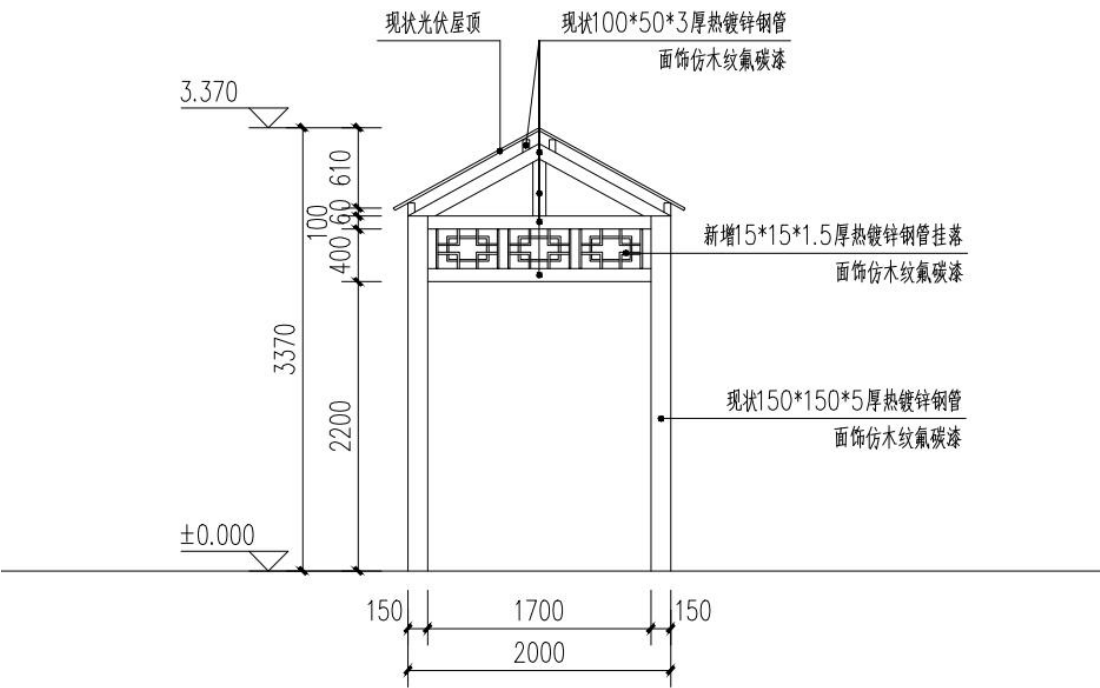


图 3-41 休闲长廊提升做法

三、库湾路起点文化展示墙

库湾路起点现状为沿路的单排停车场，缺乏景观点缀，整体形象不佳，设计结合闽南建筑的红砖，采用镂空做法打造水利文化展示墙，展示墙宽 27m，高 3-4.5m，展示墙左侧结合展示山美水库的河流水系与途径村镇，水系以及右

侧刻字部分采用热镀锌钢板、黑色氟碳漆饰面，文字做法采用 UV 打印，展示建库历程、建库意义以及河流水系，起到文化宣传与展示的作用，增强新东村文化底蕴。



图 3-42 库湾路起点场照片

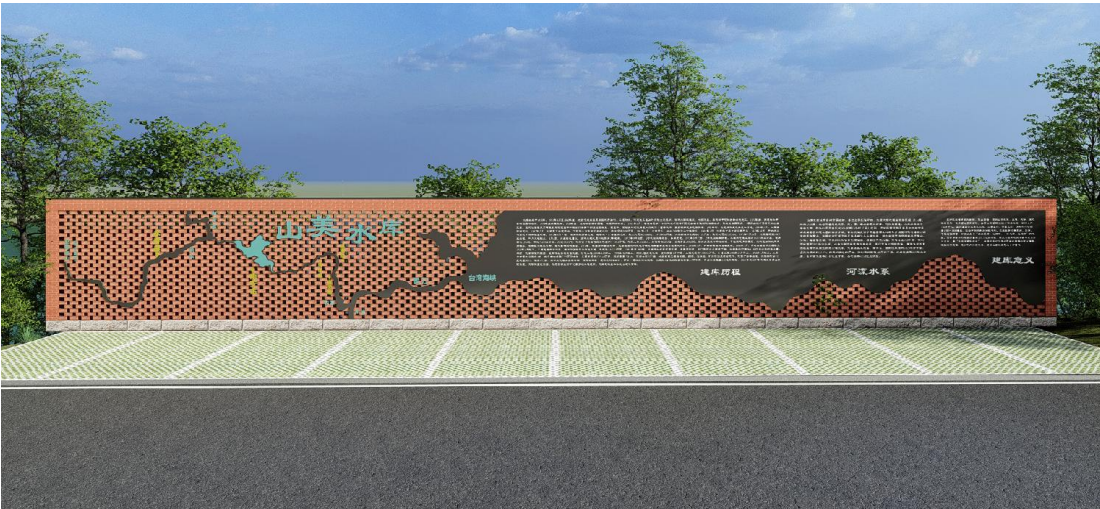


图 3-43 库湾路起点文化展示墙效果图




图 3-44 库湾路起点文化展示墙做法

四、观景平台提升

观景平台现状为泥土地面，杂草覆盖，缺乏景观效果与实用性，将平台地面增加硅金板木平台跟道牙平齐，增加雾森与夜景灯光，提升观景平台整体景观效果。



图 3-45 观景平台提升平面示意

五、亭子及周边修复

目前亭子及周边环境杂乱，亭子建筑陈旧且年久失修存在安全隐患，周边道路破旧，植物杂乱，堆砌的混凝土块挡墙具有安全隐患，将亭子进行清理并修复翻新，对亭子周边进行清理和局部修复，清理杂木，修复挡墙，对亭子周边的绿化进行提升设计，打造一个安全舒适的休憩观景节点。



图 3-46 亭子及周边修复平面示意

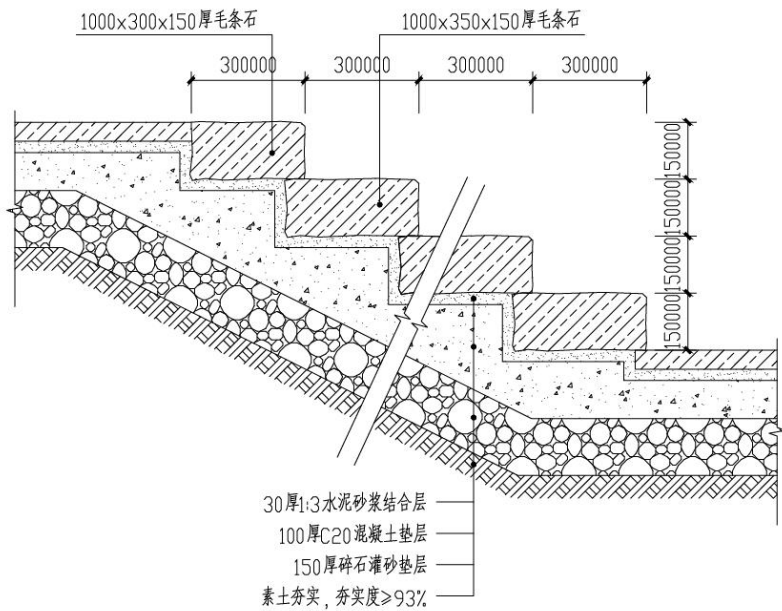


图 3-47 条石台阶做法



图 3-48 古渡口仿古介绍牌效果图

在古渡口与道路连接处新建平台，采用 50 厚青石板菠萝面做旧处理，长 5 米，宽 3 米；增加仿古介绍牌，介绍牌采用热镀锌钢管加仿木纹氟碳漆饰面做法，整体高度 2 米，宽 1,2 米。

六、挡墙建设

该路段新建小挡墙 180m，提高道路安全性。挡墙做法为 M7.5 浆砌 MU30 毛石挡墙。



图 3-49 小挡墙建设平面示意

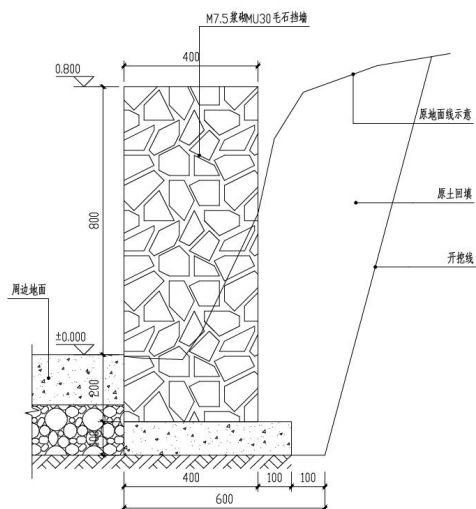


图 3-50 0.8m 高挡墙大样图

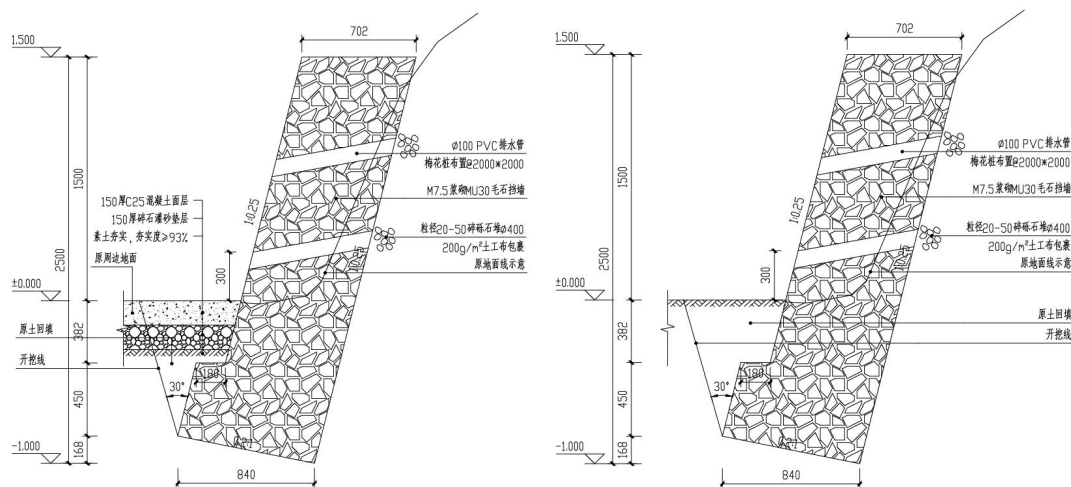


图 3-51 1.5m 高挡墙大样图

七、垃圾桶

在村内重点干道、节点按照服务半径约 200m 布置垃圾桶共 16 个。垃圾桶选择简单耐用的金属垃圾桶，完善环境卫生基础设施。



图 3-52 垃圾桶布置平面示意



图 3-53 垃圾桶意向图

八、智慧导览导视系统及夜景

1、智慧导览导视系统

标识系统体现村庄风貌维护和传承，突出移民元素，水利文化特色，拟建水利文化园、停车场、无动力公园、戏台、环库湾线性公园、库湾路起点、移

民文化广场周边等处景观设置指示牌。本项目设置展示牌 16 个，指示牌 20 个，警示牌 18 个。

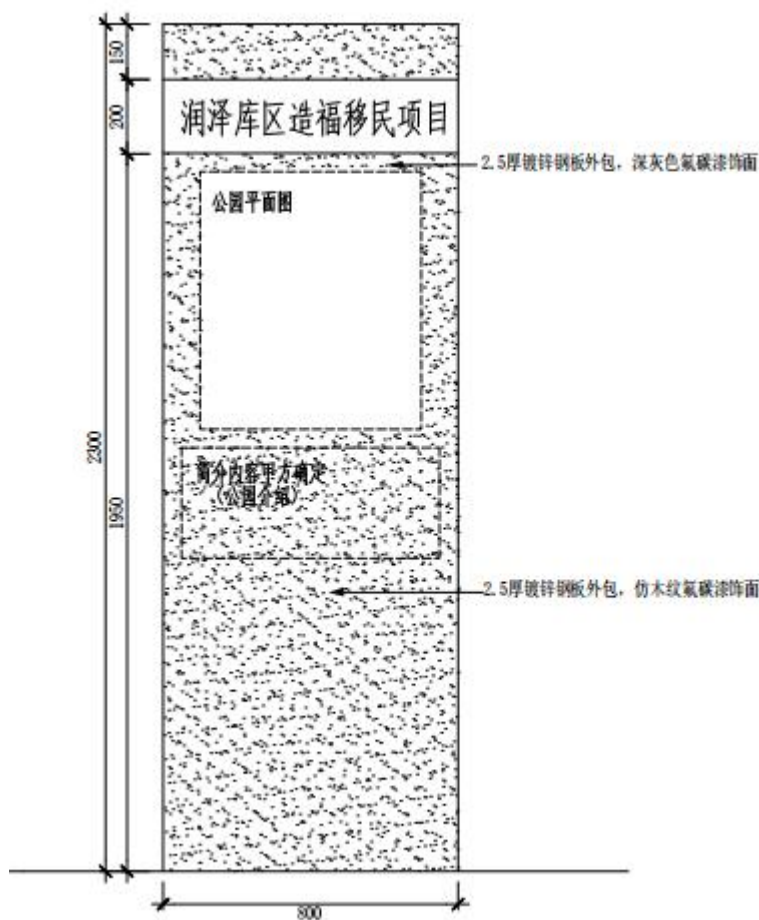


图 3-54 展示牌立面做法

2、夜景

本项目的夜景工程作为村庄基础设施的重要组成部分，对于提升村民夜间生活的质量、保障交通安全和增强村庄的整体形象有着不可忽视的作用。然而，随着时间的推移，这些设施的建设年代已经较久远，外观显得老旧，并且部分设备已经损坏，导致无法正常工作。这种情况不仅影响了村庄的环境美观，更给村民的夜间出行带来了不便，可能还会对村庄的安全产生潜在的影响。

为了改善这一状况，有必要对新东村的亮化工程进行全面的升级改造。这不仅包括更换老旧的设备和部件，还应该考虑采用更加节能环保、耐用的新型材料和技术。在设计新的亮化方案时，应当充分考虑到村庄的历史文化特色和自然环境，确保新工程的风格与村庄的整体风貌相协调，同时也要满足现代照

明功能的需求。

通过这样的升级改造，不仅能够解决村民夜间出行不便的问题，还能够提升新东村的环境品质，增强村庄的吸引力，为村民创造一个更加安全、舒适和美丽的居住环境。

本次设计范围主要为库湾路路口、库湾路沿线、水利文化园、停车场、无动力公园、环库湾线性公园、移民文化广场等位置增设步步生花互动灯、感应式花灯、地面互动灯光、戏台工矿灯、庭院灯、壁灯、廊亭吊灯、射树灯、瓦楞灯、台阶侧壁射灯、龟背灯、埋地可调射灯、洗墙灯、灯带、麦穗灯、蒲公英灯、芦苇灯等内容。



图 3-55 庭院灯草坪灯选型大样图

结合库区的水利文化和移民文化素材，夜景设计不仅丰富了新东村的文旅业态文化内涵，还成为了一种吸引游客的独特手段。这种设计使得游客在夜晚游览时，能够更深入地体验到新东村的历史文化。夜景设计的范围主要集中在环库湾线性公园和移民文化广场的外立面。这些区域不仅是村庄的门户，也是游客活动的主要区域。通过在这些地方实施夜景照明设计，不仅能够为游客提供一个美丽的夜间景观，还能够增强村庄的夜间活力，促进村庄内部的经济活动。

夜景设计充分考虑新东村的历史文化和建筑特色，使用适宜的照明技术和设备，创造出既能够展现村庄魅力、又不会对环境造成过多负担的夜景效果。夜景设计的实施还有助于提高村民的收入，通过吸引游客留宿和消费，为村庄

的经济发展注入新的动力。

在环库湾线性公园设计地面互动的夜景灯光秀，提升夜间散步的趣味性；地面互动用 S66 单台 250X444.4/200 寸，融和带 10%总共 40 台，安装距离 2.22 米。



图 3-56 智慧互动灯光效果图

3.3.2 公共基础设施建设

3.3.2.1 农村交通设施

一、库湾路路面提升

1、现状交通基础设施情况介绍

本项目位于南安市九都镇新东村，项目共涉及 4 段道路建设，路面改造面积约 10278 m²，新东村为移民村，目前整体交通基础设施较完善，路面大部分已硬化，存在部分支路未硬化，部分路段存在路面宽度不足 6.5m 的情况，现状路面破损较为严重，需对整体道路路面进行修复；并存在交通标线磨损较大。

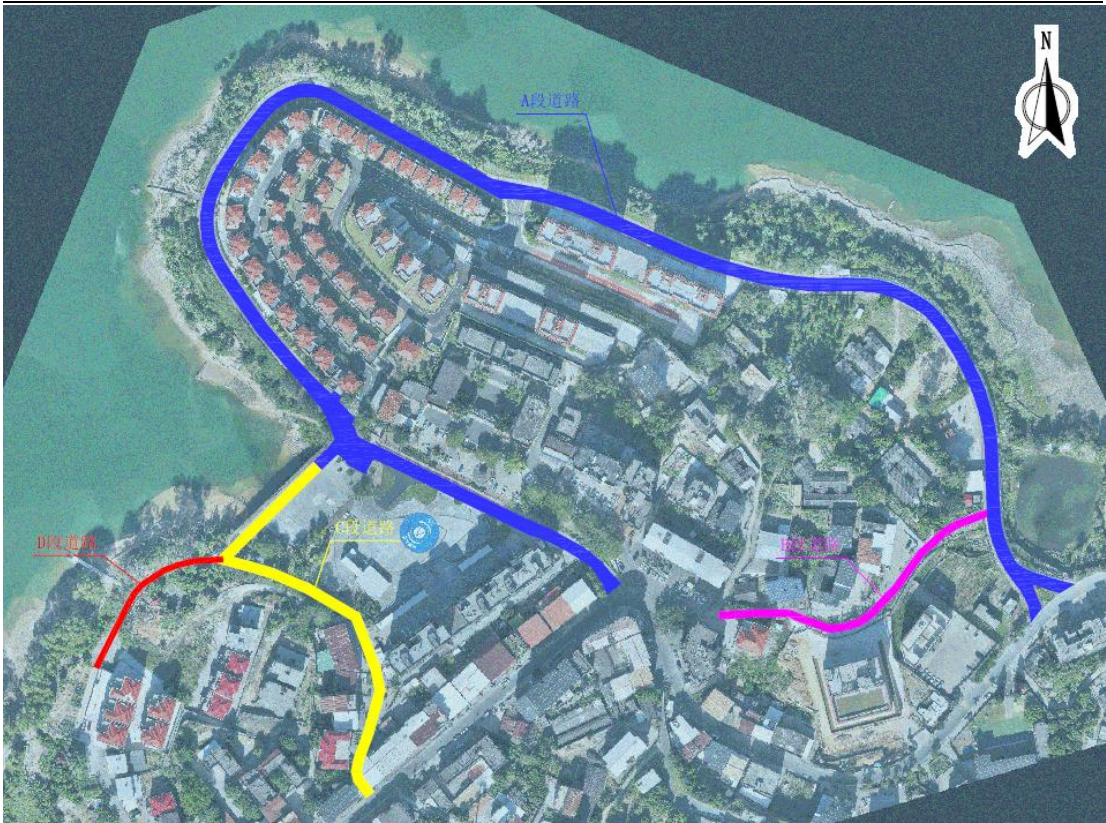


图3-56交通设施总体布置图

① A段主路

本路段道路全长约 1.004 公里，路面标准宽度约 7m，现状道路为水泥路面上加铺沥青混凝土路面，下敷设雨污水等管道。K0+000-K0+447.6 段现状路面纵线板裂明显，裂缝存在错层，影响行车安全，标线模糊；K0+447.6-K1+003.722 段路面整体状况较好，局部存在纵横向裂缝。现场情况如下所示。



图 3-57 A 段主线起点段现状图



图 3-58 A 段主线沿线路面情况



图 3-59 A 段主线沿线路面情况

② B段道路

B 段道路起点接主线，全长约 182.2 米，路面宽 3-4.5m，现状路面为水泥混凝土路面，路面整体情况较好，无交通标志牌及标线。本路段为村内小支路。现状如图所示。



图 3-60 B 段现状道路图



图 3-61 B 段现状道路图

③ C段道路

C段道路起点接主线，全长约260米，路面宽3-4.5m，现状路面为水泥混凝土面，路面整体情况较好，无交通标志牌及标线。如图所示。



图 3-62 C 段现状道路图



图 3-63 C 段现状道路图



图 3-64 C 段现状道路图

④ D段道路

D段道路起点接C道路，全长约101米，路面宽2.5-3.5m，现状为土路，拟对其进行硬化。本路段为村内小支路。现状如图所示。



图 3-65 D 段现状道路图



图 3-66 D 段现状道路图

2、库湾路路面提升改造方案

本项目共涉及 4 段道路改造，提升库湾区交通，项目路线平纵按旧路原有指标进行，未对其进行提级改造。

A 段道路现状为沥青混凝土路面，全长约 1.004 公里，其中 AK0+000-AK0+448 段沥青混凝土路面面层及水泥混凝土路面破除重建，AK0+448-AK1+003.722 段铣刨现状沥青面层 2cm 后直接加铺彩色沥青。

B 段道路现状为水泥混凝土路面，道路长度约 182.2 米，路面改造方案为直接加铺沥青，改造范围按现状旧路宽度执行。

C 段道路现状为水泥混凝土路面，道路长度约 260 米，路面改造方案为直接加铺沥青，改造范围按现状旧路宽度执行。

D 段道路现状为土路，路基已基本形成，道路长度约 101.1 米，拟对现状路基整平后新建沥青混凝土路面，改造范围按现状旧路宽度执行。

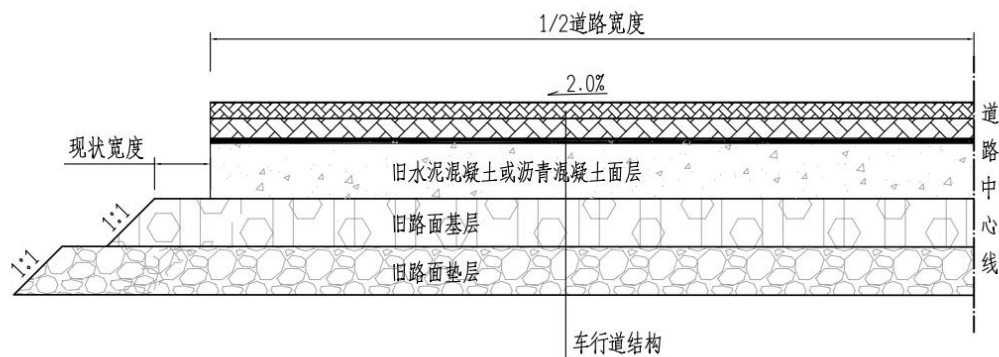


图 3-68 路面改造结构形式一（适用于旧路完好段直接加铺沥青）

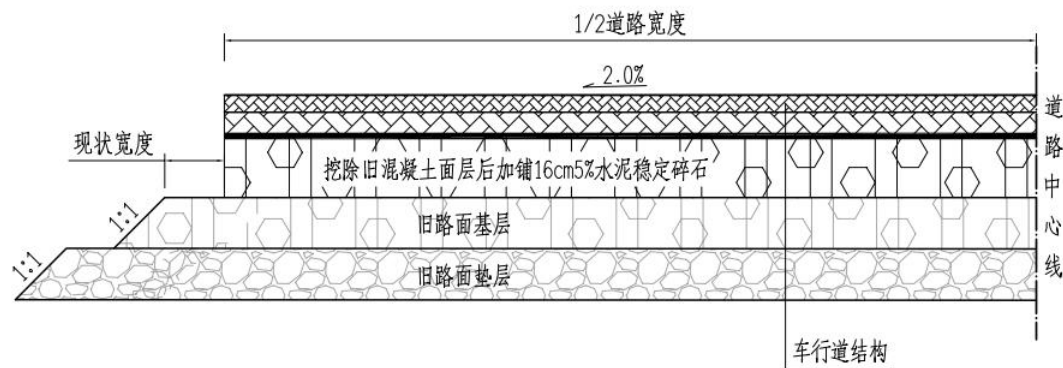


图 3-69 路面改造结构形式二（适用于旧路面挖除后加铺沥青段）

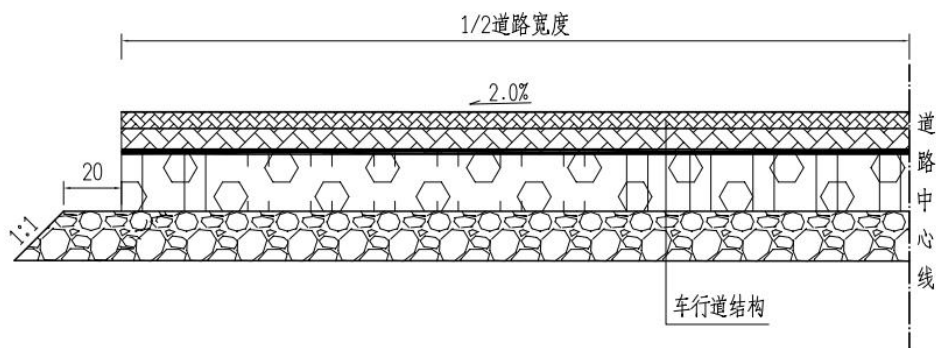


图 3-70 路面改造结构形式三（适用于土路新建路面结构段）

3.3.3 乡村文化建设

3.3.3.1 农村休闲文化设施

一、水利文化园

水利文化园建设面积约 1536 m²。结合水库地雕、人文雕塑等，设置趣味活动，吸引人流停留，增加游客量。水利文化公园秉持重现库区移民历史的设计理念，精心打造了反映库区建设前村庄与乡镇原始分布的地雕，让游客仿佛穿越时光，见证昔日的地域风貌。公园内特别设立了一面以金门供水工程为背景的历史文化景墙，结合休闲廊架设计，通过这一艺术表达形式讲述那段波澜壮阔的历史，展现人与自然和谐共生的故事。地雕、景墙与休闲空间相互辉映，共同构成了一个既具教育意义又富有观赏价值的文化景观，带领人们深入了解库区移民的生活变迁与宝贵记忆，提供了一个既能休憩又能学习和反思的空间。



图 3-71 水利文化园平面图

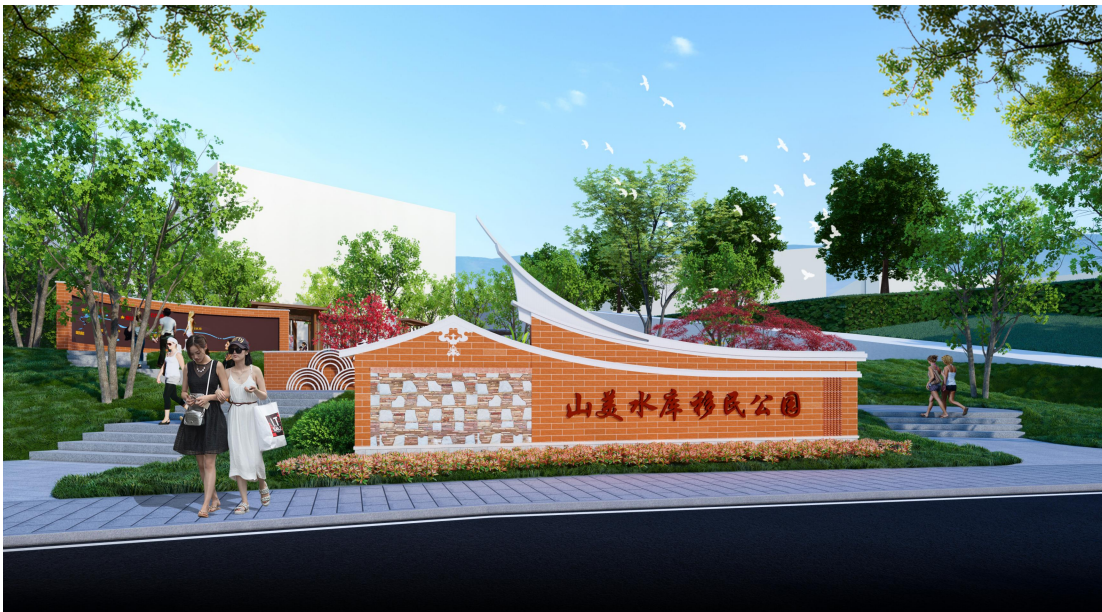


图 3-72 入口案名景墙效果图

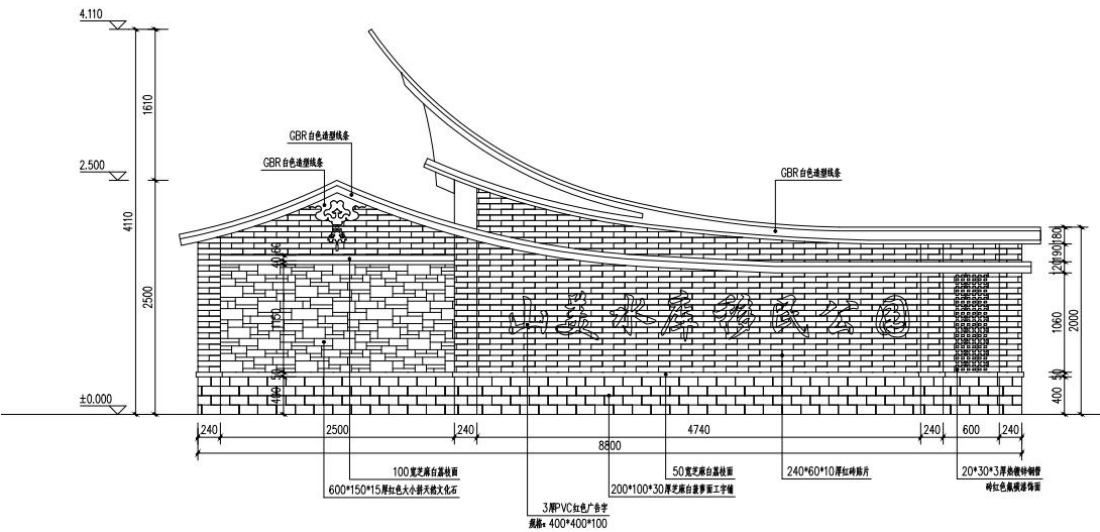


图 3-73 入口案名景墙做法

入口案名景墙提取闽南传统建筑的元素，立面主体采用红砖贴片做法，局部采用出砖露石的手法点缀，轮廓上提取建筑山墙的形式，点缀山花，压顶提取建筑燕尾脊的做法，整体为当地传统建筑的风格样式的变体，具有文化展示与入口标识的作用。



图 3-74 廊架、地雕效果图

该休憩节点结合地雕设计，地雕反映库区建设前村庄与乡镇原始分布，具有强烈的文化展示与宣传的功能，地雕采用石材阳刻做法，直径 7.3m。



图 3-75 库区移民文化展示墙效果图

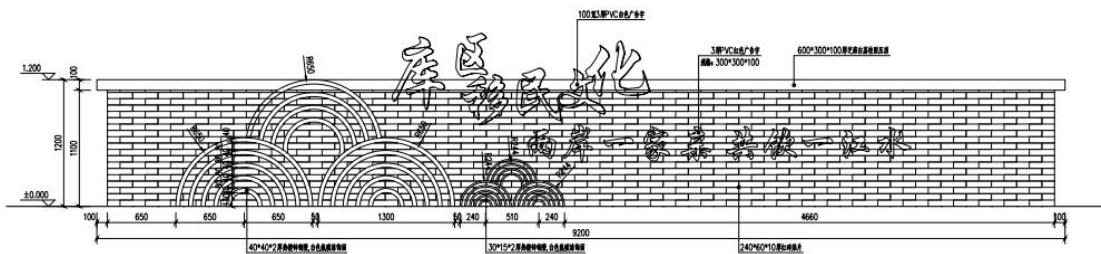


图 3-76 库区移民文化展示墙立面做法

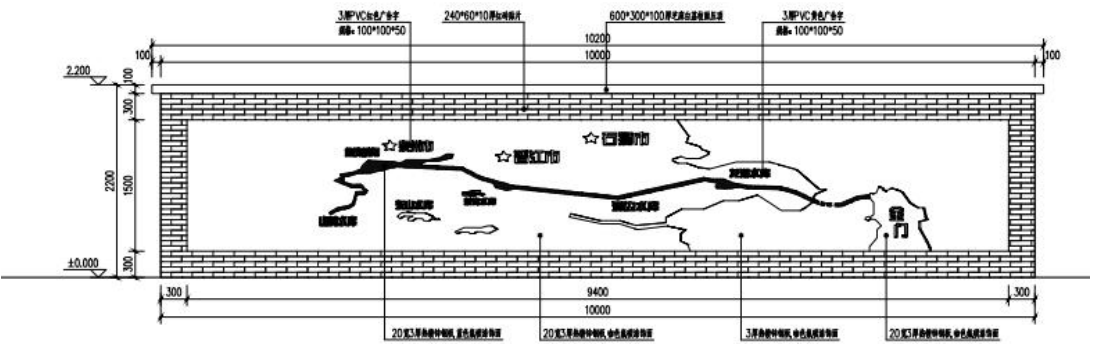


图 3-77 金門供水文化展示墙做法

公园内特别设立了一面以金门供水工程为背景的历史文化景墙，通过这一艺术表达形式讲述那段波澜壮阔的历史，展现人与自然和谐共生的故事。既具教育意义又富有观赏价值，带领人们深入了解库区移民的生活变迁与宝贵记忆。

二、库湾路公共停车场

库湾路公共停车场建设用地约 1293 m²。设计机动车停车位共 21 个，完善

周边景点停车需求。根据现场的地形高差，精心设计停车场布局，确保充分利用空间的同时，与周围环境和谐融合。同时，为住户保留一条便捷且安全的通行道路，保证居民日常出行的顺畅无阻。此设计不仅考虑到了停车需求，也充分尊重了住户的生活便利性，提升了整个区域的功能性和居住品质。



图 3-78 库湾路公共停车场平面图

三、无动力公园

无动力公园建设面积约 1965 m²。无动力公园强调自然与人的和谐，利用地形创造互动空间。通过设置滑梯等简单设施，鼓励儿童探索，促进身心发展。无动力乐园以水纹为设计灵感，巧妙地将这一元素融入整个园区的规划之中。入口处设立独具特色的案名墙，不仅标志着乐园的起点，也预示着一场水上奇幻之旅的开启。乐园内特别设置了鲸鱼造型的游乐设施，仿佛带领游客潜入深海世界，探索未知的秘密。此外，丰富的无动力游乐设施散布其中，通过这些设施，整个公园生动再现了库区的水文化，让游客在游玩的同时，感受到水与自然和谐共存的魅力。此设计既保留了库区的文化底蕴，又为家庭和孩子们提供了一个充满乐趣、安全无忧的游乐天地。



图 3-79 无动力公园平面图



图 3-80 无动力公园效果图一



图 3-81 无动力公园效果图二



图 3-82 无动力公园效果

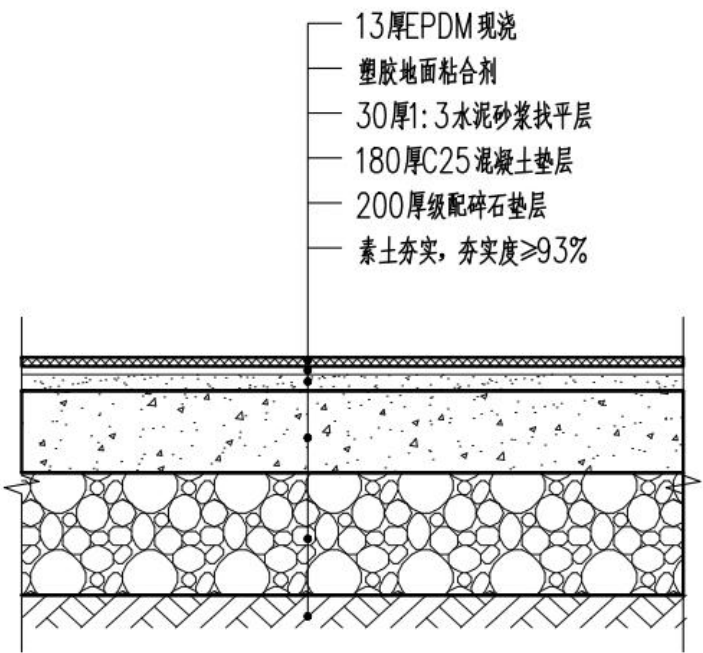


图 3-83 橡胶地面做法

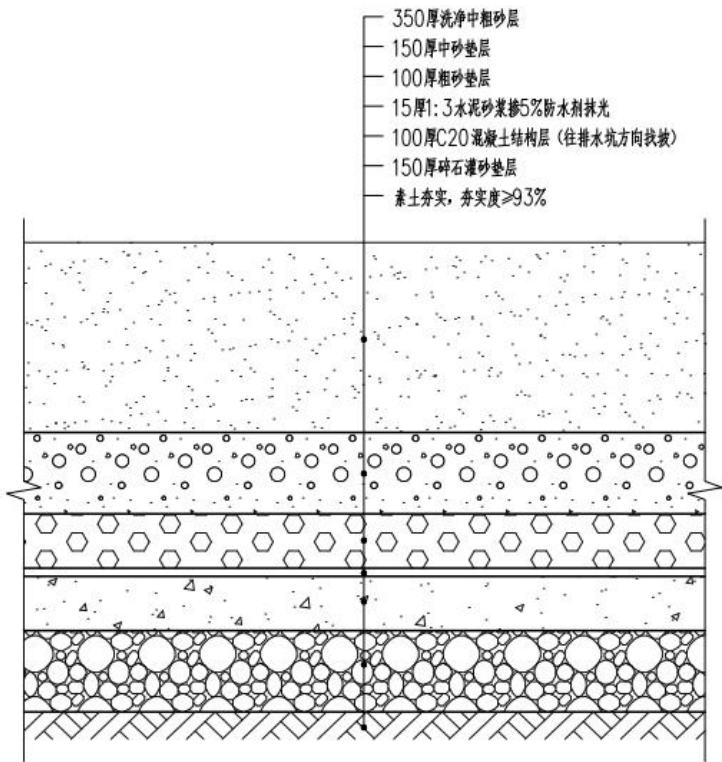


图 3-84 沙坑地面做法

3.4 金圭村建设方案：包含了美丽移民村建设等内容。

3.4.1 美丽移民村建设主要包含：环库绿化景观提升、村容村貌提升等内容，具体建设规模如下：

(1) 美丽移民村建设

1.环库绿化景观提升

①步道提升 665 m²；

②园路挡墙 310m；

③花池提升 160m；

④绿化提升 3200 m²；

⑤智慧导览导视系统及夜景 1 项。

2.村容村貌提升

①垃圾桶设施 10 个。

3.4.1.1 美丽移民村建设

一、步道提升：改造现有狭窄步道，在现有基础山拓宽至 1.5M 宽度，将凹凸不平的路面调整为石板路面，方便周边居民及游客的舒适通行；

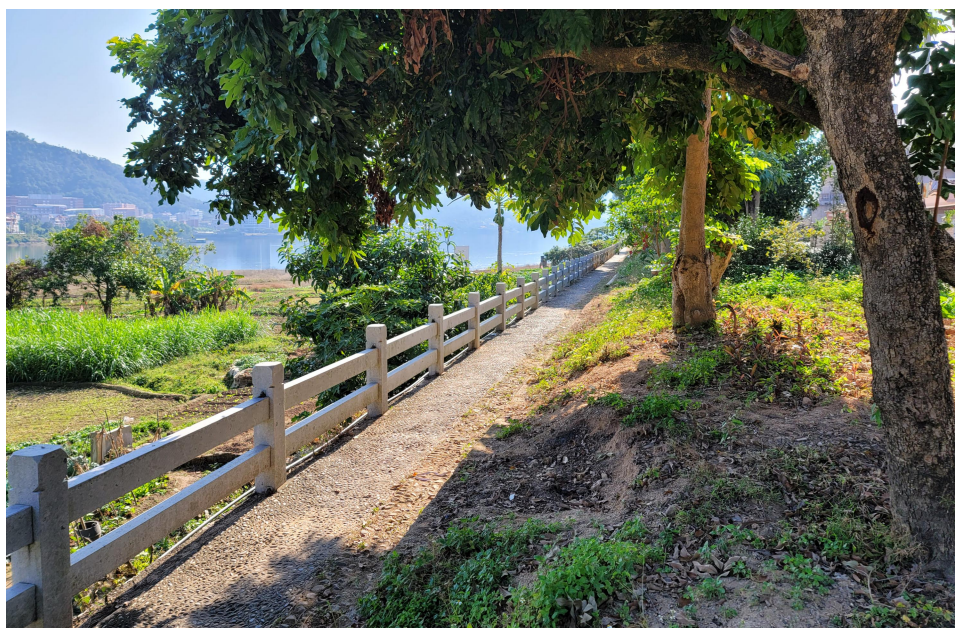


图 3-85 步道现状



图 3-86 步道提升效果意向

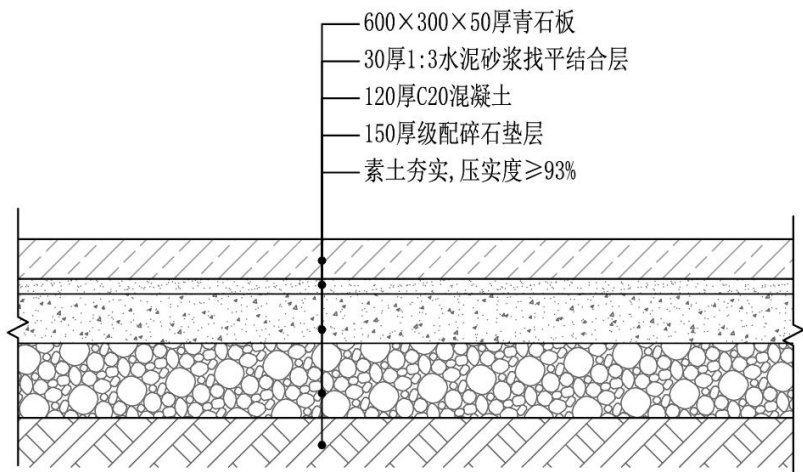


图 3-87 步道提升做法

二、园路挡墙：绿地与步道之间一定的高差，为了更好的巩固场地土方及增加休息场地，在路面拓宽之后增加挡墙内容；



图 3-88 挡墙现状



图 3-89 挡墙效果意向

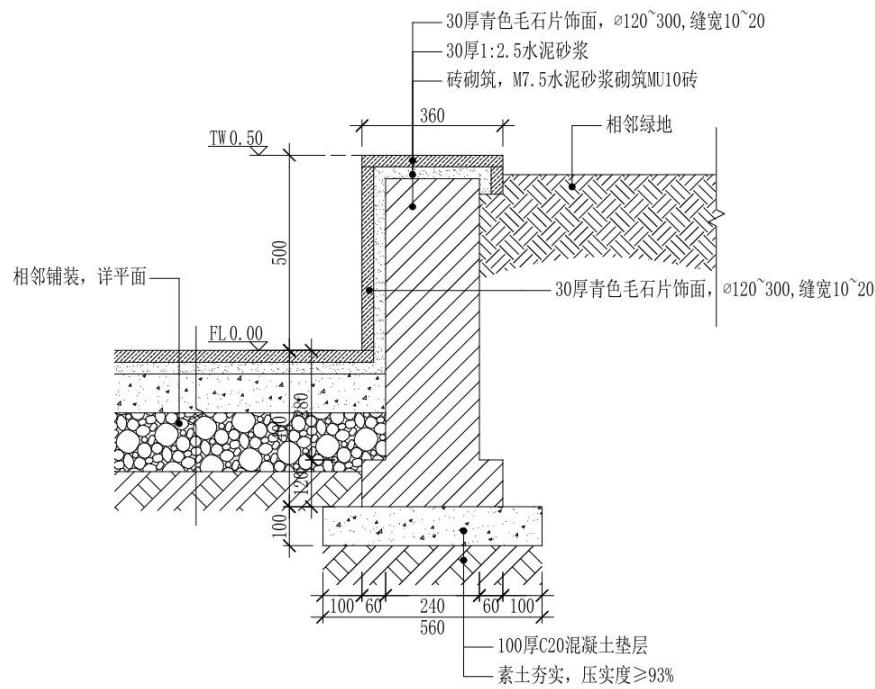


图 3-90 挡墙做法

三、花池提升，针对露营基地周边现有砖砌裸露比较杂乱的花池采用自然石饰面进行提升设计；



图 3-91 花池现状



图 3-92 花池提升效果意向

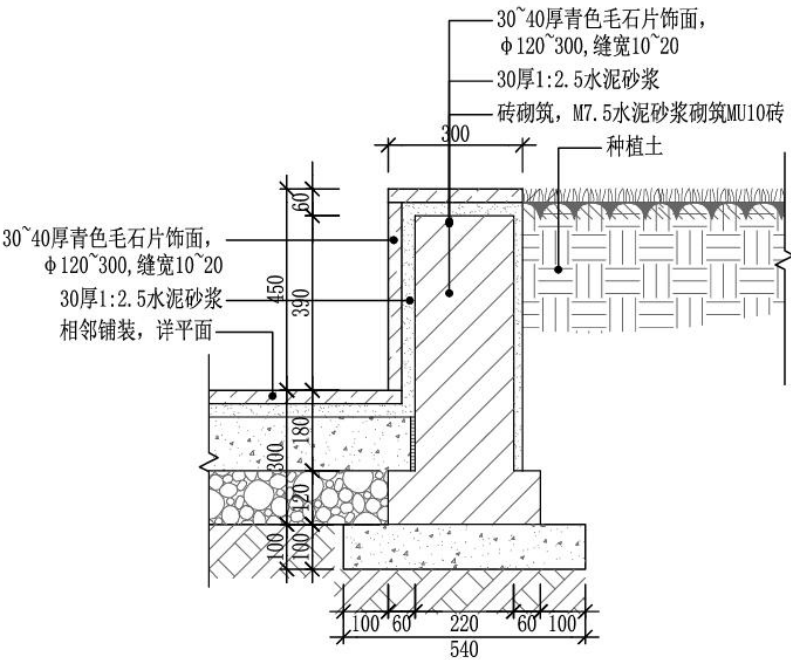


图 3-93 花池做法

四、绿化提升：沿线绿地内目前存在大量杂地，绿地杂乱，使用混乱，通过重新梳理场地，规整绿化内容，预留较多草坪空间，可作为草坪露营等使用。沿道路边缘增设房车停车空间，方便外来露营人员的使用。种植多年生草花植

被，增加观花观叶等灌木内容，增加沿线的风景；



图 3-94 绿地现状



图 3-95 绿地提升效果意向



图 3-96 绿地提升效果意向



图 3-97 绿地提升草坪露营地效果

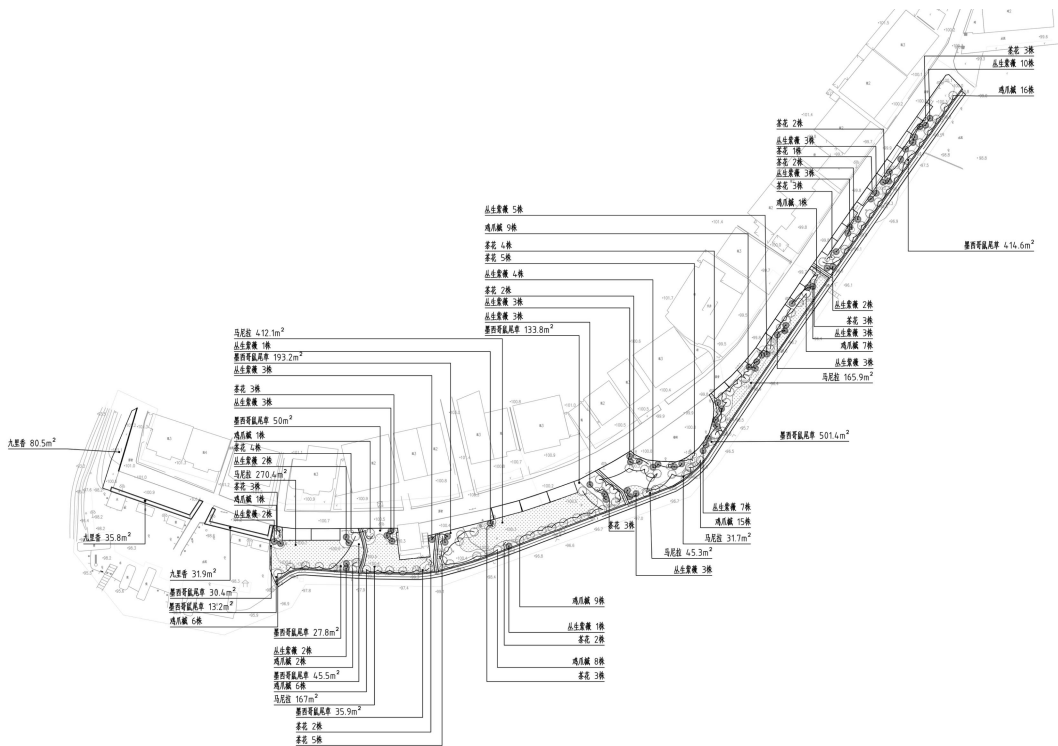


图 3-98 绿化布置图

金圭村苗木汇总表								
序号	名称	规格			数量	单位	基肥 (kg/株、m³)	备注
		米 (地) 径cm	高度 (cm)	冠幅 (cm)				
乔、灌木种植								
1	鸡爪槭	D8-9	>200	>180	81.0	株	15	全冠容器苗，精品苗，大于三级分枝，冠幅饱满，树型优美
2	丛生紫薇	——	180-200	>150	63.0	株	10	全冠容器苗，精品苗，多株拼丛，以高度冠幅为准，冠幅饱满，树型优美
3	茶花	——	110-130	80-100	50.0	株	10	全冠容器苗，精品苗，冠幅饱满，树型优美，大于三级分枝
地被种植								
1	九里香	——	30-35	25-30	148.20	m²	5	袋苗，36株/m²
2	墨西哥鼠尾草	——	25-30	20-25	1445.80	m²	5	袋苗，36株/m²
3	马尼拉	——	——	——	1092.4	m²	3	满铺
其他工程								
1	换填/回填种植土	——	——	——	805.9	m³	——	平均深度30cm
2	绿化场地整理	——	——	——	2686.4	m²	——	红线范围内绿化场地整理，平均深度30cm

图 3-99 绿化布苗木表

3.4.1.2 村容村貌提升

①垃圾桶设施 10 个，沿篮球场至露营基地布置，完善公共配套设施。



图 3-100 垃圾桶意向

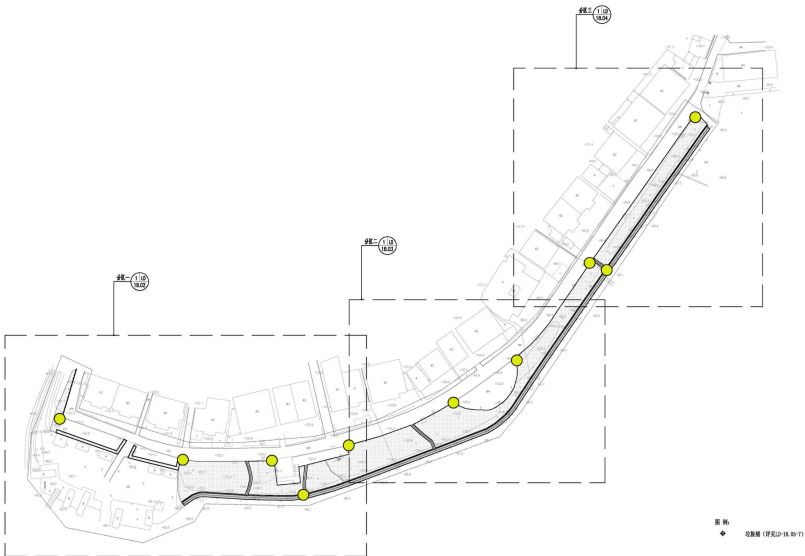


图 3-101 垃圾桶分布图

4 施工组织设计

4.1 施工条件

4.1.1 工程概况

本项目工程位于南安市九都镇两个移民村，以移民村人居环境整治工程为主，建设内容主要分为以下几部分：

本项目建设范围点位于南安市九都镇新东村、金圭村，根据实际情况主要以美丽移民村建设、村容村貌维护提升、农村基础设施建设、公共服务设施建设、产业转型等内容，加强移民安置区基础设施和环境建设，改善移民生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，加快补齐移民民生社会事业短板，打通“绿水青山变成金山银山”的转换通道，改“输血”为“造血”，实现“产业优、百姓富、生态美”的目标。

一、新东村主要设计规模如下：

（1）美丽移民村建设

1.旧建筑改造提升

①移民文化展示中心立面提升 754 m²；

②库湾路戏台改造 130 m²；

③水泵房立面改造 256 m²。

2.环库绿化景观提升

①移民文化广场绿化提升 1700 m²；

②移民文化广场入口提升 440 m²；

③建设环库湾线性公园 4113 m²。

3.村容村貌提升

①库湾路路口提升 100 m²；

②休闲长廊提升 290 m²；

③建设库湾路起点文化展示墙 27m；

④观景平台提升 150 m²;

⑤亭子及周边修复一项;

⑥建设挡墙 180m;

⑦新增垃圾桶 16 个;

⑧增加智慧导览导视系统,在水利文化园、停车场、无动力公园、戏台、环库湾线性公园、库湾路起点、移民文化广场周边等处景观设置展示牌 16 个,指示牌 20 个,警示牌 18 个。增加高杆射灯 60 套、庭院灯 48 套,智慧互动灯光系统一项,草坪灯一项,射树灯、洗墙灯、瓦楞灯、LED 灯带等内容。

(2) 公共基础设施建设

1.农村交通设施

①库湾路路面提升 1405m。

(3) 乡村文化建设

1.农村休闲文化设施

①水利文化园 1536 m²;

②库湾路公共停车场 1293 m²;

③无动力公园 1965 m²。

二、金圭村主要设计规模如下:

(1) 美丽移民村建设

1.环库绿化景观提升

①步道提升 665 m²;

②园路挡墙 310m;

③花池提升 160m;

④绿化提升 3200 m²;

⑤智慧导览导视系统及夜景 1 项。

2.村容村貌提升

①垃圾桶设施 10 个。

九都，原名彭都，位于南安市东北部，西北连永春县，东南临罗东镇，西至码头镇，东达向阳乡。九都镇境内多山，四季分明，常年温和，夏长少酷暑，冬短无严寒，光热充足，无霜期长，雨量充沛，全镇山地面积 64630 亩，森林覆盖率达 70%，耕地面积 2300 亩，主要农作物为水稻、甘薯、花生和其他蔬菜。

九都镇是省级环境优美乡镇，为进一步发挥九都镇库区乡镇独特优势，打好旅游开发这场硬仗。1972 年，应国家建设需要，在九都境内蓄水建成“泉州人民的生命库”——泉州山美水库。库区四面环山，环境优美。

九都镇四周群山环抱，中间为峡谷小盆地，镇域内大小山峰林立，其中全镇的制高点五台山（又名岳山）海拔 1080 米，是全镇的最高峰，其延伸下来有卓云山、古里尖，大湖山，秀峰山等，大山山寨有姑店寨、码头寨、溪尾寨，白叶寨等，全镇主要河流为彭溪，汇入山美水库。九都境内地形整体由低平地→缓坡→低山→高丘陵→低丘陵→缓坡→低平地递变，并将山美水库环抱于内，环境优美，库区周边地势平坦。镇区所在地依山傍水，西北面为泉州市水源保护地山美水库，水质优良，风景优美，四周群山环抱，青山隐隐，碧水迢迢，具有发展文旅产业得天独厚的地理条件。

4.1.2 自然条件

（1）水文气象

南安市属中亚热带季风气候区，日照充足、雨量充沛、蒸发旺盛、雨热同期，四季明显。一般夏季多暖湿东南风，冬季多干燥的西北或东北风气候。其主要气象要素特征以安溪气象站为代表，经统计：

（2）降水

流域降水主要有两类：5~6 月的梅雨和 7~9 月的台风暴雨，年降水量在地域分布有明显的差别，自西北山区向东南沿海逐渐减少，西北山区地势较高，

且受戴云山脉的阻隔，多年平均年降水量在 1600mm 以上；东南沿海地势平坦受海洋气候影响，多年平均年降水量在 1300mm 左右。由安溪气象站降雨资料分析，降水季节明显，年内分配不均，3~4 月为春雨季，占年雨量 16.8%，5~6 月为梅雨季，雨量达到高峰，约占 28.5%，7 月受单一副高控制，天气晴热，雨量减少，8~9 月随台风雨、雷阵雨增多，又使雨量出现第二个高峰，7~9 月雨量占全年的 38.8%，10 月以后雨量明显减少，10~翌年 2 月为少雨季，占年雨量 15.6%，平均年降水日数为 143 天，大于 10mm 的日数为 47.2 天，大于 50mm 的日数为 6.0 天。

（3）地形、地质

本流域位于戴云山脉东南侧，属闽南中低山丘陵地，河床两岸可见零星阶地分布。地势呈西北高、东南低，水系呈树枝状分布，上游多为中、高山地，中游为低山丘陵，下游为泉州、晋江沿海平原。由于晋江河床的变迁，沿江形成许多串珠状的河谷平原和盆地，如安溪的官桥、湖头盆地，永春的蓬壶、城关盆地等。晋江干流至河口的沉积、冲积地带，是福建省四大平原之一的泉州平原，面积为 345km²，占全省总面积的 0.29%。

西北属博平岭山脉向南延伸部分，一般海拔 800-1200m，北部紧邻戴云山脉南沿，沿海丘陵台地，地形交错分布，起伏不平，海拔一般 400m 以下至数十米。区内平和、南靖等内陆县市的地形以中低山丘陵台地为主，中低山丘陵台地山顶海拔高程以 1000~500m 为主。项目区内主要为侵剥蚀中低山河谷地貌单元，地形高低起伏，高差变化较大，总体由西北向东南逐渐降低。区内沟谷纵横，水系发育，本区东部和西部分属九龙江和韩江水系，溪流密度大，多呈树枝状分布，且河谷深切，落差大，水流湍急。

4.2 主体工程施工

4.2.1 绿化种植施工

绿化种植划分为种植环境处理，绿化放样，选苗和种植，养护四个部分。

种植环境处理：先进行垃圾、杂草的清理，种植土应耙细整平，排水良好；并应进行土壤消毒，杀灭病菌和害虫后，施适量的基肥。

绿化放样：以设计为依据，先放毛样，如平面布置与现场不利，应及时报告监理工程师，以便设计单位作变更设计。试放样经认可后，正式定点放线。

选苗与种植：严格按照设计图规定的规格选购苗木，并对选购的苗木，在起掘前作现场调查，认真核实所采购苗木的品种、规格及生长情况；根据所选苗木的规格、品种确定苗木的土球大小、起掘时间和包扎、运输方法，苗木的栽植应做到随挖、随运、随种、随养护，苗木起掘后不得暴晒或失水，若不能及时种植应采取保护措施，如覆盖、假植。种植前按设计要求放细样，定好株行距；树木栽植槽穴规格的大小、深浅，按植株的土球直径适当放大；对地被小苗的种植，在种植前土壤耙细整平，排水良好，根据树种和气候等具体情况进行适当修剪。

种植后适时进行浇水养护。引道香樟应卷干保护并予支撑固定。

养护：大苗种植后第一次应浇透水，以后看天气情况定期浇水，并用树桩打桩固定。一年养护派专职养护队伍进行精心养护，保证苗木成活，生长良好。

4.2.2 标识管理系统

标识系统施工工艺是指在景观环境中设置标识系统的一系列技术步骤和方法。景观标识系统包括导向标识、信息标识、警示标识、艺术标识等，用于提供信息指引、安全警示和艺术装饰等功能。以下是景观标识系统施工的基本工艺流程：

1. 前期准备：

调研和规划：根据标识系统的用途、所处环境、目标受众等因素进行调研和规划，确定标识的设计方案、种类、数量和摆放位置。

设计方案：根据规划结果，设计景观标识的视觉效果、尺寸、材料、构造等。准备必要的施工设备和材料。

2. 基础施工：

基坑开挖：根据设计要求，在标识立柱的基础位置开挖基坑，确保基坑的

尺寸、深度和稳定性满足要求。

浇筑基底：在基坑中浇筑混凝土，形成标识立柱的基础。

绑扎钢筋：在混凝土浇筑前，按照设计要求绑扎钢筋，增强基础的承载能力。

3. 立柱安装：

立柱制作：根据设计要求，制作标识立柱，确保立柱的稳定性和耐久性。

立柱安装：将制作好的标识立柱安装到基础中，调整至垂直状态，并进行固定。

4. 标识牌安装：

标识牌制作：根据设计要求，制作标识牌，包括牌面、支架等。

标识牌安装：将制作好的标识牌安装到立柱的支架上，确保标识牌的平稳、牢固。

连接电源：对于需要照明或电子设备的标识牌，连接电源和控制系统。

5. 调试与验收：

标识系统调试：检查标识系统的功能是否正常，如照明、电子设备等。

验收：组织验收，确保标识系统的施工质量、功能性和安全性满足要求。

6. 后期维护：

提供维护手册，指导用户进行日常维护和保养，延长户外标识系统的使用寿命。

定期对标识系统进行检查、清洁、维修和必要的更换，确保标识系统的正常运行。

在整个施工过程中，需要注意以下几点：

遵循国家相关法律法规和技术标准，确保施工质量和安全。

充分考虑标识系统的可视性、易读性、美观性和与环境协调性。

选择合适的材料和构造，提高户外标识系统的耐久性和抗干扰能力。

注重施工细节，确保标识系统的稳定性和功能性。

4.2.3 亮化工程施工工艺

是指在安装路灯过程中应遵循的一系列技术规范 and 操作程序，以确保路灯的安全性、稳定性和功能性。以下是路灯施工工艺的主要步骤和注意事项：

1. 施工前准备：

制定详细的施工方案和设计图纸，确保施工符合设计要求。准备必要的施工材料、设备和工具，如路灯杆、灯具、电缆、绝缘子、螺栓对施工人员进行技术培训和安全教育，确保他们了解施工要求和操作规程。

2. 现场勘查：

对施工地点进行勘查，了解现场条件，如道路状况、地下管线分布、交通流量等。确定路灯的安装位置、高度和间距，确保符合规划和设计要求。

3. 基础施工：

根据设计要求和技术规范，挖设路灯基础坑，确保基础的稳定性和承载力。基础坑挖掘完成后，进行基础浇筑，通常使用混凝土材料。

4. 路灯杆安装：

将路灯杆按照设计要求垂直立于基础上，确保路灯杆的稳定。使用螺栓将路灯杆与基础牢固连接，并进行焊接固定。

5. 灯具安装：

在路灯杆上安装灯具，确保灯具的固定牢固，密封良好，防止进水。连接电源线和控制线，遵循电路图和接线规范。

6. 电缆布设：

按照设计图纸布设电缆，埋设深度应符合规定，避免损坏电缆。电缆布设应尽量短且直，减少转弯和交叉，降低电阻。

7. 绝缘测试：

施工完成后，对路灯的电路进行绝缘测试，确保没有漏电现象。测试合格后，进行通电试验，检查路灯的亮度和功能。

8. 施工验收：

施工完成后，进行验收，检查施工质量是否符合设计和规范要求。验收内容包括路灯的安装高度、角度、亮度、控制功能等。

9. 维护与保养：

向相关部门或居民提供路灯的维护和保养知识，指导他们进行日常的维护工作。定期对路灯进行检查和维护，及时更换损坏的部件，确保路灯的正常运行。路灯施工工艺要求施工人员严格遵守施工规范，注重施工安全，同时也要考虑路灯的长期稳定运行和节能效果。

4.2.4 彩色沥青路面改造提升施工工艺

彩色沥青路面改造提升施工工艺是指对现有水泥路面进行加固、改善或升级的施工技术和方法，以延长路面的使用寿命，提高路面性能，满足更高的交通需求。以下是水泥路面改造提升施工工艺的一般步骤：

1. 前期准备：

进行现场勘查，评估路面的现状，包括损坏程度、结构强度等。确定改造方案，包括改造范围、施工方法、材料选择等。准备必要的施工设备和材料。

2. 旧路面处理：

清理旧路面表面的杂物、油污等，确保施工面干净。对损坏严重的地方进行局部修补或整体铣刨。如有需要，对旧路面进行预处理，如湿润、打毛等，以提高新材料的粘结力。

3. 基层处理：

对基层进行修补、找平，确保基层的平整度和坚实度。涂抹基层处理剂，增强基层与面层之间的粘结力。

4. 铺设新路面材料：

根据设计要求选择合适的沥青材料。进行材料配比、搅拌，确保材料均匀一致。铺设新路面材料，采用摊铺机进行均匀摊铺。使用振动梁、压路机等进行压实，确保路面密实。

5. 接缝处理：

合理设置接缝，避免因热胀冷缩等原因造成的裂缝。使用接缝材料进行填充，确保接缝的密封性和耐久性。

6. 养护：

铺设完成后，进行必要的养护，如覆盖湿布、喷水等，以保证水泥或沥青的强度发展。期间限制重型车辆通行，防止早期损坏。

7. 验收与维护：

施工完成后进行验收，确保路面达到设计要求。建立维护管理制度，定期进行检查和保养，及时修复小面积损坏。彩色沥青路面改造提升施工工艺要求施工单位具备相应的专业技术和经验，严格控制施工质量，确保改造后的路面能够满足预期的使用寿命和性能要求。同时，应考虑到改造过程中对周边环境和交通的影响，采取相应的措施减少干扰。

4.2.5 石材铺装施工工艺

自然石石板铺装施工工艺是一种常见的地面装饰方法，它利用自然形成的石板材料，以其天然纹理和色彩，为建筑增添自然美感。以下是自然石石板铺装施工的基本工艺流程：

1. 准备工作：

熟悉施工图纸和施工规范，明确自然石石板铺装的部位、尺寸和图案。检查基层处理情况，确保基层平整、干净、无杂物。对自然石石板进行质量检查，包括颜色、纹理、尺寸等，确保符合设计要求。

2. 试拼弹线：

根据设计图案和尺寸，对自然石石板进行试拼，确保图案和颜色的一致性。在基层上弹线，标记出每块自然石石板的位置和边界。

3. 铺设结合层：

在基层上均匀涂抹一层结合层材料，如水泥砂浆或专用的石板铺装胶，增强石板与基层的粘结力。

4. 铺设石板：

将预先试拼好的自然石石板按照顺序和方向铺设在结合层上。确保每块石板平稳、紧密，接缝均匀。在铺设过程中，尽量避免调整石板的位置，以保持其天然纹理和色彩。

5. 切割石板：

根据设计要求，对部分石板进行切割，以适应铺装图案或空间尺寸的需要。切割时应使用专业的石材切割工具，确保切割面的平整和光滑。

6. 灌缝、擦缝：

待结合层硬化后，对铺装好的自然石石板缝隙进行灌缝处理，填充缝隙。最后用工具将缝隙中的填充物擦干净，确保缝隙均匀、美观。

7. 清理和养护：

施工完成后，对铺装面进行清理，去除残留的灰尘和杂物。根据需要，对铺装面进行养护，以加快固化速度和提高使用寿命。

在整个施工过程中，需要注意以下几点：

基层处理是关键，必须保证基层的平整、干净，无油污、水渍等。

施工环境应满足要求，避免在雨天、高温或低温条件下施工。

施工人员应具备专业技能和经验，确保施工质量。

施工过程中应遵循安全规范，确保施工安全。

自然石石板铺装施工工艺的精细程度直接影响到最终的铺装效果和使用寿命，因此在施工过程中应严格控制每道工序的质量。

4.3 施工交通运输

4.3.1 场外交通运输

南安市位于福建省东南沿海，晋江中游，地理坐标为北纬 $24^{\circ}34'30''$ - $25^{\circ}19'25''$ ，东经 $118^{\circ}08'30''$ - $118^{\circ}36'20''$ 。东接鲤城区、丰泽区、洛江区，东南与晋江市毗邻，南部与厦门翔安区的大、小嶝岛及金门县隔海相望，西南与同安区交界，西通安溪县，北连永春县，东北与仙游县接壤。辖区最南为石井镇的大佰岛，最北为向阳乡的洋坪自然村，最东端是洪濑镇的大洋村，最西端是翔云乡的椒岭村，南北最大距离 82 千米，东西最大距离 45 千米，总面积 2011 平方千米。

九都镇位于福建省南安市东北部，距离省道 307 线眉山主干线 10 公里，至南安市区 38 公里，至泉州市区 50 公里，到安溪县 58.4 公里，到南安市、安溪县、永春县和仙游县一小时，到德化县、晋江市、泉州市和惠安县只需要两小时。地理位置优越，交通便利。

九都镇对外道路主要有：

(1) 国道：G72 线、G15 线、G1502 线，泉南高速（G72）距离九都镇不超过 10 公里；

(2) 省道：S35 线、S306 线、S307 线等，其中福诏高速（S35）距离九都镇不超过 10 公里，方便南安和泉州的运输；

(3) 铁路：福厦线、漳泉线和泉肖线，虽然没有直接穿越镇区，但是距离九都只有 50 公里左右，一个小时即可到达，使物流商贸更快捷。《南安市城市总体规划》交通规划中，将在九都镇旁边增加一条泉三高速复线，高速路出入口临近新峰村、新民村，规划后的九都镇的交通更加便利，出行更加方便。

项目区附近分布有福厦高速公路，沿海大通道等。本工程建设物资可通过已有乡道或村道运至各工作面。因此，本工程交通条件十分便利。

4.3.2 场内交通运输

拟建工程均位于村道附近，可通过现有村道到达，为施工需要，可新开两

条临时施工便道，施工便道路面采用泥结石路面结构，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，长度为 1.2 公里。

4.4 施工总布置

4.4.1 施工布置原则

在组织施工或编制施工组织设计时，应根据建筑施工的特点和以往积累的经验，遵循以下几个原则。

1.认真贯彻基本建设工作中的各项有关方针、政策，严格执行基本建设程序和施工程序的要求。

2.严格遵守国家和合同规定的工程竣工和交付使用的期限。

3.合理地安排施工程序。

4.在采用先进、适用的技术和经济合理的前提下，在多方案比较的基础上，选择最优的施工方案。

5.组织流水施工，以保证施工连续地、均衡地、有节奏地进行。

6.恰当地安排冬、雨季施工项目，增加全年的施工日数，提高施工的连续性和均衡性。

7.减少暂设工程和临时性设施，合理布置施工平面图，节约施工用地。

8.贯彻工厂预制和现场预制相结合的方针，扩大预制范围，提高预制装配程度。

9.充分利用机械设备并扩大机械化施工范围和提高机械化程度，减轻劳动强度，提高劳动生产率。

10.制定技术、组织、质量、安全、节约等保证措施，避免质量和安全事故，降低工程成本，提高工程经济效益。

4.4.2 施工总布置


根据施工内容，可在施工区内设置施工仓库、砂石料堆放场及设备停放场等施工临时设施。本工程混凝土浇筑方量较小，且施工面分散，可采用 0.4m³ 移动式拌和机就近拌制混凝土。

施工场地内不新建生活及办公用房，施工人员住宿及办公租用附近民房；机械设备维修保养在集镇进行，不专设机械设备修理厂。

4.5 施工期水环境保护措施

(1) 混凝土系统废水

含高浓度泥沙悬浮物的施工废水处理的主要目的是除废水中的泥沙颗粒，采用的工 艺如图 4-6-1 所示，施工区混凝土系统附近设置一个沉淀池，污水停留时间 1.5h，沉淀池为砖砌结构。上层清液达标后回用，沉淀下来的泥砂与施工弃渣一起堆放在弃渣场。

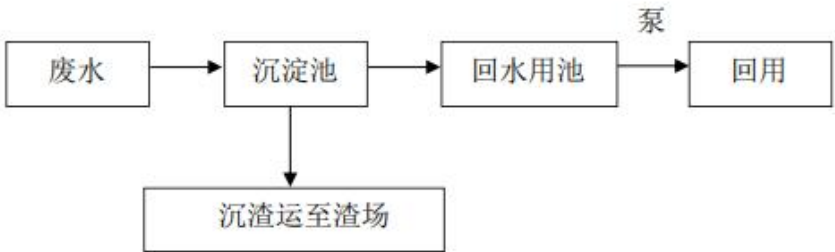


含泥沙施工废水处理工艺流程图 1

(2) 含油废水

石油类废水经明沟收集集中进入设置在附近的隔油沉淀池进行处理后回用。采用的 工艺如图 4-6-2 所示，其中废油重复利用或按危险废物管理要求进行集中回收处理，隔油池沉淀下来的泥砂与施工弃渣一起堆放在弃渣场。

排放方式：施工区处理后的废水排入下游河道。



含泥沙施工废水处理工艺流程图 2

(3) 大气污染防治

由于改建道路采用沥青混凝土路面，虽然是在专门的沥青拌和楼生产，但沥青在拌 和、运输、摊铺时容易对大气造成污染，因而采取以下防治措施：沥青混凝土生产时控制合适的出厂温度，不得超出规定出厂温度，沥青拌和楼设在居民区、学校等敏感点以外的下风向处，不采用敞开式、半封闭式沥青加热工艺，且要有粉尘回收设备；车辆运输应用篷布覆盖保温、防雨和防污染；摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，不

宜采用人工摊铺，碾压要紧跟，慢而均匀，控制碾压速度，严格控制初压、复压、终压时机；热拌沥青混凝土路面铺完后待自然冷却至低于 50℃，方可开放交通；有效围挡施工现场；工程弃土临时堆放、运输、运输过程应尽量封闭进行；避免道路遗撒，对干燥的弃土定时喷水；所有土石建筑材料避免露天堆放。

（4） 噪声和震动污染防治

工程施工中将使用的施工机械包括挖土机、空压机等高噪声机械，在土方、基础结构等施工阶段各类机械单独或共同作业时产生的噪声与振动影响不容忽视。应采取以下措施：施工场地布局合理，相对集中固定施工机械并远离环境敏感点；

对噪声震动固定设备采用固定或移动式隔振降噪处理；尽可能避免高噪声震动设备同时作业；保障施工场地交通畅通，减缓运输作业引起的噪声影响；施工现场严格管理，加强环境监理，保障执行环境管理规定；加强宣传特别是对现场周边居民，使其充分理解建设工程的重要性，做好相应的环境补偿工作。

（5） 建筑垃圾的回收利用

施工过程中不可避免产生大量的建筑垃圾，这些建筑垃圾按可回收与不可回收进行分类。首先对建筑垃圾进行分拣，其中的废钢筋、铁丝、金属配件等可再生资源应重新利用。对于可回收再利用的建筑垃圾，如碎石类、混凝土类、土石方类，可在路基施工时作为地基填埋、路基加固以提高再利用率。对于不可回收垃圾实行袋装化，并及时清运到指定的地点进行填埋处理。

4.6 施工总进度

本工程施工总进度工期划分为四个阶段，即工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期，施工总工期为后三项工期之和。初拟本工程建设周期为 12 个月，计划 2025 年 3 月开工，2025 年 10 月完工。

项目	2024年			2025年											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
实施方案															
施工图设计															
招投标															
工程建设															
工程验收															

4.7 各类措施汇总表

本工程位于南安市九都镇，且项目与片区内居民生活息息相关，施工前应统筹兼顾，合理计划、安排，科学组织，做好人力、物力的综合平衡，体现均

衡生产，同时应做好相应的施工措施，尽可能地消除或降低对片区内居民日常生产、生活和周边生态环境的影响，安全、高效、保质保量地完成项目建设。项目区施工措施汇总表见下表。

项目区施工措施汇总表

编号	项目名称	数量	备注
1	安全文明施工措施	1 项	现场文明、安全施工措施，及为达到环保部门要求所做措施，包括喷水防尘
2	施工围挡	1 项	为将施工现场与外部隔离，使成为一个相对封闭的空间所采取的措施
3	施工排水、降水	1 项	排除施工场地地表水，并人为降低基坑地下水位
4	防火消防措施	1 项	消防设施，诸如灭火器等
5	安全警示设施	1 项	安全警示牌、标语等
6	已完工程和设备保护措施	1 项	竣工验收前对已完工程进行保护的措施

5 投资规模及资金筹措

5.1 项目总投资

5.1.1 编制依据

1、福建省水利厅闽水建设[2021]2 号文颁发的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》（简称“编制规定”）；

2、福建省水利厅闽水建设[2021]2 号文颁布的《福建省水利水电建筑工程预算定额》《福建省水利水电设备安装工程预算定额》《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》；

3、闽水建设[2021]5 号文颁布的《福建省水利水电建筑工程概算定额》（上、下册）、《福建省水利水电设备安装工程概算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》；

4、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017 版）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）；

5、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

6、《水利水电工程设计工程量计算规则》（SL328-2005）；

7、编制期内福建省建设行政管理部门及建设工程造价管理站颁发的有关文件及规定；

8、该工程本阶段专业设计资料图纸及工程量；

5.1.2 基础价格及编制

（1）人工预算单价

根据编制规定，人工预算单价为：技工 120 元/工日，普工 85 元/工日。

（2）主要材料预算价格

主要材料预算价格超过材料基价表规定的材料基价时，应按基价计入基本

直接费并计取费用，材料预算价与基价的差值计入材料补差，材料补差列入工程单价税金之前，仅计取税金。主要材料低于基价时，按预算价计入材料费。计算施工电、风、水价格时，按预算价参与计算。材料增值税税率变化时，材料基价不变。材料基价表如下表。

材料基价表

表 3.3-1 单位：元

序号	材料名称	单位	基价
1	柴油	t	3500
2	汽油	t	4500
3	钢筋	t	2600
4	水泥	t	300
5	粉煤灰	t	150
6	商品混凝土	m ³	200
7	炸药	t	8000
8	雷管	个	3
9	外购砂石料	m ³	70
10	外购生态砼砌块、外购现浇生态砼	m ²	100

（3）砂石料预算单价

砂石料预算价格见主要材料预算价格汇总表。

（4）施工用水、电、风根据施工组织设计计算。

（5）施工机械台班费

施工机械台班费应根据福建省水利厅闽水建设[2021]2 号文颁发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》及有关规定计算。台班费定额缺项时，可补充编制台班费定额。

（6）建安工程单价取费标准

建筑安装工程单价由直接费、间接费、利润、材料补差和未计价装置性材料费、税金组成。本工程为其他水利工程，单价取费标准见下表。

建安工程单价取费标准一览表

表 3.3-2

编号	费用项目	计算基础	费率
一	其他直接费	基本工程费	3.15%
二	间接费		
1	建筑工程		
2	土方开挖工程	直接费	10.5%
3	石方开挖工程	直接费	12.5%
4	土石填筑工程	直接费	9%
5	模板工程	直接费	8%
6	混凝土浇筑工程	直接费	12.5%
7	钢筋制安工程	直接费	6%
8	钻孔灌浆及锚固工程	直接费	10%
9	疏浚工程	直接费	6%
10	生态景观工程	直接费	8%
11	其他工程	直接费	6%
二	安装工程		
1	设备安装工程	人工费	55%
2	管道安装工程	人工费	70%
三	利润	直接费与间接费之和	7.00%
四	税金	直接费、间接费、利润之和	9.00%

5.1.3 概算编制

（1）建筑工程

1) 建筑工程单价

按照施工组织设计提供的施工方法及有关定额子目分析计算，并计取相应的直接费、间接费、利润、主材补差、税金等费用。建筑工程根据相关定额分析单价，按设计工程量乘单价计算。

（2）施工临时工程

1) 施工导流工程：单价按照施工组织设计提供的施工方法及有关定额子目分析计算，并计取相应的直接费、间接费、利润、主材补差、税金等费用。建筑工程根据相关定额分析单价，按设计工程量乘单价计算。

2) 施工专项工程

1.安全生产措施费：根据闽水函[2022]1089 号福建省水利厅关于调整《福建省水利水电概（估）算编制规定》有关内容的通知，按一至四部分和第五部分的施工导流工程、施工交通工程的建安工作量投资之和的 2.5%计算。

2.施工现场标准化建设工程。按一至四部分和第五部分的施工导流工程、施工交通工程的建安工作量投资之和的 0.5%计算。

3) 施工房屋建筑工程

本工程建设周期为 12 个月，根据编制规定，按照第一至第四部分和第五部分施工导流工程建筑安装工程投资之和的 1.0%计算。

4) 其他施工临时工程

根据编规按照工程一至五部分建安工作量（不包括其他施工临时工程）之和的 1.0%计算。

(4) 独立费用

1) 建设管理费

根据编规按差额定率累进法计算，因不需要重新组建建设单位，费率乘以 0.6 计算；

2) 招标业务费

参照闽招协（2021）32 号文《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》和闽发改委服价（2021）250 号文《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》计算；

3) 经济技术服务费

以一至五部分投资合计为计算基数，费率取值按 0.50%计算；

4) 工程造价咨询服务费

参照闽招协（2021）32 号文《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》；

5) 工程建设监理费

参照福建省物价局[2007]273 号文转发的《国家发展改革委建设部关于印发<建设工程建立与相关服务收费管理规定>的通知》计算；

6) 工程科学研究试验费：按一至五部分建安工作量的 0.2%计算。

7) 工程勘测设计费

①工程勘测设计费：按国家计委、建设部[2002]10 号文颁发的《工程勘察设计收费管理规定》计算。

8) 专项评审费

按一至五部分投资合计的 0.5%计算。

9) 竣工图编制费

竣工图编制费费率为 8%，以初步设计、招标设计、施工图设计三阶段工程设计费之和为计算基数。

10) 其他

①.工程质量检测费

按工程一至五部分建安工作量的 0.7%计算。

②.工程保险费

按工程第一至第五部分投资合计的 0.45%计算。

5.2 投资指标及资金筹措方案

5.2.1 投资主要指标

本工程总投资 1458.70 万元，包括：建筑工程 1158.27 万元，临时工程 57.91 万元，独立费用 173.06 万元，基本预备费 69.46 万元。工程建设周期为 12 个月。

5.2.2 资金筹措

本项目申请省级大中型水库“润泽库区，造福移民”项目资金 1000 万元，其余资金由地方自筹解决。

5.3 设计概算表

5.3.1 总概算表

总概算表

单位：万元

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至六部分投资(%)
第一部分	建筑工程	1158.27			1158.27	84.65
一	农村交通设施	206.78			206.78	
二	村容村貌提升	132.22			132.22	
三	农村休闲文化设施	187.19			187.19	
四	其他部分	632.07			632.07	
第五部分	施工临时工程	57.91			57.91	3.81
四	施工专项工程	57.91			57.91	
第六部分	独立费用			173.06	173.06	11.54
一	建设管理费			21.89	21.89	
二	招标业务费			14.61	14.61	
三	技术经济服务费			6.08	6.08	
四	工程造价咨询服务费			13.25	13.25	
五	工程建设监理费			31.76	31.76	
六	工程科学研究试验费			2.43	2.43	
七	工程勘测设计费			55.66	55.66	
八	专项评价费			6.08	6.08	
九	竣工图编制费			1.56	1.56	
十	其他			19.74	19.74	
	一至六部分投资合计				1389.24	100
	基本预备费				69.46	
	静态总投资				1458.70	

5.3.2 概算书

见附件。

6 项目实施效益预测分析

6.1 经济效益预测分析

本项目共投资 1458.70 万元，项目建设周期 12 个月，项目建成后将九都移民村打造成生态优、产业强、移民富、乡风好的魅力移民村。

本工程以建设美丽移民村，完善移民村基础设施建设为基础，进一步完善九都镇的基础设施，结合当地历史文化、移民文化、低空经济产业，完善当地公共服务设施建设，多样化的满足当地群众需求。

通过提升移民文化展示馆，改善道路环境连接现有滑翔伞基地，建设村内公园、景观节点等举措，为九都移民增加创收途径，改善经营环境，增加移民收入，提高移民生活水平。

农民收入的提高和乡村的富裕是社会富裕的重要指标和经济可持续发展的保障。党的十九大明确提出要实施乡村振兴战略。这是在总结中外农业农村发展经验基础上，着眼于当前城乡经济社会发展实际和未来新型城乡关系发展趋势做出的重大战略部署，是中国特色社会主义进入新时代做好“三农”工作的总抓手。

我国城乡收入差距和公共服务差距仍然很大，长远来看，我国将始终有大量人口居住在农村。大量的研究显示，中国未来的城镇化率将维持在 70%~80%。届时，将仍有 20%~30%，即 3 亿~4.5 亿的人口居住在农村地区。随着城镇化率逼近峰值，人口、资源、资本的城乡双向流动将感越来越频繁，乡村的价值将日益凸显。没有现代化的农村，不可能实现人口和资源的双向流动。

发展农业新模式新业态，实现产业兴旺，促进农村第一、第二、第三产业融合发展，实现“三链重构”，需要大力推广功能拓展型、新技术渗透型、多业态复合型等新模式、新路径，需要大力培育终端型、体验型、循环型等新业态、新业态，需要着力打造农民专业合作社、家庭农场、供销合作社等新载体、新平台，需要健全完善股份合作、订单农业等利益联结新纽带新机制，需要在

传统农业中融入加工元素、融入服务元素、融入科技元素，形成体现乡村振兴特色的“微笑曲线”。这样农村发展才有活力、农民增收才有支撑，最终提高的是农业附加值，提高的是农村饱和度，提高的是移民获得感。

培育壮大优势产业是乡村振兴的加速器。乡村振兴以地方特色产品为基础形成的区域农村经济发展模式，实现了把资源优势转化成产业优势和经济优势。将农产品生产与制作、加工以及流通、销售、文化、体验、观光等要素与业态有效结合，增加产品附加值，让农民更好地获得增值收益。

本工程以改善移民区人居、交通环境为经济效益出发点，以地方自然、人文等自身的条件和优势为依托，以山美水库休闲旅游大开发为经济导向，多样化来满足消费者需求，从而增加移民的就业机会，增加移民的收入。在农村不只发展农产品和农产品初加工，还大力推广特色旅游项目及人文资产项目等。

6.2 社会效益预测分析

（1）扶持第三产业发展，体现“绿水青山就是金山银山”的实践价值。

本项目建设主要以美丽移民村建设、公共基础设施建设、乡村文化建设等措施来共同打造。

项目建设将以“两点一面”的形式展开，“一面”是指完善新东移民村基础设施、公共服务设施等建设，为新东村旅游业发展夯实基础，也为移民打造一个美丽、生态、宜居、文明的生活环境。“两点”是本项目建设以水利文化园、无动力公园、环库湾线性公园为核心，完善新东村文旅配套设施，吸引外地游客来了解新东水利文化、移民文化。

由于山美水库建设于上世纪五六十年代，移民搬迁安置是在当时特定的历史时期进行的，移民工作只讲政治、讲奉献，执行的是极低的补偿标准。为了支持水库建设，移民搬迁安置经历了一个长期努力的过程。同时，由于水库库区和移民安置区处于山区，耕地资源匮乏；坡地保水、保肥能力弱，土地产出价值不足；资源细碎、零散，产业发展条件薄弱，长久以来，地理区位、生态

环境、水库建设成为了当地经济发展的瓶颈。本项目工程建设是一次探索“绿水青山就是金山银山”的生动实践，将人文、自然环境作为独特的优势资源，结合美丽乡村建设、生态环境保护、水土流失治理等高质量建设项目成果来共同打造。利用移民后扶资金先行完善公共服务设施和绿色基础设施配套，为发展创造一个有利环境，吸引更多社会资本和当地民众投入到发展农村休闲、生态游，繁荣乡情民俗文化的建设中，形成乡村休闲旅游、水库观光于一体的新产业链，带动绿色食品加工、农产品包装、运输产业等领域协同发展，扩大移民就业机会，提高移民增收创收能力，打通“绿水青山”就是“金山银山”的转换通道，将九都镇变成南安市一张靓丽的“名片”。

（2）调动移民群众自我发展的积极性，凝聚社会力量，形成移民发展社会合力。

移民扶持资金的有限性要求需发挥移民群众自己的力量，充分调动移民群众积极性。在项目前期调查期间，九都镇指导小组及项目组设计人员深入基层，主动与当地移民交流沟通，努力将移民群众由被动选择调整为主动作为，把提升移民群众选择能力作为重要工作加以推进。充分调动移民群众参与到移民后期扶持建设中，倾听移民群众在生产生活中面临的问题；根据移民群众反馈的意见建议，坚持以移民为中心，分析政府主体的决策部署；针对现状问题和实施条件，及时对实施方案部署做出调整，最终形成移民后扶建设项目实施方案，从而讲好“库区记忆”故事，实现“机制活、产业兴、百姓富、生态美”的美好愿景。

（3）拉动地方投资需求，促进地方和移民经济发展，助力乡村振兴事业。本工程重视当地实际生活需求、生活基础设施改善，促进公共服务设施升级。俗话说，“要想富，先修路”，本次项目对现状村庄道路系统进行改造，修补已破毁的道路，既完成村庄内部生产道路的串联，也对外部衔接道路进行修补。不仅如此，本次项目还对公共卫生设施进行完善。以上举措不仅具备打通城乡

内外连接、提供生活便利等简单功能，而且成为农村生产、生活、生态和农业经济发展的坚实基础。

本次项目建设不仅能为九都镇营造良好、安全的发展环境，还能够促进为九都镇现有文旅产业的发展，激活当地的发展活力，更重要的是能够凝聚人心、增加人气、留住人才，能够为乡村振兴提供活水之源和持续动力。实现“村美、业兴、人和、民富”的建设目标。

7 实施保障措施

7.1 制度建设

（1）推行“大专项+任务清单”管理机制。

与资金同步下达任务清单，合理划分约束性任务和指导性任务，提高任务清单制定的科学性。建立任务清单落实机制，及时按要求分解落实工作任务，优先保障约束性任务落实，结合实际加强指导性任务与相关规划或实施方案的衔接。

（2）建立“综合监督、专职监管”的监督制度。

进一步明晰“综合监管、专职监管、专业监管、日常监管”四个监管层次，修订完善各项监管制度并建立监督制度和问题清单，完善移民后期扶持建设时期各项功能，努力实现与住建、农业农村、自然资源、生态环境等领域的对接，促进形成移民后扶监督信息一张网。充分发挥清单作为问责依据的戒尺作用，抓早抓小，防微杜渐，真正发挥监督公正、高效、务实的作用。

（3）探索建立后期扶持效果新的业绩评估标准。

推进后期扶持工作向质量效益型转变建议建立具有约束性、可考核、可验收的后期扶持业绩评估标准，努力使后期扶持工作向质量效益型转变，加快解决移民生存与发展问题，使广大移民群众通过后期扶持政策的实施有更多的获得感。

7.2 环境效益预测分析

本项目通过完善基础设施建设、公共服务建设等，进一步改善九都镇的生活环境，使原本破损、脏乱的街道，变得整洁、富有历史文化气息。并沿现状主街完善绿化种植，修复村庄生态环境，人与自然相和谐。项目建设有公园、景观节点等设施，对村庄街道田埂的垃圾污染有极大的整治效果，使项目区生态环境得到极大改善。

生态环境的保护离不开深入人心的宣传，本项目将结合当地的文旅宣传政策，大力弘扬保护生态、修复生态的理念，让“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。本项目的建设，以修复生态、改善村庄生态环境、保护水安全、促进人与自然和谐相处为追求，重在修复生态，更加体现了对“山”、“水”、“林”的保护，使得项目建设区的生态环境更加美好；项目的建设，改善移民生活环境，助力美丽移民村建设。

7.3 组织保障

（1）加强组织领导

坚强的组织领导，是保障移民后期扶持项目建设工作顺利实施的前提保障。越是任务重大，就越需要强化领导、精心组织。加强组织领导，首先要落实领导责任，各级党委要把主体责任扛起来，主要领导同志要担负起第一责任人的责任。党委成员要认真履行“一岗双责”，对分管领域加强指导督促，形成领导带头、上下联动的生动局面；加强组织领导，就要充分发挥督导作用，各级党委要加强督促指导，各级组织、纪委监委和宣传部门要履职尽责发挥职能作用，密切协作，积极配合，要营造良好氛围，促进工程建设深入开展；加强组织领导，还要结合实际科学统筹务求实效，要围绕贯彻落实党中央重大决策部署、围绕推动新时代移民示范区全面振兴全方位振兴、围绕移民反映强烈的难点问题，深入基层一线，了解民情、掌握实情、务求实效，坚持问题导向，拉出问题清单、任务清单、责任清单、效果清单，一个难题一个难题破解，不达目的不罢休。

（2）明确主体责任

主体责任是直接责任。党委是工程建设的“领导者、执行者、推动者”，落实主体责任既要强化集体领导的责任，又要切实落实领导干部个人的责任，做到党委“不松手”、党委书记“不甩手”、党委成员“不缩手”。主体责任

履行的成效如何，取决于“第一责任人”。履行主体责任，必须讲党性、讲原则、讲正气，做到敢抓敢管、严抓严管。

（3）积极筹措资金

一是继续加强与国家部委、省、市各级部门对接，争取上报项目进入省、市的盘子，各个方向争取项目资金支持，为建设工作奠定坚实的基础。二是寻求新的项目建设模式，将项目打包组合，多措并举，多方筹措资金，确保项目建设推进。

（4）强化建设管理

工程项目建设涉及项目法人、监理单位、质量监督机构、勘测设计单位、施工单位等诸多方面，他们以项目为目的，以政策法规和合同为纽带，相互制约、相互配合，参与各方履行责任义务是否正确，将直接影响到工程建设的管理效果。首先要加强工程组织建设管理，把工程建设和工程管理有效地紧密结合起来，项目法人机构要有专职人员全过程参与，设计要结合运行管理，加强设计成果的编制与审查；其次要强化合同管理，合同签订好坏也影响着工程质量优劣；再次就是要加强施工前后管理，承揽工程各项任务的单位应具备相应资质和业务能力，把好工程验收关口，确保工程质量。最后就是做好工程技术管理，落实好工程实施过程中各项技术责任，确保工程顺利验收。

（5）加大宣传力度

为使移民后期扶持建设项目的益处做到家喻户晓，可采取三举措对进行大力、有效的宣传。一是“线下”宣传。加大投入经费，制作、发放、条幅、上墙提示牌等进行广告宣传，将创建工作宣传到辖区，做到人人知道实施内容、户户知晓实施意义。二是“线上”宣传。利用微信公众号、微信群等阵地，采取图文并茂的形式让人乐于看、容易记，入眼入脑入心，形成强大的舆论合力，有利于将实施水移民发展示范区工作的重大意义化于心、践于行，在辖区内形

成了全民共同参与创建的浓厚氛围。三是“活动”宣传。利用周末等闲暇时间积极组织机关干部深入网格化点，参加志愿者服务活动，引导人们关心、支持、参与水系连通及农村水系综合整治工作，提高广大群众的知晓率和参与率，共同建设美好家园，着力营造浓厚建设氛围。

7.4 移民权益保障

（1）完善基础设施和公共服务，提高移民群众生产生活条件。

补偿补助资金只能解决移民基本生活问题，要恢复移民生产生活秩序，重新建立新的社会网络和社会关系，提高移民原有生产生活水平，这需要移民、地方政府和国家共同努力。逐步完善移民安置区基础设施和公共服务，注意与地方规划及统筹城乡发展规划相衔接，提高移民群众生产生活条件，为移民发展产业打下良好的基础条件。

（2）发展库区及移民安置区优势特色产业，增加移民群众收入。

加快农业产业结构调整，大量发展生态农业，加快发展旅游业，不断拓宽移民群众就业创收机会。从发展生产入手以生态农业为支撑，鼓励和引导移民改变传统的耕作模式，把自然资源开发与农村经济的可持续发展结合起来，不断壮大库区经济。优化用地结构，逐步提档升级落后产业。同时结合库区和移民安置区资源禀赋和比较优势，大力发展乡村旅游、生态农业等特色产业，增加移民经济收入。

（3）加强和移民的沟通协商，维护移民群众合法权益。

广泛征求移民意愿，收集移民对后期扶持资金使用、实施项目的意见建议，建立完善的沟通协商机制。根据收集的后期扶持意见建议，及时和移民进行沟通协调，制定切实合理实施方案，着力于解决移民搬迁安置后出现的困难和问题，提升后期扶持精准力度，切实维护移民合法权益，实施好移民后期扶持政策，维护移民合法权益，体现社会公平。

附件一

南安市九都镇大中型水库“润泽库区、造福移民”工程实施方案概算书

工程概算汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

第2页, 共49页

编号	项 目 名 称	建安费(元)	设备费(元)
第一部分	建筑工程	11582678	
	新东村	10386558	
一	美丽移民村建设	6446821	
1	旧建筑改造提升	1533709	
1.1	移民文化展示中心立面提升	408639	
1.2	库湾路戏台改造	988479	
1.3	水泵房立面改造	136591	
2	环库绿化景观提升	3601700	
2.1	移民文化广场绿化提升	1321593	
2.2	移民文化广场入口提升	351095	
2.3	环库湾线性公园	1929012	
3	村容村貌提升	1311412	
3.1	库湾路路口提升	81177	
3.2	休闲长廊提升	56753	
3.3	库湾路起点文化展示墙	107999	
3.4	观景平台提升	64897	
3.5	亭子及周边修复	34530	
3.6	挡墙建设	41144	
3.7	垃圾桶	19573	
3.8	智慧导览导视系统及夜景	905339	
二	公共基础设施建设	2067813	
1	农村交通设施	2067813	
1.1	库湾路路面提升	2067813	
三	乡村文化建设	1871924	

工程概算汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

第3页, 共49页

编号	项 目 名 称	建安费(元)	设备费(元)
1	农村休闲文化设施	1871924	
1.1	水利文化园	497263	
1.2	库湾路公共停车场	268225	
1.3	无动力公园	1106436	
	金圭村	1196120	
一	美丽移民村建设	1196120	
1	环库绿化景观提升	1185289	
1.1	步道提升	446146	
1.2	园路挡墙	106815	
1.3	花池提升	59545	
1.4	绿化提升	367180	
1.5	智慧导览导视系统及夜景	205603	
2	村容村貌提升	10831	
2.1	垃圾桶	10831	
四	施工专项工程	579134	
1	安全生产措施费	289567	
2	施工现场标准化建设工程	57913	
3	施工房屋建筑工程	115827	
4	其他施工临时工程	115827	
	小 计(元)	12161812	
	总 计	12161812	

建筑工程概算表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
第一部分	建筑工程	元			11582678	
一	农村交通设施				2067813	
1	库湾路路面提升				2067813	
	5cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）	m ²	7949.13	75.42	599523	
	7cm厚中粒式AC-20C沥青混凝土	m ²	7685.1	86.30	663224	
	4cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）	m ²	2706	60.34	163280	
	5cm厚中粒式AC-20C沥青混凝土	m ²	2706	61.65	166825	
	路面铣刨 沥青路面铣刨 厚度2cm	m ²	4281.9			
	路面铣刨 水泥路面铣刨 厚度2cm	m ²	2278.8	3.32	7566	
	路面铣刨 水泥路面铣刨 厚度5cm	m ²	377.2	7.63	2878	
	自卸汽车运石碴（载重10t以外 运距 10km以内）	m ³	150.07	39.59	5941	
	粘层	m ²	20440.9	2.28	46605	
	下封层	m ²	3290	7.22	23754	
	抗裂贴	m ²	371.2	31.88	11834	
	16cm厚5%水泥稳定层（商品）	m ²	3370	68.93	232294	
	15cm厚3%水泥稳定层（商品）	m ²	557.8	55.34	30869	
	15cm厚级配碎石垫层	m ²	498	37.64	18745	
	拆除8cm厚沥青面层（外弃10km）	m ³	269.6	97.50	26286	
	拆除20cm厚水泥路面（外弃10km）	m ³	674	39.68	26744	
	井筒提升	m ³	65	637.62	41445	
二	村容村貌提升				41144	
1	挡墙建设				41144	
	挖沟槽土方（三类土，深度2m以内）	m ³	229.755	6.01	1381	
	压路机压实 土料	m ³ 实方	125.475	6.54	821	
	M7.5浆砌MU30毛石挡墙	m ³ 砌体方	82.249	350.50	28828	

建筑工程概算表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m ³	3.425	584.65	2002	
	碎石反滤层	m ³	15.8	170.41	2692	
	垫层(碎石灌砂)	m ³	26.07	148.79	3879	
	砌体UPVC排水管埋设 管径 (DE110mm)	m	47.4	32.52	1541	
三	农村休闲文化设施				268225	
1	库湾路公共停车场				268225	
	4cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土 (AC-13C)	m ²	780	60.34	47065	
	5cm厚中粒式AC-16C改性沥青混凝土	m ²	779.61	64.50	50285	
	粘层	m ²	779.61	2.28	1778	
	透层	m ²	779.61	4.04	3150	
	乳化沥青稀浆封层 (厚度1cm)	m ²	779.61	19.55	15241	
	15cm厚5%水泥稳定层 (商品)	m ²	779.61	58.21	45381	
	15cm厚3%水泥稳定层 (商品)	m ²	779.61	55.34	43144	
	15cm厚级配碎石垫层	m ²	779.61	37.64	29345	
	600*150*250高芝麻白机切面立路沿 (含C20基座)	延长m	280.98	85.26	23956	
	C20侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座	m ³	11.52	614.96	7084	
	分界线 (热熔漆)	m ²	46.65	38.50	1796	
四	其他部分				9205496	
1	其他部分				9205496	
	其他部分	项	1	9205496.00	9205496	
	合 计				11582678	

临时工程概算表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

编号	工程或费用名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	备注
第五部分	施工临时工程	元			579134	
四	施工专项工程	元			579134	
1	安全生产措施费	元			289567	
	安全生产措施费	元	11582678	2.50%	289567	
2	施工现场标准化建设工程				57913	
	施工现场标准化建设工程	元	11582678	0.50%	57913	
3	施工房屋建筑工程	元			115827	
	施工房屋建筑工程	元	11582678	1.00%	115827	
4	其他施工临时工程	元			115827	
	其他施工临时工程	元	11582678	1.00%	115827	
	合 计				579134	

独立费用概算表

工程名称:南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

序号	项目或费用名称	单位	数量或取费基数	单价(元) 或费率(%)	金额(元)	备注
第六部分	独立费用	元			1730639	
一	建设管理费	元	$[12161812 \times 3\%] \times 0.6$		218913	
二	招标业务费	元			146132	
1	勘察设计招标	元	$[100 \times 1\% + (500 - 100) \times 0.7\% + (1000 - 500) \times 0.55\% + (1216.1812 - 1000) \times 0.35\%] \times 10000$		73066	
2	监理招标	元	$[100 \times 1\% + (500 - 100) \times 0.7\% + (1000 - 500) \times 0.55\% + (1216.1812 - 1000) \times 0.35\%] \times 10000$		73066	
3	施工招标	元	$[100 \times 1\% + (500 - 100) \times 0.7\% + (1000 - 500) \times 0.55\% + (1216.1812 - 1000) \times 0.35\%] \times 10000$		73066	
三	技术经济服务费	元	$12161812 \times 0.5\%$		60809	
四	工程造价咨询服务费	元			132505	
1	工程决算编制	元	$[500 \times 0.12\% + (1000 - 500) \times 0.1\% + (1216.1812 - 1000) \times 0.08\%] \times 0.8 \times 10000$		10184	
2	招标控制价编制	元	$[500 \times 0.53\% + (1000 - 500) \times 0.48\% + (1216.1812 - 1000) \times 0.45\%] \times 0.8 \times 10000$		48183	
3	工程结算编制	元	$[500 \times 0.48\% + (1000 - 500) \times 0.43\% + (1216.1812 - 1000) \times 0.38\%] \times 0.8 \times 10000$		42972	
4	工程结算审核	%	12161812	0.340%	41350	
五	工程建设监理费	元	$[30.1 + (78.1 - 30.1) \times (1216.1812 - 1000) / (3000 - 1000)] \times 0.9 \times 1 \times (1 + 0) \times 10000$		317595	
七	工程科学研究试验费	%	12161812	0.200%	24324	
八	工程勘测设计费	元			556588	
(1)	可研阶段勘察费	元	$(22.2 + (59.5 - 22.2) \times (1216.1812 - 1000) / (3000 - 1000)) \times 57.00\% \times 0.8 \times 1 \times (1 + 0\%) \times (1 + 10.00\%) \times 0.9 \times 10000$		118421	
(2)	可研阶段设计费	元	$[1216.1812 \times 12 / 3000] \times 1 \times 1$		48647	
(3)	初设、招标及施工图阶段勘察费	元	$(38.8 + (103.8 - 38.8) \times (1216.1812 - 1000) / (3000 - 1000)) \times 1 \times 0.85 \times 1 \times 1 \times 0.5 \times 10000$		194760	
(4)	初设、招标及施工图阶段设计费	元	$(38.8 + (103.8 - 38.8) \times (1216.1812 - 1000) / (3000 - 1000)) \times 1 \times 0.85 \times 1 \times 0.5 \times 10000$		194760	

独立费用概算表

工程名称:南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

序号	项目或费用名称	单位	数量或取费基数	单价(元) 或费率(%)	金额(元)	备注
九	专项评价费	%	12161812	0.500%	60809	
十	竣工图编制费	%	194760	8.000%	15581	
十一	其他	元			197383	
1	工程质量检测费	元	$1216.1812 * (1.2\% - (1000 - 1216.1812) * (1.2\% - 0.7\%) / (1000 - 5000)) * 10000$		142655	
2	工程保险费	%	12161812	0.450%	54728	
3	其他税费	元				
	合 计				1730639	

建筑工程单价表

单价编号	1	项目名称	5cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）		
定额编号	40203039T×1.667			定额单位	m ²
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			60.83
1.1	基本直接费	元			58.97
1.1.1	人工费	元			3.25
(1)	定额人工费	元	3.25065	1	3.25
1.1.2	材料费	元			52.84
(1)	木柴	Kg	0.026672	0.46	0.01
(2)	柴油	Kg	0.05001	3.5	0.18
(3)	煤	Kg	0.1667	0.513	0.09
(4)	5cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）	m ³	0.05051	1035.4	52.30
(5)	其他材料费	%	0.5	52.57718	0.26
1.1.3	机械使用费	元			2.88
(1)	钢轮内燃压路机工作质量8t(房建)	台班	0.0009	476.934	0.43
(2)	钢轮内燃压路机工作质量15t(房建)	台班	0.0009	710.673	0.64
(3)	沥青混凝土摊铺机8t(房建)	台班	0.0009	1216.232	1.09
(4)	轮胎压路机工作质量 16t(房建)	台班	0.0009	795.793	0.72
1.2	其他直接费	%	3.150	58.97	1.86
2	间接费	%	6.000	60.83	3.65
3	利润	%	7.000	64.48	4.51
4	主材价差	元			0.20
(1)	柴油	Kg	0.05001	3.96	0.20
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	69.19	6.23
8	工程单价	元			75.42
	综合单价	元/m ²			75.42

建筑工程单价表

单价编号	2	项目名称	7cm厚中粒式AC-20C沥青混凝土		
定额编号	40203035T×1.75			定额单位	m ²
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			69.56
1.1	基本直接费	元			67.44
1.1.1	人工费	元			3.47
(1)	定额人工费	元	3.465	1	3.47
1.1.2	材料费	元			60.50
(1)	木柴	Kg	0.03675	0.46	0.02
(2)	柴油	Kg	0.07	3.5	0.25
(3)	煤	Kg	0.2275	0.513	0.12
(4)	中粒式沥青混凝土(商品)(石料为碎石)(AC-20C)	m ³	0.0707	846	59.81
(5)	其他材料费	%	0.5	60.2	0.30
1.1.3	机械使用费	元			3.47
(1)	钢轮内燃压路机工作质量8t(房建)	台班	0.001085	476.934	0.52
(2)	钢轮内燃压路机工作质量15t(房建)	台班	0.001085	710.673	0.77
(3)	沥青混凝土摊铺机8t(房建)	台班	0.001085	1216.232	1.32
(4)	轮胎压路机工作质量 16t(房建)	台班	0.001085	795.793	0.86
1.2	其他直接费	%	3.150	67.44	2.12
2	间接费	%	6.000	69.56	4.17
3	利润	%	7.000	73.73	5.16
4	主材价差	元			0.28
(1)	柴油	Kg	0.07	3.96	0.28
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	79.17	7.13
8	工程单价	元			86.30
	综合单价	元/m ²			86.30

建筑工程单价表

单价编号	3	项目名称	4cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）		
定额编号	40203039T×1.334			定额单位	m ²
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			48.67
1.1	基本直接费	元			47.18
1.1.1	人工费	元			2.60
(1)	定额人工费	元	2.6013	1	2.60
1.1.2	材料费	元			42.28
(1)	木柴	Kg	0.021344	0.46	0.01
(2)	柴油	Kg	0.04002	3.5	0.14
(3)	煤	Kg	0.1334	0.513	0.07
(4)	细粒式沥青混凝土(商品)（石料为碎石） （ AC-13C）	m ³	0.04042	1035.4	41.85
(5)	其他材料费	%	0.5	42.07436	0.21
1.1.3	机械使用费	元			2.30
(1)	钢轮内燃压路机工作质量8t(房建)	台班	0.00072	476.934	0.34
(2)	钢轮内燃压路机工作质量15t(房建)	台班	0.00072	710.673	0.51
(3)	沥青混凝土摊铺机8t(房建)	台班	0.00072	1216.232	0.88
(4)	轮胎压路机工作质量 16t(房建)	台班	0.00072	795.793	0.57
1.2	其他直接费	%	3.150	47.18	1.49
2	间接费	%	6.000	48.67	2.92
3	利润	%	7.000	51.59	3.61
4	主材价差	元			0.16
(1)	柴油	Kg	0.04002	3.96	0.16
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	55.36	4.98
8	工程单价	元			60.34
	综合单价	元/m ²			60.34

建筑工程单价表

单价编号	4	项目名称	5cm厚中粒式AC-20C沥青混凝土		
定额编号	40203035T×1.25			定额单位	m ²
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			49.69
1.1	基本直接费	元			48.17
1.1.1	人工费	元			2.48
(1)	定额人工费	元	2.475	1	2.48
1.1.2	材料费	元			43.21
(1)	木柴	Kg	0.02625	0.46	0.01
(2)	柴油	Kg	0.05	3.5	0.18
(3)	煤	Kg	0.1625	0.513	0.08
(4)	中粒式沥青混凝土(商品)(石料为碎石)(AC-20C)	m ³	0.0505	846	42.72
(5)	其他材料费	%	0.5	43	0.22
1.1.3	机械使用费	元			2.48
(1)	钢轮内燃压路机工作质量8t(房建)	台班	0.000775	476.934	0.37
(2)	钢轮内燃压路机工作质量15t(房建)	台班	0.000775	710.673	0.55
(3)	沥青混凝土摊铺机8t(房建)	台班	0.000775	1216.232	0.94
(4)	轮胎压路机工作质量16t(房建)	台班	0.000775	795.793	0.62
1.2	其他直接费	%	3.150	48.17	1.52
2	间接费	%	6.000	49.69	2.98
3	利润	%	7.000	52.67	3.69
4	主材价差	元			0.20
(1)	柴油	Kg	0.05	3.96	0.20
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	56.56	5.09
8	工程单价	元			61.65
	综合单价	元/m ²			61.65

建筑工程单价表

单价编号	5	项目名称	路面铣刨 水泥路面铣刨 厚度2cm		
定额编号	40104086			定额单位	m ²
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			2.69
1.1	基本直接费	元			2.61
1.1.1	人工费	元			0.85
(1)	定额人工费	元	0.85	1	0.85
1.1.2	材料费	元			0.01
(1)	水	m ³	0.0045	3.01	0.01
1.1.3	机械使用费	元			1.75
(1)	路面铣刨机W2000(租赁价)(房建)	台班	0.00046	985.2	0.45
(2)	洒水车罐容量4000L(房建)	台班	0.0002	426.4	0.09
(3)	清扫机S160(租赁价)(房建)	台班	0.00046	2580	1.19
(4)	其他机械费	%	1	1.73	0.02
1.2	其他直接费	%	3.150	2.61	0.08
2	间接费	%	6.000	2.69	0.16
3	利润	%	7.000	2.85	0.20
4	主材价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	3.05	0.27
8	工程单价	元			3.32
	综合单价	元/m ²			3.32

建筑工程单价表

单价编号	6	项目名称	路面铣刨 水泥路面铣刨 厚度5cm		
定额编号	40104086+40104087×3			定额单位	m ²
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			6.17
1.1	基本直接费	元			5.98
1.1.1	人工费	元			1.60
(1)	定额人工费	元	1.6	1	1.60
1.1.2	材料费	元			0.03
(1)	水	m ³	0.0114	3.01	0.03
1.1.3	机械使用费	元			4.35
(1)	路面铣刨机W2000(租赁价)(房建)	台班	0.00115	985.2	1.13
(2)	洒水车罐容量4000L(房建)	台班	0.0005	426.4	0.21
(3)	清扫机S160(租赁价)(房建)	台班	0.00115	2580	2.97
(4)	其他机械费	元	0.0431	1	0.04
1.2	其他直接费	%	3.150	5.98	0.19
2	间接费	%	6.000	6.17	0.37
3	利润	%	7.000	6.54	0.46
4	主材价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	7.00	0.63
8	工程单价	元			7.63
	综合单价	元/m ²			7.63

建筑工程单价表

单价编号	7	项目名称	自卸汽车运石碴 (载重10t以外 运距 10km以内)		
定额编号	40101162T			定额单位	m ³
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			32.02
1.1	基本直接费	元			31.04
1.1.1	人工费	元			0.15
(1)	定额人工费	元	0.15	1	0.15
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械使用费	元			30.89
(1)	自卸汽车15t(房建)	台班	0.03494	884.08	30.89
1.2	其他直接费	%	3.150	31.04	0.98
2	间接费	%	6.000	32.02	1.92
3	利润	%	7.000	33.94	2.38
4	主材价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	36.32	3.27
8	工程单价	元			39.59
	综合单价	元/m ³			39.59

建筑工程单价表

单价编号	8	项目名称	粘层		
定额编号	40203056			定额单位	m ²
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			1.84
1.1	基本直接费	元			1.78
1.1.1	人工费	元			0.08
(1)	定额人工费	元	0.08	1	0.08
1.1.2	材料费	元			1.63
(1)	石油沥青60~100#	t	0.00052	3110	1.62
(2)	煤	Kg	0.00011	0.513	
(3)	其他材料费	%	0.5	1.62	0.01
1.1.3	机械使用费	元			0.07
(1)	汽车式沥青喷洒机4000L(房建)	台班	0.00007	966.759	0.07
1.2	其他直接费	%	3.150	1.78	0.06
2	间接费	%	6.000	1.84	0.11
3	利润	%	7.000	1.95	0.14
4	主材价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	2.09	0.19
8	工程单价	元			2.28
	综合单价	元/m ²			2.28

建筑工程单价表

单价编号	9	项目名称	下封层		
定额编号	40203058			定额单位	m ²
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			5.84
1.1	基本直接费	元			5.66
1.1.1	人工费	元			0.66
(1)	定额人工费	元	0.66	1	0.66
1.1.2	材料费	元			4.65
(1)	石油沥青60~100#	t	0.00134	3110	4.17
(2)	煤	Kg	0.00029	0.513	
(3)	石屑	m ³	0.00816	56.72	0.46
(4)	其他材料费	%	0.5	4.63	0.02
1.1.3	机械使用费	元			0.35
(1)	钢轮内燃压路机工作质量8t(房建)	台班	0.00036	476.934	0.17
(2)	汽车式沥青喷洒机4000L(房建)	台班	0.00019	966.759	0.18
1.2	其他直接费	%	3.150	5.66	0.18
2	间接费	%	6.000	5.84	0.35
3	利润	%	7.000	6.19	0.43
4	主材价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	6.62	0.60
8	工程单价	元			7.22
	综合单价	元/m ²			7.22

建筑工程单价表

单价编号	10	项目名称	16cm厚5%水泥稳定层（商品）		
定额编号	40202056T+40202056AT			定额单位	m ²
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			55.23
1.1	基本直接费	元			53.54
1.1.1	人工费	元			4.68
(1)	定额人工费	元	4.68	1	4.68
1.1.2	材料费	元			43.66
(1)	水泥稳定粒料（水泥用量 5%）(商品)	m ³	0.1624	258.21	41.93
(2)	水	m ³	0.36	3.01	1.08
(3)	其他材料费	元	0.64515	1	0.65
1.1.3	机械使用费	元			5.20
(1)	振动压路机15t(房建)	台班	0.00192	968.17	1.86
(2)	沥青混凝土摊铺机8t(房建)	台班	0.00234	1057.713	2.48
(3)	洒水车4000L(房建)	台班	0.00112	430.965	0.48
(4)	钢轮内燃压路机工作质量8t(房建)	台班	0.00096	398.566	0.38
1.2	其他直接费	%	3.150	53.54	1.69
2	间接费	%	6.000	55.23	3.31
3	利润	%	7.000	58.54	4.10
4	主材价差	元			0.60
(1)	柴油	kg	0.112668	3.96	0.45
(2)	汽油	kg	0.033835	4.53	0.15
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	63.24	5.69
8	工程单价	元			68.93
	综合单价	元/m ²			68.93

建筑工程单价表

单价编号	11	项目名称	15cm厚3%水泥稳定层（商品）		
定额编号	40202056T			定额单位	m ²
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			44.50
1.1	基本直接费	元			43.14
1.1.1	人工费	元			2.34
(1)	定额人工费	元	2.34	1	2.34
1.1.2	材料费	元			38.20
(1)	水泥稳定粒料（水泥用量 3%）(商品)	m ³	0.15225	243.65	37.10
(2)	水	m ³	0.18	3.01	0.54
(3)	其他材料费	%	1.5	37.64	0.56
1.1.3	机械使用费	元			2.60
(1)	振动压路机15t(房建)	台班	0.00096	968.17	0.93
(2)	沥青混凝土摊铺机8t(房建)	台班	0.00117	1057.713	1.24
(3)	洒水车4000L(房建)	台班	0.00056	430.965	0.24
(4)	钢轮内燃压路机工作质量8t(房建)	台班	0.00048	398.566	0.19
1.2	其他直接费	%	3.150	43.14	1.36
2	间接费	%	6.000	44.50	2.67
3	利润	%	7.000	47.17	3.30
4	主材价差	元			0.30
(1)	柴油	kg	0.056334	3.96	0.22
(2)	汽油	kg	0.016918	4.53	0.08
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	50.77	4.57
8	工程单价	元			55.34
	综合单价	元/m ²			55.34

建筑工程单价表

单价编号	12	项目名称	15cm厚级配碎石垫层		
定额编号	G90017T+40202001			定额单位	m ²
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			21.73
1.1	基本直接费	元			21.07
1.1.1	人工费	元			6.09
(1)	定额人工费	元	0.22	1	0.22
(2)	技工	工日	0.0237	120	2.84
(3)	普工	工日	0.0357	85	3.03
1.1.2	材料费	元			13.51
(1)	碎石	m ³	0.192	70	13.44
(2)	其他材料费	元	0.0672	1	0.07
1.1.3	机械使用费	元			1.47
(1)	履带式推土机75kW(房建)	台班	0.0005	612.467	0.31
(2)	钢轮内燃压路机工作质量15t(房建)	台班	0.0006	710.673	0.43
(3)	压路机12~15t	台班	0.0014	511.12	0.72
(4)	其他机械费	元	0.007156	1	0.01
1.2	其他直接费	%	3.150	21.07	0.66
2	间接费	%	6.000	21.73	1.30
3	利润	%	7.000	23.03	1.61
4	主材价差	元			9.89
(1)	碎石	m ³	0.192	50	9.60
(2)	柴油	kg	0.0455	3.96	0.18
(3)	履带式推土机75kW(房建)	台班	0.0005	223.74	0.11
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	34.53	3.11
8	工程单价	元			37.64
	综合单价	元/m ²			37.64

建筑工程单价表

单价编号	13	项目名称	拆除8cm厚沥青面层（外弃10km）		
定额编号	40104070T+G20537+G20538T×5			定额单位	100m ³
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			7093.09
1.1	基本直接费	元			6876.48
1.1.1	人工费	元			352.90
(1)	定额人工费	元	232.2	1	232.20
(2)	普工	工日	1.42	85	120.70
1.1.2	材料费	元			37.20
(1)	零星材料费	元	37.1952	1	37.20
1.1.3	机械使用费	元			6486.38
(1)	履带式液压挖掘机带液压锤HM960(房建)	台班	2.313	1860	4302.18
(2)	装载机2m ³	台班	0.38	788.83	299.76
(3)	推土机88kW	台班	0.2	799.65	159.93
(4)	自卸汽车 15t	台班	2.615	659.47	1724.51
1.2	其他直接费	%	3.150	6876.48	216.61
2	间接费	%	6.000	7093.09	425.59
3	利润	%	7.000	7518.68	526.31
4	主材价差	元			899.83
(1)	柴油	kg	227.2295	3.96	899.83
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	8944.82	805.03
8	工程单价	元			9750.00
	综合单价	元/m ³			97.50

建筑工程单价表

单价编号	14	项目名称	拆除20cm厚水泥路面（外弃10km）		
定额编号	G20537+G20538T×5			定额单位	100m³
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			2415.88
1.1	基本直接费	元			2342.10
1.1.1	人工费	元			120.70
(1)	普工	工日	1.42	85	120.70
1.1.2	材料费	元			37.20
(1)	零星材料费	元	37.1952	1	37.20
1.1.3	机械使用费	元			2184.20
(1)	装载机2m³	台班	0.38	788.83	299.76
(2)	推土机88kW	台班	0.2	799.65	159.93
(3)	自卸汽车 15t	台班	2.615	659.47	1724.51
1.2	其他直接费	%	3.150	2342.10	73.78
2	间接费	%	6.000	2415.88	144.95
3	利润	%	7.000	2560.83	179.26
4	主材价差	元			899.83
(1)	柴油	kg	227.2295	3.96	899.83
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	3639.92	327.59
8	工程单价	元			3968.00
	综合单价	元/m³			39.68

建筑工程单价表

单价编号	15	项目名称	挖沟槽土方（三类土，深度2m以内）		
定额编号	G10064×0.05+G10321×0.95			定额单位	100m ³
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			427.29
1.1	基本直接费	元			414.24
1.1.1	人工费	元			219.35
(1)	技工	工日	0.0245	120	2.94
(2)	普工	工日	2.546	85	216.41
1.1.2	材料费	元			12.33
(1)	零星材料费	元	12.327698	1	12.33
1.1.3	机械使用费	元			182.56
(1)	挖掘机 0.6m ³	台班	0.247	739.11	182.56
1.2	其他直接费	%	3.150	414.24	13.05
2	间接费	%	10.500	427.29	44.87
3	利润	%	7.000	472.16	33.05
4	主材价差	元			46.46
(1)	柴油	kg	11.7325	3.96	46.46
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	551.67	49.65
8	工程单价	元			601.00
	综合单价	元/m ³			6.01

建筑工程单价表

单价编号	16	项目名称	压路机压实 土料		
定额编号	G30152			定额单位	100m³实方
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			444.98
1.1	基本直接费	元			431.39
1.1.1	人工费	元			85.00
(1)	普工	工日	1	85	85.00
1.1.2	材料费	元			8.39
(1)	零星材料费	%	2	419.65	8.39
1.1.3	机械使用费	元			338.00
(1)	压路机12-15t	台班	0.41	511.12	209.56
(2)	推土机74kW	台班	0.08	670.6	53.65
(3)	蛙式夯实机2.8kW	台班	0.13	255.39	33.20
(4)	刨毛机	组班	0.08	477.95	38.24
(5)	其他机械费	%	1	334.65	3.35
1.2	其他直接费	%	3.150	431.39	13.59
2	间接费	%	9.000	444.98	40.05
3	利润	%	7.000	485.03	33.95
4	主材价差	元			81.28
(1)	柴油	kg	20.525	3.96	81.28
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	600.26	54.02
8	工程单价	元			654.00
	综合单价	元/m³实方			6.54

建筑工程单价表

单价编号	17	项目名称	M7.5浆砌MU30毛石挡墙		
定额编号	G30097T			定额单位	100m³砌体方
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			23522.28
1.1	基本直接费	元			22803.96
1.1.1	人工费	元			8370.60
(1)	技工	工日	34.99	120	4198.80
(2)	普工	工日	49.08	85	4171.80
1.1.2	材料费	元			14185.03
(1)	毛石	m³	116	70	8120.00
(2)	水泥砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5	m³	35.8	167.443	5994.46
(3)	其他材料费	%	0.5	14114.46	70.57
1.1.3	机械使用费	元			248.33
(1)	砂浆搅拌机0.4m³	台班	1.02	121.45	123.88
(2)	胶轮车	台班	26.2	4.75	124.45
1.2	其他直接费	%	3.150	22803.96	718.32
2	间接费	%	9.000	23522.28	2117.01
3	利润	%	7.000	25639.29	1794.75
4	主材价差	元			4722.31
(1)	水泥32.5	kg	10525.2	0.045	473.63
(2)	毛石	m³	116	22.23	2578.68
(3)	砂(砂浆用)	m³	40.096	41.65	1670.00
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	32156.35	2894.07
8	工程单价	元			35050.00
	综合单价	元/m³砌体			350.50

建筑工程单价表

单价编号	18	项目名称	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)		
定额编号	G40064			定额单位	100m ³
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			44558.93
1.1	基本直接费	元			43198.19
1.1.1	人工费	元			5092.95
(1)	技工	工日	28.82	120	3458.40
(2)	普工	工日	19.23	85	1634.55
1.1.2	材料费	元			37952.71
(1)	预拌非泵送普通商品混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m ³	106	352.6	37375.60
(2)	水	m ³	129	3.01	388.29
(3)	其他材料费	%	0.5	37763.89	188.82
1.1.3	机械使用费	元			152.53
(1)	振动器平板式2.2kW	台班	6.49	10.888	70.66
(2)	风水枪	台班	0.36	215.094	77.43
(3)	其他机械费	%	3	148.09	4.44
1.2	其他直接费	%	3.150	43198.19	1360.74
2	间接费	%	12.500	44558.93	5569.87
3	利润	%	7.000	50128.80	3509.02
4	主材价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	53637.82	4827.40
8	工程单价	元			58465.00
	综合单价	元/m ³			584.65

建筑工程单价表

单价编号	19	项目名称	碎石反滤层		
定额编号	G30009			定额单位	100m ³
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			8676.99
1.1	基本直接费	元			8412.01
1.1.1	人工费	元			233.80
(1)	技工	工日	0.05	120	6.00
(2)	普工	工日	2.68	85	227.80
1.1.2	材料费	元			7494.20
(1)	碎石	m ³	106	70	7420.00
(2)	其他材料	%	1	7420	74.20
1.1.3	机械使用费	元			684.01
(1)	推土机74kW	台班	1.02	670.6	684.01
1.2	其他直接费	%	3.150	8412.01	264.98
2	间接费	%	9.000	8676.99	780.93
3	利润	%	7.000	9457.92	662.05
4	主材价差	元			5514.08
(1)	碎石	m ³	106	50	5300.00
(2)	柴油	kg	54.06	3.96	214.08
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	15634.05	1407.06
8	工程单价	元			17041.00
	综合单价	元/m ³			170.41

建筑工程单价表

单价编号	20	项目名称	垫层(碎石灌砂)		
定额编号	G30011T			定额单位	100m ³
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			7662.71
1.1	基本直接费	元			7428.71
1.1.1	人工费	元			261.56
(1)	技工	工日	0.0525	120	6.30
(2)	普工	工日	3.003	85	255.26
1.1.2	材料费	元			6406.69
(1)	碎石 5~40mm	m ³	89.5	70	6265.00
(2)	水	m ³	26	3.01	78.26
(3)	其他材料	%	1	6343.26	63.43
1.1.3	机械使用费	元			760.46
(1)	推土机74kW	台班	1.134	670.6	760.46
1.2	其他直接费	%	3.150	7428.71	234.00
2	间接费	%	9.000	7662.71	689.64
3	利润	%	7.000	8352.35	584.66
4	主材价差	元			4713.00
(1)	碎石 5~40mm	m ³	89.5	50	4475.00
(2)	柴油	kg	60.102	3.96	238.00
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	13650.01	1228.50
8	工程单价	元			14879.00
	综合单价	元/m ³			148.79

建筑工程单价表

单价编号	21	项目名称	砌体UPVC排水管理设 管径（DE110mm）		
定额编号	G30147			定额单位	100m
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			2558.01
1.1	基本直接费	元			2479.89
1.1.1	人工费	元			639.50
(1)	技工	工日	0.81	120	97.20
(2)	普工	工日	6.38	85	542.30
1.1.2	材料费	元			1840.39
(1)	UPVC管DE110	m	103	16.19	1667.57
(2)	土工布	m ²	25.75	5.31	136.73
(3)	其他材料费	%	2	1804.3	36.09
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	3.150	2479.89	78.12
2	间接费	%	9.000	2558.01	230.22
3	利润	%	7.000	2788.23	195.18
4	主材价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	2983.41	268.51
8	工程单价	元			3252.00
	综合单价	元/m			32.52

建筑工程单价表

单价编号	22	项目名称	5cm厚中粒式AC-16C改性沥青混凝土		
定额编号	40203035T×1.25			定额单位	m ²
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			51.59
1.1	基本直接费	元			50.01
1.1.1	人工费	元			2.48
(1)	定额人工费	元	2.475	1	2.48
1.1.2	材料费	元			45.50
(1)	木柴	Kg	0.02625	0.46	0.01
(2)	柴油	Kg	0.05	3.5	0.18
(3)	煤	Kg	0.1625	0.513	0.08
(4)	中粒式沥青混凝土(商品)(石料为碎石)(AC-16C)	m ³	0.0505	891.15	45.00
(5)	其他材料费	%	0.5	45.275	0.23
1.1.3	机械使用费	元			2.03
(1)	钢轮内燃压路机工作质量8t(房建)	台班	0.000775	398.566	0.31
(2)	钢轮内燃压路机工作质量15t(房建)	台班	0.000775	540.591	0.42
(3)	沥青混凝土摊铺机8t(房建)	台班	0.000775	1057.713	0.82
(4)	轮胎压路机工作质量16t(房建)	台班	0.000775	615.217	0.48
1.2	其他直接费	%	3.150	50.01	1.58
2	间接费	%	6.000	51.59	3.10
3	利润	%	7.000	54.69	3.83
4	主材价差	元			0.65
(1)	柴油	Kg	0.164986	3.96	0.65
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	59.17	5.33
8	工程单价	元			64.50
	综合单价	元/m ²			64.50

建筑工程单价表

单价编号	23	项目名称	透层		
定额编号	40203055			定额单位	m ²
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			3.25
1.1	基本直接费	元			3.15
1.1.1	人工费	元			0.14
(1)	定额人工费	元	0.14	1	0.14
1.1.2	材料费	元			2.90
(1)	石油沥青60~100#	t	0.00093	3110	2.89
(2)	煤	Kg	0.0002	0.513	
(3)	其他材料费	%	0.5	2.89	0.01
1.1.3	机械使用费	元			0.11
(1)	汽车式沥青喷洒机4000L(房建)	台班	0.00013	825.287	0.11
1.2	其他直接费	%	3.150	3.15	0.10
2	间接费	%	6.000	3.25	0.20
3	利润	%	7.000	3.45	0.24
4	主材价差	元			0.02
(1)	汽油	kg	0.00406	4.53	0.02
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	3.71	0.33
8	工程单价	元			4.04
	综合单价	元/m ²			4.04

建筑工程单价表

单价编号	24	项目名称	乳化沥青稀浆封层（厚度1cm）		
定额编号	40203059T			定额单位	m ²
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			15.78
1.1	基本直接费	元			15.30
1.1.1	人工费	元			0.51
(1)	定额人工费	元	0.51	1	0.51
1.1.2	材料费	元			13.61
(1)	稀浆封层（ES-1）(商品)	m ³	0.0101	1347.17	13.61
1.1.3	机械使用费	元			1.18
(1)	汽车式沥青喷洒机4000L(房建)	台班	0.0003	825.287	0.25
(2)	稀浆封层机宽度2.5-3.5m(房建)	台班	0.00031	3000	0.93
1.2	其他直接费	%	3.150	15.30	0.48
2	间接费	%	6.000	15.78	0.95
3	利润	%	7.000	16.73	1.17
4	主材价差	元			0.04
(1)	汽油	kg	0.009369	4.53	0.04
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	17.94	1.61
8	工程单价	元			19.55
	综合单价	元/m ²			19.55

建筑工程单价表

单价编号	25	项目名称	15cm厚5%水泥稳定层（商品）		
定额编号	40202056T			定额单位	m ²
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			46.82
1.1	基本直接费	元			45.39
1.1.1	人工费	元			2.34
(1)	定额人工费	元	2.34	1	2.34
1.1.2	材料费	元			40.45
(1)	水泥稳定粒料（水泥用量 5%）(商品)	m ³	0.15225	258.21	39.31
(2)	水	m ³	0.18	3.01	0.54
(3)	其他材料费	%	1.5	39.85	0.60
1.1.3	机械使用费	元			2.60
(1)	振动压路机15t(房建)	台班	0.00096	968.17	0.93
(2)	沥青混凝土摊铺机8t(房建)	台班	0.00117	1057.713	1.24
(3)	洒水车4000L(房建)	台班	0.00056	430.965	0.24
(4)	钢轮内燃压路机工作质量8t(房建)	台班	0.00048	398.566	0.19
1.2	其他直接费	%	3.150	45.39	1.43
2	间接费	%	6.000	46.82	2.81
3	利润	%	7.000	49.63	3.47
4	主材价差	元			0.30
(1)	柴油	kg	0.056334	3.96	0.22
(2)	汽油	kg	0.016918	4.53	0.08
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	53.40	4.81
8	工程单价	元			58.21
	综合单价	元/m ²			58.21

建筑工程单价表

单价编号	26	项目名称	600*150*250高芝麻白机切面立路沿（含C20基座）		
定额编号	G90028T			定额单位	100延长m
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			6863.53
1.1	基本直接费	元			6653.93
1.1.1	人工费	元			401.80
(1)	技工	工日	1.96	120	235.20
(2)	普工	工日	1.96	85	166.60
1.1.2	材料费	元			6252.13
(1)	600*150*250高芝麻白机切面立路沿（含C20基座）	m	102	60	6120.00
(2)	水泥砌筑砂浆 M5 水泥32.5	m ³	0.63	160.343	101.02
(3)	其他材料费	%	0.5	6221.02	31.11
1.1.3	机械使用费	元			
1.2	其他直接费	%	3.150	6653.93	209.60
2	间接费	%	6.000	6863.53	411.81
3	利润	%	7.000	7275.34	509.27
4	主材价差	元			37.25
(1)	水泥32.5	kg	168.84	0.045	7.60
(2)	砂(砂浆用)	m ³	0.7119	41.65	29.65
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	7821.86	703.97
8	工程单价	元			8526.00
	综合单价	元/延长m			85.26

建筑工程单价表

单价编号	27	项目名称	C20侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座		
定额编号	G40147T			定额单位	100m ³
施工方法:					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			46869.20
1.1	基本直接费	元			45437.91
1.1.1	人工费	元			7635.40
(1)	技工	工日	48.81	120	5857.20
(2)	普工	工日	20.92	85	1778.20
1.1.2	材料费	元			37418.72
(1)	预拌非泵送普通商品混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m ³	103	352.6	36317.80
(2)	水	m ³	122	3.01	367.22
(3)	其他材料费	%	2	36685.02	733.70
1.1.3	机械使用费	元			383.79
(1)	振动器1.1kW	台班	6.35	10.572	67.13
(2)	风水枪	台班	1.31	215.094	281.77
(3)	其他机械费	%	10	348.9	34.89
1.2	其他直接费	%	3.150	45437.91	1431.29
2	间接费	%	12.500	46869.20	5858.65
3	利润	%	7.000	52727.85	3690.95
4	主材价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	56418.80	5077.69
8	工程单价	元			61496.00
	综合单价	元/m ³			614.96

建筑工程单价表

单价编号	28	项目名称	分界线（热熔漆）		
定额编号	40205022			定额单位	m ²
施工方法：					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费	元			30.51
1.1	基本直接费	元			29.58
1.1.1	人工费	元			4.50
(1)	定额人工费	元	4.5	1	4.50
1.1.2	材料费	元			16.27
(1)	热熔标线涂料	Kg	4.5	2.96	13.32
(2)	热塑标线底漆	Kg	0.23856	3.94	0.94
(3)	反光玻璃珠	Kg	0.4	4.42	1.77
(4)	其他材料费	%	1.5	16.03	0.24
1.1.3	机械使用费	元			8.81
(1)	载货汽车装载质量4t(房建)	台班	0.00625	383.682	2.40
(2)	自行式热熔划线车(房建)	台班	0.00625	235.32	1.47
(3)	手推式热熔底漆车(房建)	台班	0.00625	288.74	1.80
(4)	热熔釜熔解车(房建)	台班	0.00625	502.45	3.14
1.2	其他直接费	%	3.150	29.58	0.93
2	间接费	%	6.000	30.51	1.83
3	利润	%	7.000	32.34	2.26
4	主材价差	元			0.72
(1)	汽油	kg	0.15925	4.53	0.72
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.000	35.32	3.18
8	工程单价	元			38.50
	综合单价	元/m ²			38.50

主要材料预算价格汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格 (元)	其中				
				原价 (含税)	原价 (不含税)	运杂费	运输保 险费	采购及 保管费
1	水泥32.5	kg	0.345					
2	砂(砂浆用)	m ³	111.650					
3	汽油	kg	9.030					
4	预拌非泵送普通商品混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m ³	352.600					
5	碎石	m ³	120.000					
6	碎石 5~40mm	m ³	120.000					
7	石屑	m ³	56.720					
8	柴油	Kg	7.460					
9	水泥稳定粒料（水泥用量 3%）(商品)	m ³	243.650					
10	水泥稳定粒料（水泥用量 5%）(商品)	m ³	258.210					
11	中粒式沥青混凝土(商品) （石料为碎石）（AC- 20C）	m ³	846.000					
12	中粒式沥青混凝土(商品) （石料为碎石）（AC- 16C）	m ³	891.150					
13	细粒式沥青混凝土(商品) （石料为碎石）（AC- 13C）	m ³	1035.400					
14	稀浆封层（ES-1）(商品)	m ³	1347.170					
15	5cm厚SBS细粒式改性沥青 混凝土（AC-13C）	m ³	1035.400					
16	毛石	m ³	92.230					

次要材料预算价格汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

单位：元

序号	名称及规格	单位	含税价（元）	不含税价（元）
1	技工	工日	120.000	120.000
2	机械工(技工)	工日	120.000	120.000
3	普工	工日	85.000	85.000
4	水	m ³	3.100	3.010
5	风	m ³	0.226	0.200
6	电	kw·h	0.787	0.680
7	煤	Kg	0.580	0.513
8	反光玻璃珠	Kg	5.000	4.420
9	热塑标线底漆	Kg	4.450	3.940
10	热熔标线涂料	Kg	3.350	2.960
11	木柴	Kg	0.520	0.460
12	石油沥青60~100#	t	3520.000	3110.000
13	水泥稳定粒料（水泥用量 3%）(商品)	m ³	275.325	243.650
14	水泥稳定粒料（水泥用量 5%）(商品)	m ³	289.195	258.210
15	稀浆封层（ES-1）(商品)	m ³	1522.302	1347.170
16	5cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）	m ³	1170.002	1035.400
17	UPVC管DE110	m	18.295	16.190
18	土工布	m ²	6.000	5.310
19	600*150*250高芝麻白机切面立路沿（含C20基座）	m	61.800	60.000

混凝土材料单价计算表

工程名称:南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

编号	名称及规格	单位	预算量	调整系数	基价(元)		预算价(元)	
					单价	小计	单价	小计
1	水泥砌筑砂浆 M5 水泥32.5	m ³				160.343		219.468
(1)	水泥32.5	kg	268	1	0.300	80.400	0.345	92.460
(2)	水	m ³	0.28	1	3.010	0.843	3.010	0.843
(3)	砂(砂浆用)	m ³	1.13	1	70.000	79.100	111.650	126.165
2	水泥砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5	m ³				167.443		227.321
(1)	水泥32.5	kg	294	1	0.300	88.200	0.345	101.430
(2)	水	m ³	0.28	1	3.010	0.843	3.010	0.843
(3)	砂(砂浆用)	m ³	1.12	1	70.000	78.400	111.650	125.048

施工机械台班费汇总表

工程名称:南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

单位: 元

序号	名称及规格	单位	台班费 (元)	其 中				
				折旧费	修理及 替换设 备费	安拆费	人工费	动力燃 料费
1	风水枪	台班	215.094	1.300	2.430			211.364
2	钢轮内燃压路机工作质量 15t(房建)	台班	540.591					
3	钢轮内燃压路机工作质量 8t(房建)	台班	398.566					
4	胶轮车	台班	4.750	1.270	3.480			
5	沥青混凝土摊铺机8t(房建)	台班	1057.713					
6	轮胎压路机工作质量 16t(房 建)	台班	615.217					
7	刨毛机	组班	477.950	47.270	58.040	3.140	240.000	276.020
8	汽车式沥青喷洒机4000L(房 建)	台班	825.287					
9	洒水车4000L(房建)	台班	430.965	54.398			183.330	
10	砂浆搅拌机0.4m ³	台班	121.450	4.880	7.710	5.040	96.000	7.820
11	推土机74kW	台班	670.600	104.140	134.510	6.450	240.000	395.380
12	推土机88kW	台班	799.650	152.440	178.430	8.280	240.000	469.980
13	挖掘机 0.6m ³	台班	739.110	196.370	123.100	13.390	240.000	354.350
14	蛙式夯实机2.8kW	台班	255.390	0.930	5.960		240.000	8.500
15	压路机12~15t	台班	511.120	55.470	101.900		240.000	242.450
16	压路机12-15t	台班	511.120	55.470	101.900		240.000	242.450
17	载货汽车装载质量4t(房建)	台班	383.682	30.894			183.330	
18	振动器1.1kW	台班	10.572	1.750	7.190			1.632
19	振动器平板式2.2kW	台班	10.888	1.810	5.610			3.468
20	装载机2m ³	台班	788.830	140.970	114.160		120.000	881.772
21	自卸汽车 15t	台班	659.470	175.170	137.150		120.000	484.154

机械台班计算表

工程名称:南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

编号	名称及规格	单位	数量	基价(元)		预算价(元)	
				单价	小计	单价	小计
1	挖掘机 0.6m³	台班			739.110		927.21
(1)	机械工(技工)	工日	2	120	240.000	120	240.000
(2)	安装拆卸费	元	13.39	1	13.390	1	13.390
(3)	修理及替换设备费	元	123.1	1	123.100	1	123.100
(4)	折旧费	元	196.37	1	196.370	1	196.370
(5)	柴油	kg	47.5	3.5	166.250	7.46	354.350
2	装载机2m³	台班			788.830		1256.902
(1)	机械工(技工)	工日	1	120	120.000	120	120.000
(2)	修理及替换设备费	元	114.16	1	114.160	1	114.160
(3)	折旧费	元	140.97	1	140.970	1	140.970
(4)	柴油	kg	118.2	3.5	413.700	7.46	881.772
3	推土机74kW	台班			670.600		880.48
(1)	机械工(技工)	工日	2	120	240.000	120	240.000
(2)	安装拆卸费	元	6.45	1	6.450	1	6.450
(3)	修理及替换设备费	元	134.51	1	134.510	1	134.510
(4)	折旧费	元	104.14	1	104.140	1	104.140
(5)	柴油	kg	53	3.5	185.500	7.46	395.380
4	推土机88kW	台班			799.650		1049.13
(1)	机械工(技工)	工日	2	120	240.000	120	240.000
(2)	安装拆卸费	元	8.28	1	8.280	1	8.280
(3)	修理及替换设备费	元	178.43	1	178.430	1	178.430
(4)	折旧费	元	152.44	1	152.440	1	152.440
(5)	柴油	kg	63	3.5	220.500	7.46	469.980
5	压路机12~15t	台班			511.120		639.82
(1)	机械工(技工)	工日	2	120	240.000	120	240.000
(2)	修理及替换设备费	元	101.9	1	101.900	1	101.900
(3)	折旧费	元	55.47	1	55.470	1	55.470

机械台班计算表

工程名称: 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

编号	名称及规格	单位	数量	基价(元)		预算价(元)	
				单价	小计	单价	小计
(4)	柴油	kg	32.5	3.5	113.750	7.46	242.450
6	压路机12-15t	台班			511.120		639.82
(1)	机械工(技工)	工日	2	120	240.000	120	240.000
(2)	修理及替换设备费	元	101.9	1	101.900	1	101.900
(3)	折旧费	元	55.47	1	55.470	1	55.470
(4)	柴油	kg	32.5	3.5	113.750	7.46	242.450
7	刨毛机	组班			477.950		624.47
(1)	机械工(技工)	工日	2	120	240.000	120	240.000
(2)	安装拆卸费	元	3.14	1	3.140	1	3.140
(3)	修理及替换设备费	元	58.04	1	58.040	1	58.040
(4)	折旧费	元	47.27	1	47.270	1	47.270
(5)	柴油	kg	37	3.5	129.500	7.46	276.020
8	蛙式夯实机2.8kW	台班			255.390		255.39
(1)	机械工(技工)	工日	2	120	240.000	120	240.000
(2)	修理及替换设备费	元	5.96	1	5.960	1	5.960
(3)	折旧费	元	0.93	1	0.930	1	0.930
(4)	电	kw·h	12.5	0.68	8.500	0.68	8.500
9	砂浆搅拌机0.4m³	台班			121.450		121.45
(1)	机械工(技工)	工日	0.8	120	96.000	120	96.000
(2)	安装拆卸费	元	5.04	1	5.040	1	5.040
(3)	修理及替换设备费	元	7.71	1	7.710	1	7.710
(4)	折旧费	元	4.88	1	4.880	1	4.880
(5)	电	kw·h	11.5	0.68	7.820	0.68	7.820
10	振动器1.1kW	台班			10.572		10.572
(1)	修理及替换设备费	元	7.19	1	7.190	1	7.190
(2)	折旧费	元	1.75	1	1.750	1	1.750
(3)	电	kw·h	2.4	0.68	1.632	0.68	1.632

机械台班计算表

工程名称:南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

编号	名称及规格	单位	数量	基价(元)		预算价(元)	
				单价	小计	单价	小计
11	振动器平板式2.2kW	台班			10.888		10.888
(1)	修理及替换设备费	元	5.61	1	5.610	1	5.610
(2)	折旧费	元	1.81	1	1.810	1	1.810
(3)	电	kw·h	5.1	0.68	3.468	0.68	3.468
12	风水枪	台班			215.094		215.094
(1)	修理及替换设备费	元	2.43	1	2.430	1	2.430
(2)	折旧费	元	1.3	1	1.300	1	1.300
(3)	风	m ³	810	0.2	162.000	0.2	162.000
(4)	水	m ³	16.4	3.01	49.364	3.01	49.364
13	自卸汽车 15t	台班			659.470		916.474
(1)	机械工(技工)	工日	1	120	120.000	120	120.000
(2)	修理及替换设备费	元	137.15	1	137.150	1	137.150
(3)	折旧费	元	175.17	1	175.170	1	175.170
(4)	柴油	kg	64.9	3.5	227.150	7.46	484.154
14	胶轮车	台班			4.750		4.75
(1)	修理及替换设备费	元	3.48	1	3.480	1	3.480
(2)	折旧费	元	1.27	1	1.270	1	1.270
15	汽车式沥青喷洒机4000L(房建)	台班			825.287		966.759
(1)	定额人工费(房建机械)	元	440	1	440.000	1	440.000
(2)	检修费(房建)	元	46.92	0.884956	41.522	0.884956	41.522
(3)	其他费用(房建)	元	27.11	0.943396	25.575	0.943396	25.575
(4)	维护费(房建)	元	79.29	0.884956	70.168	0.884956	70.168
(5)	折旧费(房建)	元	121.46	0.884956	107.487	0.884956	107.487
(6)	汽油	kg	31.23	4.5	140.535	9.03	282.007
16	沥青混凝土摊铺机8t(房建)	台班			1057.713		1216.232
(1)	定额人工费(房建机械)	元	586.67	1	586.670	1	586.670
(2)	检修费(房建)	元	68.97	0.884956	61.035	0.884956	61.035

机械台班计算表

工程名称:南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

编号	名称及规格	单位	数量	基价(元)		预算价(元)	
				单价	小计	单价	小计
(3)	维护费(房建)	元	135.87	0.884956	120.239	0.884956	120.239
(4)	折旧费(房建)	元	169.12	0.884956	149.664	0.884956	149.664
(5)	柴油	kg	40.03	3.5	140.105	7.46	298.624
17	钢轮内燃压路机工作质量15t(房建)	台班			540.591		710.673
(1)	定额人工费(房建机械)	元	220	1	220.000	1	220.000
(2)	检修费(房建)	元	25.52	0.884956	22.584	0.884956	22.584
(3)	维护费(房建)	元	81.92	0.884956	72.496	0.884956	72.496
(4)	折旧费(房建)	元	84.96	0.884956	75.186	0.884956	75.186
(5)	柴油	kg	42.95	3.5	150.325	7.46	320.407
18	钢轮内燃压路机工作质量8t(房建)	台班			398.566		476.934
(1)	定额人工费(房建机械)	元	220	1	220.000	1	220.000
(2)	检修费(房建)	元	16.38	0.884956	14.496	0.884956	14.496
(3)	维护费(房建)	元	52.58	0.884956	46.531	0.884956	46.531
(4)	折旧费(房建)	元	54.55	0.884956	48.274	0.884956	48.274
(5)	柴油	kg	19.79	3.5	69.265	7.46	147.633
19	轮胎压路机工作质量16t(房建)	台班			615.217		795.793
(1)	定额人工费(房建机械)	元	220	1	220.000	1	220.000
(2)	检修费(房建)	元	30.54	0.884956	27.027	0.884956	27.027
(3)	其他费用(房建)	元	11.46	0.943396	10.811	0.943396	10.811
(4)	维护费(房建)	元	121.85	0.884956	107.832	0.884956	107.832
(5)	折旧费(房建)	元	101.64	0.884956	89.947	0.884956	89.947
(6)	柴油	kg	45.6	3.5	159.600	7.46	340.176
20	载货汽车装载质量4t(房建)	台班			383.682		499.106
(1)	定额人工费(房建机械)	元	183.33	1	183.330	1	183.330
(2)	检修费(房建)	元	7.14	0.884956	6.319	0.884956	6.319
(3)	其他费用(房建)	元	13.81	0.943396	13.028	0.943396	13.028
(4)	维护费(房建)	元	40.06	0.884956	35.451	0.884956	35.451

机械台班计算表

工程名称:南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

编号	名称及规格	单位	数量	基价(元)		预算价(元)	
				单价	小计	单价	小计
(5)	折旧费(房建)	元	34.91	0.884956	30.894	0.884956	30.894
(6)	汽油	kg	25.48	4.5	114.660	9.03	230.084
21	洒水车4000L(房建)	台班			430.965		567.816
(1)	定额人工费(房建机械)	元	183.33	1	183.330	1	183.330
(2)	检修费(房建)	元	9.89	0.884956	8.752	0.884956	8.752
(3)	其他费用(房建)	元	11.65	0.943396	10.991	0.943396	10.991
(4)	维护费(房建)	元	42.43	0.884956	37.549	0.884956	37.549
(5)	折旧费(房建)	元	61.47	0.884956	54.398	0.884956	54.398
(6)	汽油	kg	30.21	4.5	135.945	9.03	272.796

人材机用量汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
1	机制砂	m ³	8.99	0.6386	3.00%	0.62	70	
2	定额人工费	元	98944.96	1		1		
3	技工	工日	71.64	120		120		
4	机械工(技工)	工日	40.09	120		120		
5	普工	工日	119.29	85		85		
6	水泥32.5	kg	9131.28	0.39	13.00%	0.345	0.3	0.05
7	水	m ³	1645.49	3.1	3.00%	3.01		
8	砂(砂浆用)	m ³	34.98	115	3.00%	111.65	70	41.65
9	折旧费	元	5450.97	1		1		
10	折旧费(房建)	元	2588.12	1		0.884956		
11	修理及替换设备费	元	4604.92	1		1		
12	检修费(房建)	元	936.66	1		0.884956		
13	安装拆卸费	元	31.36	1		1		
14	维护费(房建)	元	2117.21	1		0.884956		
15	其他费用(房建)	元	77.82	1		0.943396		
16	风	m ³	132.23	0.226	13.00%	0.2		
17	电	kw·h	14.58	0.787	13.00%	0.68		
18	定额人工费(房建机械)	元	8878.29	1		1		
19	汽油	kg	167.74	10.204	13.00%	9.03	4.5	4.53
20	预拌非泵送普通商品混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌 落度120-160mm	m ³	15.50	352.6		352.6		
21	水泥砌筑砂浆 M5 水泥32.5	m ³	1.77			219.468	160.343	59.13
22	水泥砌筑砂浆 M7.5 水泥 32.5	m ³	29.45			227.321	167.443	59.88
23	碎石	m ³	262.05	123.6	3.00%	120	70	50.00

人材机用量汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
24	碎石 5~40mm	m ³	23.33	131.407	3.00%	120	70	50.00
25	石屑	m ³	26.85	58.422	3.00%	56.72		
26	煤	Kg	4108.37	0.58	13.00%	0.513		
27	反光玻璃珠	Kg	18.66	5	13.00%	4.42		
28	热塑标线底漆	Kg	11.13	4.45	13.00%	3.94		
29	热熔标线涂料	Kg	209.93	3.35	13.00%	2.96		
30	木柴	Kg	660.35	0.52	13.00%	0.46		
31	柴油	Kg	4117.07	8.43	13.00%	7.46	3.5	3.96
32	石油沥青60~100#	t	16.17	3520	13.00%	3110		
33	水泥稳定粒料（水泥用量3%）(商品)	m ³	203.62	275.3245	13.00%	243.65		
34	水泥稳定粒料（水泥用量5%）(商品)	m ³	665.98	289.195	12.00%	258.21		
35	中粒式沥青混凝土(商品) （石料为碎石）（AC-20C）	m ³	679.99	955.98	13.00%	846		
36	中粒式沥青混凝土(商品) （石料为碎石）（AC-16C）	m ³	39.37	1006.999	13.00%	891.15		
37	细粒式沥青混凝土(商品) （石料为碎石）（AC-13C）	m ³	140.90	735.134	-29.00%	1035.4		
38	稀浆封层（ES-1）(商品)	m ³	7.87	1522.302	13.00%	1347.17		
39	5cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）	m ³	401.51	1170.002	13.00%	1035.4		
40	毛石	m ³	95.41	94.997	3.00%	92.23	70	22.23
41	UPVC管DE110	m	48.82	18.2947	13.00%	16.19		
42	土工布	m ²	12.21	6	13.00%	5.31		
43	600*150*250高芝麻白机切面立路沿（含C20基座）	m	286.60	61.8	3.00%	60		
44	井筒提升	m ³	65.00	500		500		
45	其他部分	项	1.00	9205496		9205496		
46	下封层	m ²	371.20	25		25		
47	挖掘机 0.6m ³	台班	0.57			927.21	739.11	188.10

人材机用量汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
48	装载机2m ³	台班	3.59			1256.902	788.83	468.07
49	推土机74kW	台班	0.56			880.48	670.6	209.88
50	推土机88kW	台班	1.89			1049.13	799.65	249.48
51	压路机12~15t	台班	2.30			639.82	511.12	128.70
52	刨毛机	组班	0.10			624.47	477.95	146.52
53	蛙式夯实机2.8kW	台班	0.16			255.39	255.39	
54	砂浆搅拌机0.4m ³	台班	0.84			121.45	121.45	
55	振动器1.1kW	台班	0.73			10.572	10.572	
56	振动器平板式2.2kW	台班	0.22			10.888	10.888	
57	风水枪	台班	0.16			215.094	215.094	
58	自卸汽车 15t	台班	24.68			916.474	659.47	257.00
59	胶轮车	台班	21.55			4.75	4.75	
60	履带式推土机75kW(房建)	台班	0.64	861.52	3.03%	836.207	612.467	223.74
61	振动压路机15t(房建)	台班	8.50	1114.77	15.14%	968.17		
62	汽车式沥青喷洒机4000L(房建)	台班	2.45	1079.328	11.64%	966.759		
63	沥青混凝土摊铺机8t(房建)	台班	31.07	1336.262	9.87%	1216.232		
64	路面铣刨机W2000(租赁价) (房建)	台班	1.48	1140.69	15.78%	985.2		
65	钢轮内燃压路机工作质量 15t(房建)	台班	21.47	710.673		710.673		
66	钢轮内燃压路机工作质量 8t(房建)	台班	26.14	476.934		476.934		
67	履带式液压挖掘机带液压锤 HM960(房建)	台班	6.24	1860		1860		
68	轮胎压路机工作质量 16t(房建)	台班	20.71	795.793		795.793		
69	自卸汽车15t(房建)	台班	5.24	1001.67	13.30%	884.08		
70	洒水车罐容量4000L(房建)	台班	0.64	483.9	13.49%	426.4		
71	稀浆封层机宽度2.5-3.5m(房建)	台班	0.24	3000		3000		

人材机用量汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程

序号	名称及规格	单位	数量	含税价 (元)	税率(%)	不含税价 (元)	基价	差价
72	自行式热熔划线车(房建)	台班	0.29	235.32		235.32		
73	热熔釜熔解车(房建)	台班	0.29	502.45		502.45		
74	手推式热熔底漆车(房建)	台班	0.29	288.74		288.74		
75	清扫机S160(租赁价)(房建)	台班	1.48	2580		2580		
76	载货汽车装载质量4t(房建)	台班	0.29			499.106	383.682	115.42
77	洒水车4000L(房建)	台班	4.96			567.816	430.965	136.85

工程项目造价汇总表

工程名称:南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费 (元)
1	旧建筑改造提升	1533709.00	30740.00
2	环库绿化景观提升	3601700.00	91999.00
3	村容村貌提升	1270268.00	28006.00
4	农村休闲文化设施	1603699.00	40212.00
合 计		8009376.00	190957.00

单项工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 旧建筑改造提升

第1页 共4页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	1. 移民文化展示中心立面提升	408639.00	14403.00
2	2. 库湾路戏台改造	988479.00	11523.00
3	3. 水泵房立面改造	136591.00	4814.00
合 计		1533709.00	30740.00

单项工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 环库绿化景观提升

第2页 共4页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	1. 移民文化广场绿化提升	1321593.00	27537.00
2	2. 移民文化广场入口提升	351095.00	9949.00
3	3. 环库湾线性公园	1929012.00	54513.00
合 计		3601700.00	91999.00

单项工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 村容村貌提升

第3页 共4页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	1. 库湾路路口提升	81177.00	1460.00
2	2. 休闲长廊提升	56753.00	1626.00
3	3. 库湾路起点文化展示墙	107999.00	3034.00
4	4. 景观平台提升	64897.00	1752.00
5	5. 亭子及周边修复	34530.00	989.00
6	7. 垃圾桶	19573.00	561.00
7	8. 智慧导览导视系统及夜景	905339.00	18584.00
合 计		1270268.00	28006.00

单项工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 农村休闲文化设施

第4页 共4页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	1. 水利文化园	497263.00	13844.00
2	3. 无动力公园	1106436.00	26368.00
合 计		1603699.00	40212.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 旧建筑改造提升 1. 移民文化展示中心立面提升

第1页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	346032.00
1.1	装饰	346032.00
2	措施项目费	62607.00
2.1	总价措施项目费	17242.00
2.1.1	安全文明施工费	14403.00
2.1.2	其他总价措施费	1370.00
2.1.3	扬尘防治措施费	1469.00
2.2	单价措施项目费	45365.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		408639.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 旧建筑改造提升 2. 库湾路戏台改造

第2页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	946569.00
1.1	土方工程	19494.00
1.2	混凝土工程	91781.00
1.3	新制作工程	826949.00
1.4	拆除工程	8345.00
2	措施项目费	41910.00
2.1	总价措施项目费	14494.00
2.1.1	安全文明施工费	11523.00
2.1.2	其他总价措施费	1795.00
2.1.3	扬尘防治措施费	1176.00
2.2	单价措施项目费	27416.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		988479.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 旧建筑改造提升 3. 水泵房 立面改造 第3页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	115175.00
1.1	装饰	115175.00
2	措施项目费	21416.00
2.1	总价措施项目费	5763.00
2.1.1	安全文明施工费	4814.00
2.1.2	其他总价措施费	458.00
2.1.3	扬尘防治措施费	491.00
2.2	单价措施项目费	15653.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		136591.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 环库绿化景观提升 1. 移民文化广场绿化提升 第4页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	1285652.00
1.1	园林建筑	366235.00
1.2	绿化种植	901167.00
1.3	给水工程	18250.00
2	措施项目费	35941.00
2.1	总价措施项目费	35941.00
2.1.1	安全文明施工费	27537.00
2.1.2	其他总价措施费	6284.00
2.1.3	扬尘防治措施费	2120.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		1321593.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 环库绿化景观提升 2. 移民文化广场入口提升

第5页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	338727.00
1.1	园林建筑	325312.00
1.2	给水工程	13415.00
2	措施项目费	12368.00
2.1	总价措施项目费	12368.00
2.1.1	安全文明施工费	9949.00
2.1.2	其他总价措施费	1653.00
2.1.3	扬尘防治措施费	766.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		351095.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 环库绿化景观提升 3. 环库湾线性公园

第6页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	1859950.00
1.1	园林建筑	1706000.00
1.2	文化景墙	106384.00
1.3	给水工程	47566.00
2	措施项目费	69062.00
2.1	总价措施项目费	67743.00
2.1.1	安全文明施工费	54513.00
2.1.2	其他总价措施费	9032.00
2.1.3	扬尘防治措施费	4198.00
2.2	单价措施项目费	1319.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		1929012.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 村容村貌提升 1.库湾路路口提升

第7页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	79217.00
1.1	园林建筑	2212.00
1.2	绿化种植	77005.00
2	措施项目费	1960.00
2.1	总价措施项目费	1960.00
2.1.1	安全文明施工费	1460.00
2.1.2	其他总价措施费	388.00
2.1.3	扬尘防治措施费	112.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		81177.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 村容村貌提升 2. 休闲长廊提升

第8页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	54734.00
1.1	园林建筑	54734.00
2	措施项目费	2019.00
2.1	总价措施项目费	2019.00
2.1.1	安全文明施工费	1626.00
2.1.2	其他总价措施费	268.00
2.1.3	扬尘防治措施费	125.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		56753.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 村容村貌提升 3.库湾路起点文化展示墙

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	100984.00
1.1	展示墙	100984.00
2	措施项目费	7015.00
2.1	总价措施项目费	3768.00
2.1.1	安全文明施工费	3034.00
2.1.2	其他总价措施费	500.00
2.1.3	扬尘防治措施费	234.00
2.2	单价措施项目费	3247.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		107999.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 村容村貌提升 4. 景观平台提升 第10页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	62721.00
1.1	园林建筑	62721.00
2	措施项目费	2176.00
2.1	总价措施项目费	2176.00
2.1.1	安全文明施工费	1752.00
2.1.2	其他总价措施费	289.00
2.1.3	扬尘防治措施费	135.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		64897.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 村容村貌提升 5.亭子及周边修复

第11页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	33302.00
1.1	园林建筑	33302.00
2	措施项目费	1228.00
2.1	总价措施项目费	1228.00
2.1.1	安全文明施工费	989.00
2.1.2	其他总价措施费	163.00
2.1.3	扬尘防治措施费	76.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		34530.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 村容村貌提升 7.垃圾桶 第12页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	16713.00
1.1	园林建筑	16713.00
2	措施项目费	2860.00
2.1	总价措施项目费	696.00
2.1.1	安全文明施工费	561.00
2.1.2	其他总价措施费	92.00
2.1.3	扬尘防治措施费	43.00
2.2	单价措施项目费	2164.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		19573.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 村容村貌提升 8. 智慧导览
导视系统及夜景 第13页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	879945.00
1.1	园林建筑	106175.00
1.2	电气工程	529615.00
1.3	监控工程	244155.00
2	措施项目费	25394.00
2.1	总价措施项目费	23230.00
2.1.1	安全文明施工费	18584.00
2.1.2	其他总价措施费	3215.00
2.1.3	扬尘防治措施费	1431.00
2.2	单价措施项目费	2164.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		905339.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 农村休闲文化设施 1. 水利文化园 第14页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	468982.00
1.1	园林建筑	219657.00
1.2	景墙1	49433.00
1.3	景墙2	22451.00
1.4	景墙3	40363.00
1.5	廊架	126702.00
1.6	给水工程	10376.00
2	措施项目费	28281.00
2.1	总价措施项目费	17202.00
2.1.1	安全文明施工费	13844.00
2.1.2	其他总价措施费	2292.00
2.1.3	扬尘防治措施费	1066.00
2.2	单价措施项目费	11079.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		497263.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村 农村休闲文化设施 3. 无动力公园 第15页 共15页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	1072629.00
1.1	园林建筑	566701.00
1.2	绿化种植	473633.00
1.3	景墙	32295.00
2	措施项目费	33807.00
2.1	总价措施项目费	33655.00
2.1.1	安全文明施工费	26368.00
2.1.2	其他总价措施费	5257.00
2.1.3	扬尘防治措施费	2030.00
2.2	单价措施项目费	152.00
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		1106436.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第1页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
旧建筑改造提升							
1. 移民文化展示中心立面提升							
装饰							
1	011507001001	平面、箱式招牌	(1)2.5厚白色铝单板外包 (2)L50*50*5厚角钢通长 (3)50*50*3厚镀锌矩形钢管 (4)2.5厚白色冲孔铝单板(渐变冲孔) (5)100*50*3厚镀锌矩形钢管@1000 (6)200*200*10厚热镀锌钢板@1000 (7)50*50*3厚镀锌矩形钢管 (8)L50*50*5厚角钢通长 (9)2.5厚白色铝单板外包 (10)底部间隔750冲20mm排水孔	m2	280.000	805.37	225503.60
2	011302001001	天棚吊顶	(1)100*50*3厚镀锌矩形钢管@600 (2)3厚不锈钢水波板	m2	249.000	374.22	93180.78
3	011204003010	块料墙面	(1)240*60*10厚红砖贴片	m2	112.000	168.48	18869.76
4	011201004007	立面砂浆找平层	(1)20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	112.000	56.17	6291.04
5	011604002001	立面抹灰层拆除	(1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面)	m2	112.000	18.66	2089.92
6	010103002009	余方弃置	(1)弃渣 (2)投标人自行考虑	m3	5.000	19.33	96.65
2. 库湾路戏台改造							
土方工程							
7	010101001001	平整场地	(1)平整场地(挖掘机)	m2	122.000	1.55	189.10
8	010101004001	挖基坑土方	(1)三类土 (2)2m以内	m3	265.000	4.41	1168.65
9	010103001011	回填方	(1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	128.000	10.94	1400.32
10	010103001012	回填方	(1)碎石灌砂 (2)压实度详设计及规范要求	m3	61.000	221.51	13512.11
11	010103002006	余方弃置	(1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m3	118.000	27.32	3223.76
混凝土工程							
12	010501001011	垫层	(1)商品混凝土	m3	10.000	526.34	5263.40

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第2页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2)C20				
13	010501004001	满堂基础	(1)商品混凝土 (2)C30	m3	42.000	550.00	23100.00
14	010502001004	矩形柱	(1)商品混凝土 (2)C30	m3	7.000	573.06	4011.42
15	010502002001	构造柱	(1)非泵送 (2)C30	m3	1.000	807.34	807.34
16	010503002001	矩形梁	(1)商品混凝土 (2)C30	m3	1.000	563.24	563.24
17	010515001030	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ8	t	0.390	6103.85	2380.50
18	010515001031	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ10	t	1.040	6103.84	6347.99
19	010515001032	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ14	t	4.020	5651.37	22718.51
20	010515001033	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ16	t	2.040	5651.37	11528.79
21	010515001034	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ18	t	2.590	5651.37	14637.05
22	010516006001	电渣压力焊接	(1)电渣压力焊接Φ≤18	个	68.000	6.21	422.28
新制作工程							
23	020501001001	圆柱	(1)圆柱（Φ40cm以内 高8m以内）	m3	5.000	14393.85	71969.25
24	020501001002	圆柱	(1)圆柱（Φ36cm以内 高7m以内）	m3	6.000	20421.80	122530.80
25	020501003001	方柱	(1)方柱（21cm×21cm 以内 高5m以内）	m3	1.000	10094.92	10094.92
26	020601001001	屋面	(1)筒板瓦屋面 (2)满铺钢筋网、1:3 水泥砂浆层（最薄处不 小于20厚） (3)603卷材加钉防腐木 压条36X8@500 (4)15厚望板 (5)屋椽80宽X60高间距 200 (6)椽椽80宽X110中高 (7)桁条D=200 (8)随檩枋80宽X120高	m2	198.000	880.19	174277.62
27	020602002001	屋面窑制正脊	(1)屋面正脊、垂脊 (120厚砖墙 高0.3m)	m	46.000	314.27	14456.42
28	020602011001	屋脊头、吞头	(1)屋脊喜鹊尾、燕尾	只	8.000	1911.99	15295.92
29	020503006001	随梁枋	(1)斗盘枋 (2)180*50 (3)清漆二道	m3	4.000	7419.20	29676.80
30	020507002001	柱头科斗拱	(1)斗拱四六式*0.9	攒	20.000	315.95	6319.00
31	020502001002	圆梁	(1)趴梁 (2)直径150 (3)清漆二道	m3	6.000	6732.24	40393.44
32	020501004001	童(瓜)柱	(1)矮柱 (2)上30 (3)下60 (4)清漆二道	m3	3.000	12542.94	37628.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第3页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
33	020503001001	圆榫(櫟)	(1) 榫条 (2) 直径160 (3) 清漆二道	m3	3.000	5374.96	16124.88
34	010704012001	封檐板	(1) 200*30碳化木	m	58.000	76.86	4457.88
35	020506001001	老角梁、由钱	(1) 老钱 (2) 130*150 (3) 嫩钱 (4) 100*120	m3	3.000	8021.52	24064.56
36	020512003001	栈板(间壁)墙	(1) 镶板间壁(厚2cm) (平光)	m2	66.000	211.74	13974.84
37	020405004001	斗拱	(1) 斗拱(一斗六升 十字型)	座	12.000	878.86	10546.32
38	020405004002	斗拱	(1) 斗拱(一斗六升 一字型)	座	6.000	475.59	2853.54
39	AB001	雕刻及其他装饰	(1) 雕刻及其他装饰	项	1.000	232283.93	232283.93
拆除工程							
40	011611002001	钢柱拆除	(1) 钢柱拆除	t	1.000	538.26	538.26
41	011611001001	钢梁拆除	(1) 钢梁拆除	t	1.000	677.87	677.87
42	011607003001	屋面附着层拆除		m2	146.000	45.63	6661.98
43	040103002060	余方弃置	(1) 废弃料品种:石渣 (2) 运距:5km	m3	15.000	31.13	466.95
3. 水泵房立面改造							
装饰							
44	011204003011	块料墙面	(1) 240*60*10厚红砖贴片	m2	223.000	168.48	37571.04
45	011201004006	立面砂浆找平层	(1) 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	275.000	57.00	15675.00
46	011406001002	抹灰面油漆涂料	(1) 真石漆饰面	m2	52.000	109.33	5685.16
47	011502008002	GRC装饰线条	(1) GRC装饰线条	m	199.000	147.76	29404.24
48	011502003001	石材装饰线	(1) 石材装饰线(砂浆粘贴 宽度 ≤150mm)	m	132.000	100.13	13217.16
49	011605002001	立面块料拆除	(1) 拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层)	m2	223.000	36.08	8045.84
50	011604002002	立面抹灰层拆除	(1) 拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面)	m2	275.000	18.66	5131.50
51	010103002010	余方弃置	(1) 弃渣 (2) 投标人自行考虑	m3	23.000	19.33	444.59
环库绿化景观提升							
1. 移民文化广场绿化提升							
园林建筑							
52	050201001019	园路	(1) 600*200*30厚芝麻白荔枝面压边 (2) 5厚纯水泥膏一道 (3) 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	20.000	358.58	7171.60

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第4页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%				
53	050201001020	园路	(1)1000*500*30厚芝麻白荔枝面、 1000*500*30厚芝麻黑烧面 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%	m2	48.000	358.53	17209.44
54	050201001021	园路	(1)800*400*30厚芝麻白荔枝面 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%	m2	88.000	309.43	27229.84
55	050201001022	园路	(1)边长200~600 30厚芝麻白荔枝面碎拼 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%	m2	22.000	365.88	8049.36
56	011107001004	石材台阶面	(1)600*330*70厚芝麻白荔枝面踏面、 600*300*70厚芝麻白荔枝面踏面 (2)600*110*25厚芝麻白荔枝面踢面 (3)5厚纯水泥膏一道 (4)30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (5)120厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实（夯实度≥93%）	m2	23.000	676.05	15549.15
57	050201015003	栈道	(1)面层材料种类:140宽25厚拉丝重竹木, 离缝宽5mm, 专用不锈钢卡扣固定; 20mm厚侧	m2	30.000	670.26	20107.80

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第5页 共37页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第6页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
65	050102001001	栽植乔木	(1)小叶榄仁 (2)胸径13-14cm (3)高度:7.5m,冠幅:2m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)分层明显,具5层平展大枝以上,全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	25.000	2169.58	54239.50
66	050102001002	栽植乔木	(1)南洋楹 (2)胸径19-20cm (3)高度:5.5m,冠幅:3m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	34.000	2574.87	87545.58
67	050102001003	栽植乔木	(1)木棉 (2)腹径30-35 (3)高度:5m,冠幅:3m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	5.000	2329.10	11645.50
68	050102001004	栽植乔木	(1)宫粉紫荆 (2)胸径13-14cm (3)高度:4.5m,冠幅:2m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	14.000	1972.95	27621.30
69	050102001005	栽植乔木	(1)蓝花楹 (2)胸径15-16cm (3)高度:3.8m,冠幅:1.5m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	26.000	2164.42	56274.92
70	050102001006	栽植乔木	(1)香樟 (2)胸径15-17cm (3)高度:3.5m,冠幅:2.8m	株	8.000	2574.87	20598.96

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第7页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)枝下高1.8-2米,全冠假植苗,3级以上分枝,树型优美 (7)20kg/株				
71	050102001007	栽植乔木	(1)黄花风铃木 (2)胸径13-14cm (3)高度:3m,冠幅:2m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)分层明显,具5层平展大枝以上,全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	25.000	1857.18	46429.50
72	050102001008	栽植乔木	(1)日本晚樱 (2)胸径8-9cm (3)高度:2.5-3m,冠幅:1.5m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)多花,全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	49.000	1602.93	78543.57
73	050102001009	栽植乔木	(1)造型红花继木桩景 (2)胸径12-13cm (3)高度:2.5-3m,冠幅:2.5-3m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)特选,偏冠,造型飘逸,高度冠幅为准,全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	3.000	5784.10	17352.30
74	050102001010	栽植乔木	(1)造型罗汉松飘 (2)胸径14-15cm (3)高度:2.5-3m,冠幅:3-3.5m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)特选,偏冠,造型飘逸,高度冠幅为准,全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	3.000	7413.96	22241.88
75	050102002001	栽植灌木	(1)同安红三角梅 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H:120-150cm	株	2.000	392.32	784.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第8页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(5)P: 80cm (6)盆苗,以高度冠幅为准,全冠,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株				
76	050102002002	栽植灌木	(1)龟甲冬青球A (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 120-150cm (5)P: 80cm (6)球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	6.000	201.31	1207.86
77	050102002003	栽植灌木	(1)龟甲冬青球B (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 80cm (5)P: 80cm (6)球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	1.000	167.49	167.49
78	050102007001	栽植色带	(1)成活养护半年,日常养护半年 (2)64株/m2 (3)小兔狼尾草 (4)H:40cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	36.000	114.03	4105.08
79	050102007002	栽植色带	(1)成活养护半年,日常养护半年 (2)49株/m2 (3)银边山菅兰 (4)H:35cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	52.000	113.66	5910.32
80	050102007003	栽植色带	(1)成活养护半年,日常养护半年 (2)49株/m2 (3)红背桂 (4)H:35cm, P: 20cm (5)5kg/m2	m2	60.000	107.63	6457.80
81	050102007004	栽植色带	(1)成活养护半年,日常养护半年 (2)64株/m2 (3)紫花翠芦莉 (4)H:30cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	201.000	106.16	21338.16
82	050102007005	栽植色带	(1)成活养护半年,日常养护半年 (2)36盆/m2 (3)红花三角梅 (4)H:30cm, P: 20cm (5)5kg/m2	m2	100.000	238.88	23888.00
83	050102007006	栽植色带	(1)成活养护半年,日常养护半年 (2)49株/m2 (3)花叶鹅掌柴 (4)H:25cm, P: 15cm	m2	46.000	107.63	4950.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第9页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(5) 5kg/m2				
84	050102007007	栽植色带	(1) 成活养护半年, 日常养护半年 (2) 64株/m2 (3) 肾蕨 (4) H:25cm, P: 15cm (5) 5kg/m2	m2	11.000	137.63	1513.93
85	050102007008	栽植色带	(1) 成活养护半年, 日常养护半年 (2) 64株/m2 (3) 毛杜鹃 (4) H:20cm, P: 15cm (5) 5kg/m2	m2	72.000	114.03	8210.16
86	050102007009	栽植色带	(1) 成活养护半年, 日常养护半年 (2) 64株/m2 (3) 大花茉莉 (4) H:20cm, P: 15cm (5) 5kg/m2	m2	37.000	129.76	4801.12
87	050102007010	栽植色带	(1) 成活养护半年, 日常养护半年 (2) 81株/m2 (3) 紫鸭跖草 (4) H:20cm, P: 15cm (5) 5kg/m2	m2	31.000	115.01	3565.31
88	050102007011	栽植色带	(1) 成活养护半年, 日常养护半年 (2) 120株/m2 (3) 麦冬 (4) H:10cm, P: 10cm (5) 5kg/m2	m2	1017.000	123.85	125955.45
89	050102012002	铺种草皮	(1) 成活养护半年, 日常养护半年 (2) 马尼拉草卷 (3) 满铺 (4) 5kg/m2	m2	2397.000	34.86	83559.42
90	050101010002	整理绿化用地	(1) 绿地整理(整理绿化地) 客土回填	m2	4060.000	4.24	17214.40
91	050101009002	种植土回(换)填	(1) 符合设计要求 (2) 30cm	m3	1218.000	44.64	54371.52
92	040101001001	挖一般土方	(1) 一、二类土 (2) 2m以内	m3	5468.000	4.25	23239.00
93	040103002047	余方弃置	(1) 清杂草、砾石等, 按0.3m深度计 (2) 自行考虑	m3	5468.000	15.99	87433.32
给水工程							
94	040101002016	挖沟槽土方	(1) 三类土 (2) 2m以内	m3	63.000	7.28	458.64
95	040103001025	填方	(1) 符合设计要求 (2) 机制砂 (3) 符合设计要求	m3	18.000	106.48	1916.64
96	040103001026	填方	(1) 符合设计要求 (2) 原土 (3) 符合设计要求	m3	28.000	8.48	237.44

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第10页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
97	010103002008	余方弃置	(1) 废弃料品种:原土余方 (2) 运距:运距自行考虑	m3	31.000	26.82	831.42
98	031001006012	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN25 (3) 1.25Mpa	m	24.000	14.31	343.44
99	031001006013	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN32 (3) 1.25Mpa	m	77.000	15.42	1187.34
100	031001006014	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN40 (3) 1.25Mpa	m	5.000	18.73	93.65
101	031001006015	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN50 (3) 1.25Mpa	m	65.000	24.12	1567.80
102	031001006016	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN63 (3) 1.25Mpa	m	95.000	33.13	3147.35
103	040504001006	砌筑井	(1) C15混凝土垫层 (2) C25现浇底板 (3) C25预拌非泵送细石混凝土盖板 (4) 砌筑井壁(砖砌井壁矩形) (5) 预制混凝土(圆钢筋Φ10以外) (6) 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (7) 井盖、井箅安装(安全防坠网) (8) 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) (9) 05S502 16页	座	1.000	3730.65	3730.65
104	031003013001	水表	(1) 水表组(闸阀 DN80 2个, 水表LXS-80 1个, 防止倒流器 DN80 1个)	组/个	1.000	2448.12	2448.12
105	031003001003	螺纹阀门	(1) 截止阀 DN50	个	6.000	276.88	1661.28
106	031003001004	螺纹阀门	(1) 快速取水阀DN25 (2) C20基础 (3) 卵石透水层	个	8.000	56.95	455.60
107	030901003004	水喷淋(雾)喷头	(1) 水喷淋(雾)喷头	个	3.000	56.95	170.85
2. 移民文化广场入口提升							
园林建筑							
108	050201001028	园路	(1) 600*300*80厚芝麻白荔枝面工字铺 (2) 5厚纯水泥膏一道 (3) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4) 100厚C20混凝土结构层 (5) 150厚碎石灌砂垫	m2	177.000	451.80	79968.60

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第11页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			层 (6)素土夯实，夯实度≥93%				
109	050201001027	园路	(1)600*300*80厚芝麻黑烧面压边 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%	m2	44.000	484.19	21304.36
110	011107001005	石材台阶面	(1)600*330*70厚芝麻白荔枝面踏面、600*300*70厚芝麻白荔枝面踏面 (2)600*150*25厚芝麻白荔枝面踢面 (3)5厚纯水泥膏一道 (4)30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 (5)120厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实（夯实度≥93%）	m2	16.000	667.42	10678.72
111	050307016002	花池	(1)600*300*50厚黄金麻荔枝面压顶 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)600*400*30厚黄金麻菠萝面工字铺 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌砂垫层 (7)素土夯实, 夯实度≥93%	m3	21.000	3838.12	80600.52
112	020202003002	栏杆	(1)Φ32 3厚热镀锌钢管, 白色氟碳漆饰面 (2)Φ60 5厚热镀锌钢管, 白色氟碳漆饰面 (3)Φ60 5厚热镀锌钢管, 白色氟碳漆饰面	m	26.000	313.60	8153.60
113	05B072	核心价值观小品	(1)2mm厚热镀锌钢板, 红色氟碳漆 (2)白色氟碳漆 (3)□120*100*3.0厚热镀锌钢管, 红色氟碳漆 (4)□120*80*3.0厚热镀锌钢管, 红色氟碳漆 (5)2mm厚热镀锌钢板	个	3.000	34408.74	103226.22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第12页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			，红色氟碳漆 (6)白色氟碳漆 (7)□120*100*3.0厚热镀锌钢管，红色氟碳漆 (8)□120*80*3.0厚热镀锌钢管，红色氟碳漆 (9)黄色氟碳漆 (10)□120*80*5.0厚热镀锌钢管，红色氟碳漆 (11)2mm厚热镀锌钢板，红色氟碳漆				
114	050304005001	仿竹篱笆	(1)仿竹篱笆	m	58.000	245.77	14254.66
115	041001002002	拆除人行道	(1)材质:透水砖 (2)厚度:8cm	m2	218.000	3.46	754.28
116	041001003046	拆除基层	(1)材质:透水砼 (2)厚度:10cm (3)部位:垫层	m2	218.000	12.52	2729.36
117	041001003047	拆除基层	(1)材质:级配碎石 (2)厚度:15cm (3)部位:基层	m2	218.000	3.72	810.96
118	040103002059	余方弃置	(1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5km	m3	78.000	31.01	2418.78
119	011609001001	栏杆、栏板拆除	(1)拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除金属栏杆)	m	20.000	20.62	412.40
给水工程							
120	040101002024	挖沟槽土方	(1)三类土 (2)2m以内	m3	37.000	7.68	284.16
121	040103001039	填方	(1)符合设计要求 (2)机制砂 (3)符合设计要求	m3	17.000	106.48	1810.16
122	040103001040	填方	(1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求	m3	21.000	8.48	178.08
123	031001006034	塑料管	(1)热熔连接 (2)PE100管DN25 (3)1.25Mpa	m	91.000	14.31	1302.21
124	031001006035	塑料管	(1)热熔连接 (2)PE100管DN32 (3)1.25Mpa	m	67.000	15.42	1033.14
125	031001006036	塑料管	(1)热熔连接 (2)PE100管DN40 (3)1.25Mpa	m	116.000	18.73	2172.68
126	040504001018	砌筑井	(1)C15混凝土垫层 (2)C25现浇底板 (3)C25预拌非泵送细石混凝土盖板 (4)砌筑井壁(砖砌井壁矩形) (5)预制混凝土(圆钢筋Φ10以外) (6)井盖、井箅安装(	座	1.000	3730.65	3730.65

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第13页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			检查井井盖、座 普通 铸铁) (7)井盖、井算安装(安全防坠网) (8)井盖、井算安装(塑钢爬梯踏步) (9)05S502 16页				
127	031003013002	水表	(1)水表组(闸阀 DN80 2个, 水表LXS-80 1个, 防止倒流器 DN80 1个)	组/个	1.000	2448.12	2448.12
128	030901003002	水喷淋(雾)喷头	(1)水喷淋(雾)喷头	个	8.000	56.95	455.60
3. 环库湾线性公园							
园林建筑							
129	050201001004	园路	(1)双丙聚氨酯密封处理 (2)撒布6-9mm粒径荧光石1kg/m2 (按1:25与耐黄变聚氨酯胶水混合) (3)50厚6mm粒径C25彩色透水混凝土强固层 (4)150厚10mm粒径C25透水混凝土 (5)30厚砂滤层 (6)150厚级配碎石垫层 (7)素土夯实, 夯实度≥93%	m2	1110.000	229.65	254911.50
130	050201001001	园路	(1)400*200*80厚八字形绿色植草砖, 内掺草籽 (2)30厚黄土粗砂(砂:土=1:1) (3)100厚C20无砂大孔混凝土基层 (4)300厚级配碎石垫层 (5)素土夯实 (夯实度≥93%)	m2	105.000	220.91	23195.55
131	050201001002	园路	(1)600*200*30厚芝麻白荔枝面压边 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实, 夯实度≥93%	m2	20.000	358.58	7171.60
132	050201001005	园路	(1)1000*500*30厚芝麻白荔枝面、 1000*500*30厚芝麻黑烧面 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥	m2	48.000	358.53	17209.44

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第14页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$				
133	050201001003	园路	(1)900*300*30厚芝麻白荔枝面/芝麻黑烧面齐缝铺, 余同 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m ²	151.000	309.12	46677.12
134	050201001011	园路	(1)边长200~600 30厚芝麻白荔枝面碎拼 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实, 夯实度 $\geq 93\%$	m ²	22.000	365.88	8049.36
135	011107001001	石材台阶面	(1)600*330*70厚芝麻白荔枝面踏面、 600*300*70厚芝麻白荔枝面踏面 (2)600*150*25厚芝麻白荔枝面踢面 (3)5厚纯水泥膏一道 (4)30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (5)120厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实(夯实度 $\geq 93\%$)	m ²	5.000	786.47	3932.35
136	011502001001	金属装饰线	(1)M8膨胀螺栓固定, @500 (2)L50*50*8热镀锌角钢通长	m	1167.000	35.76	41731.92
137	050201015002	栈道	(1)面层材料种类:140宽25厚拉丝重竹木, 离缝宽5mm, 专用不锈钢卡扣固定; 20mm厚侧封板 (2)支架材料种类:60mm长L50*5mm厚热镀锌角钢, M8膨胀螺栓固定 (3)□50*50*5mm厚热镀锌矩形钢管	m ²	73.000	685.46	50038.58

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第15页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(4)10mm厚橡胶垫 (5)100mm厚C20混凝土墩 (6)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (7)100mm厚C20混凝土垫层 (8)150mm厚碎石灌砂垫层 (9)素土夯实, 夯实程度≥93%				
138	020202003001	栏杆	(1) Φ32 3厚热镀锌钢管, 白色氟碳漆饰面 (2) Φ60 5厚热镀锌钢管, 白色氟碳漆饰面 (3) Φ60 5厚热镀锌钢管, 白色氟碳漆饰面	m	13.000	313.60	4076.80
139	011503008001	玻璃栏板	(1) 铝合金栏杆、铝合金扶手 (100×44) (10mm厚钢化玻璃栏板全玻)	m	14.000	532.68	7457.52
140	040205006002	标线	(1)100宽白色热熔漆画线 (2)热熔漆	m2	117.000	37.76	4417.92
141	020510004002	坐凳面	(1)600*400/500*50厚芝麻白光面 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)240*60*10厚红砖贴片 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实 (夯实度≥93%)	m2	34.000	1058.27	35981.18
142	020510004003	坐凳面	(1)3厚热镀锌钢板, 白色氟碳漆饰面 (2)100*100*5厚热镀锌钢管, 黑色氟碳漆饰面 (3)100*100*5厚热镀锌钢管, 黑色氟碳漆饰面 (4)200*200*5厚热镀锌钢板, 4M8膨胀螺栓固定 (5)300*300*300C20混凝土块 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实 (夯实度≥93%)	m2	6.000	803.61	4821.66
143	020201001001	阶条石	(1)1000*400*300芝麻白荔枝面整条石 (2)120厚C20混凝土垫	m3	2.000	1983.26	3966.52

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第16页 共37页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第17页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
153	010101003002	挖沟槽土方	(1) 三类土 (2) 2m以内	m3	56.000	42.70	2391.20
154	010103001001	回填方	(1) 原土回填 (2) 压实度详设计及规范要求	m3	38.000	10.42	395.96
155	010103002001	余方弃置	(1) 废弃料品种:原土余方 (2) 运距:运距自行考虑	m3	12.000	26.02	312.24
156	010404001001	垫层	(1) 15cm灰土垫层	m3	3.000	287.35	862.05
157	010501001001	垫层	(1) 100厚C20混凝土垫层	m3	2.000	503.40	1006.80
158	010503001001	基础梁	(1) 非泵送 (2) C25	m3	3.000	502.24	1506.72
159	010507005001	压顶	(1) 非泵送 (2) C25	m3	1.000	704.74	704.74
160	010401003001	实心砖墙	(1) 清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	29.000	791.59	22956.11
161	011201004001	立面砂浆找平层	(1) 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	58.000	56.77	3292.66
162	011204003001	块料墙面	(1) 600*150*15厚红色大小拼天然文化石	m2	30.000	136.25	4087.50
163	011204003002	块料墙面	(1) 240*60*10厚红砖贴片	m2	130.000	167.79	21812.70
164	011204001001	石材墙面	(1) 600*300*50厚黄金麻菠萝面	m2	16.000	475.74	7611.84
165	011108001001	石材零星项目	(1) 600*300*50厚芝麻黑烧面压顶	m2	8.000	304.60	2436.80
166	010515001001	现浇构件钢筋	(1) HRB400E Φ8	t	1.390	5812.56	8079.46
167	010515001002	现浇构件钢筋	(1) HRB400E Φ10	t	2.590	5812.56	15054.53
168	011508005001	吸塑字	(1) 字宽30, 3厚PVC蓝色广告字, 余同	个 (套)	50.000	130.80	6540.00
169	011207001002	墙面装饰板	(1) 3厚热镀锌钢板, 黑色氟碳漆饰面 (2) 文字UV打印	m2	28.000	261.88	7332.64
给水工程							
170	040101002027	挖沟槽土方	(1) 三类土 (2) 2m以内	m3	236.000	7.48	1765.28
171	040103001046	填方	(1) 符合设计要求 (2) 机制砂 (3) 符合设计要求	m3	26.000	106.48	2768.48
172	040103001047	填方	(1) 符合设计要求 (2) 原土 (3) 符合设计要求	m3	209.000	8.48	1772.32
173	031001006043	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN25 (3) 1.25Mpa	m	46.000	14.31	658.26
174	031001006048	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN32 (3) 1.25Mpa	m	34.000	15.42	524.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第18页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
175	031001006044	塑料管	(1)热熔连接 (2)PE100管DN40 (3)1.25Mpa	m	14.000	18.73	262.22
176	031001006045	塑料管	(1)热熔连接 (2)PE100管DN50 (3)1.25Mpa	m	335.000	24.12	8080.20
177	031001006046	塑料管	(1)热熔连接 (2)PE100管DN63 (3)1.25Mpa	m	289.000	33.13	9574.57
178	031001006047	塑料管	(1)HDPE双壁波纹管管 DN200	m	80.000	80.94	6475.20
179	040504001022	砌筑井	(1)C15混凝土垫层 (2)C25现浇底板 (3)C25预拌非泵送细石 混凝土盖板 (4)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (5)预制混凝土(圆钢筋 Φ10以外) (6)井盖、井箅安装(检 查井井盖、座 普通铸 铁) (7)井盖、井箅安装(安 全防坠网) (8)井盖、井箅安装(塑 钢爬梯踏步) (9)05S502 16页	座	1.000	3730.65	3730.65
180	031003013003	水表	(1)水表组(闸阀 DN80 2个, 水表LXS-80 1个, 防止倒流器 DN80 1个)	组/个	1.000	2448.12	2448.12
181	031003001011	螺纹阀门	(1)截止阀 DN50	个	9.000	276.88	2491.92
182	031003001012	螺纹阀门	(1)快速取水阀DN25 (2)C20基础 (3)卵石透水层	个	12.000	56.95	683.40
183	030109011002	潜水泵	(1)加压潜水泵, DN110 (2)Q=12.0L/S, H=40m, N =11kW	台	1.000	4268.23	4268.23
184	030901003003	水喷淋(雾)喷头	(1)水喷淋(雾)喷头	个	16.000	56.95	911.20
		破除修复					
185	041001001001	拆除路面	(1)水泥路面 (2)18cm	m2	36.000	16.22	583.92
186	041001003045	拆除基层	(1)材质:碎石灌砂 (2)厚度:18cm (3)部位:基层	m2	36.000	4.94	177.84
187	040103002058	余方弃置	(1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5km	m3	13.000	30.02	390.26
村容村貌提升							
1. 库湾路路口提升							
园林建筑							
188	05B073	镇标	(1)100宽3厚红色不锈 钢广告字	个	1.000	2211.99	2211.99

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第19页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2)3厚热镀锌钢板,深蓝色氟碳漆饰面 (3)3厚热镀锌钢板,浅蓝色氟碳漆饰面 (4)3厚热镀锌钢板,白色氟碳漆饰面 (5)3厚不锈钢深蓝色广告字 (6)3厚不锈钢浅蓝色广告字 (7)600*300*50厚芝麻灰荔枝面				
绿化种植							
189	050102001011	栽植乔木	(1)宫粉紫荆 (2)胸径13-14cm (3)高度:4.5m,冠幅:2m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	5.000	1972.95	9864.75
190	050102002004	栽植灌木	(1)丛生紫薇 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 180-200cm (5)P: 150cm (6)多株拼丛,花淡粉,以高度冠幅为准,袋苗,全冠,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	2.000	659.28	1318.56
191	050102001012	栽植乔木	(1)鸡爪槭 (2)胸径8-9cm (3)高度:2m,冠幅:1.8m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	2.000	1135.95	2271.90
192	050102002005	栽植灌木	(1)同安红三角梅 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 120-150cm (5)P: 80cm (6)盆苗,以高度冠幅为准,全冠,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	3.000	392.32	1176.96
193	050102002006	栽植灌木	(1)红花继木球 (2)带土球 (3)成活养护期半年日	株	3.000	243.22	729.66

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第20页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			常养护期半年 (4)H: 110-120cm (5)P: 110-120cm (6)球型, 不脱脚, 冠幅饱满不偏冠, 袋苗 (7)10kg/株				
194	050102002007	栽植灌木	(1)金叶女贞球 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 110-120cm (5)P: 110-120cm (6)球型, 不脱脚, 冠幅饱满不偏冠, 袋苗 (7)10kg/株	株	1.000	230.93	230.93
195	050102002008	栽植灌木	(1)龟甲冬青球A (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 120-150cm (5)P: 80cm (6)球型, 不脱脚, 冠幅饱满不偏冠, 袋苗 (7)10kg/株	株	3.000	201.31	603.93
196	050102002009	栽植灌木	(1)龟甲冬青球B (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 80cm (5)P: 80cm (6)球型, 不脱脚, 冠幅饱满不偏冠, 袋苗 (7)10kg/株	株	5.000	167.49	837.45
197	050102007012	栽植色带	(1)成活养护半年, 日常养护半年 (2)36盆/m2 (3)橙花三角梅 (4)H:30cm, P: 20cm (5)5kg/m2	m2	63.000	181.37	11426.31
198	050102007013	栽植色带	(1)成活养护半年, 日常养护半年 (2)36盆/m2 (3)粉花三角梅 (4)H:30cm, P: 20cm (5)5kg/m2	m2	36.000	190.22	6847.92
199	050102007014	栽植色带	(1)成活养护半年, 日常养护半年 (2)36盆/m2 (3)紫花三角梅 (4)H:30cm, P: 20cm (5)5kg/m2	m2	60.000	203.49	12209.40
200	050102007015	栽植色带	(1)成活养护半年, 日常养护半年 (2)64株/m2 (3)紫花马缨丹肾蕨混种 (4)H:25cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	131.000	129.76	16998.56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第21页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
201	050102007016	栽植色带	(1)成活养护半年，日常养护半年 (2)120株/m2 (3)麦冬 (4)H:10cm, P: 10cm (5)5kg/m2	m2	52.000	123.85	6440.20
202	050101010003	整理绿化用地	(1)绿地整理(整理绿化地) 客土回填	m2	342.000	4.24	1450.08
203	050101009003	种植土回(换)填	(1)符合设计要求 (2)30cm	m3	103.000	44.64	4597.92
2. 休闲长廊提升							
园林建筑							
204	011207001008	墙面装饰板	(1)新增3厚热镀锌钢板 (2)面饰仿木纹氟碳漆	m2	31.000	470.68	14591.08
205	020111003001	挂落	(1)挂落制作 (五纹头、宫万式)	m2	26.000	307.34	7990.84
206	010604001001	钢梁	(1)钢梁、吊车梁(钢梁安装1.5t以内) (2)金属构件运输(一类金属构件 运距15km以内)	t	2.070	11072.53	22920.14
207	011405001005	金属面油漆	(1)金属面其他油漆(金属面 氟碳漆)	m2	87.000	106.11	9231.57
3. 库湾路起点文化展示墙							
展示墙							
208	010101003012	挖沟槽土方	(1)三类土 (2)2m以内	m3	89.000	42.70	3800.30
209	010103001010	回填方	(1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	51.000	10.42	531.42
210	010103002005	余方弃置	(1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m3	31.000	26.02	806.62
211	010404001007	垫层	(1)15cm灰土垫层	m3	6.000	287.35	1724.10
212	010501001010	垫层	(1)100厚C20混凝土垫层	m3	4.000	503.40	2013.60
213	010503001009	基础梁	(1)非泵送 (2)C25	m3	8.000	502.24	4017.92
214	010507005006	压顶	(1)非泵送 (2)C25	m3	5.000	704.74	3523.70
215	010502001003	矩形柱	(1)非泵送 (2)C25	m3	7.000	506.19	3543.33
216	010401003007	实心砖墙	(1)清水标准砖墙(240mm以内)	m3	17.000	791.59	13457.03
217	011201004008	立面砂浆找平层	(1)20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	141.000	56.77	8004.57
218	011204003014	块料墙面	(1)600*150*15厚红色大小拼天然文化石	m2	12.000	136.25	1635.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第22页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
219	011204003015	块料墙面	(1)240*60*10厚红砖贴片	m2	129.000	167.79	21644.91
220	010515001025	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ8	t	1.360	5812.56	7905.08
221	010515001026	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ10	t	3.180	5812.56	18483.94
222	011508005005	吸塑字	(1)字宽30,3厚PVC蓝色广告字,余同	个 (套)	16.000	130.80	2092.80
223	011502008003	GRC装饰线条	(1)GBR白色造型线条	m	53.000	147.17	7800.01
4. 景观平台提升							
园林建筑							
224	050201015004	栈道	(1)面层材料种类:140宽25厚拉丝重竹木,离缝宽5mm,专用不锈钢卡扣固定;20mm厚侧封板 (2)支架材料种类:60mm长L50*5mm厚热镀锌角钢,M8膨胀螺栓固定 (3)□50*50*5mm厚热镀锌矩形钢管 (4)10mm厚橡胶垫 (5)100mm厚C20混凝土墩 (6)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (7)100mm厚C20混凝土垫层 (8)150mm厚碎石灌砂垫层 (9)素土夯实,夯实程度≥93%	m2	78.000	804.12	62721.36
5. 亭子及周边修复							
园林建筑							
225	050304005002	仿竹篱笆	(1)仿竹篱笆	m	52.000	245.77	12780.04
226	050201001030	园路	(1)600*300*50厚青石菠萝面做旧处理 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实,夯实度≥93%	m2	29.000	421.25	12216.25
227	011107001006	石材台阶面	(1)1000x300x150厚毛条石 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (4)100厚C20混凝土垫层 (5)150厚碎石灌砂垫	m2	8.000	436.34	3490.72

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第23页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			层 (6)素土夯实（夯实度≥93%）				
228	011201004009	立面砂浆找平层	(1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	50.000	56.77	2838.50
229	011406001003	抹灰面油漆涂料	(1)乳胶漆饰面	m2	50.000	39.52	1976.00
7. 垃圾桶							
园林建筑							
230	050307017001	垃圾箱	(1)垃圾箱 (2)做法详LD-14.02图7	个	16.000	1044.55	16712.80
8. 智慧导览导视系统及夜景							
园林建筑							
231	05B080	警示牌	(1)警示牌 (2)做法详LD-14.02图5	个	18.000	2211.99	39815.82
232	05B081	指示牌	(1)指示牌 (2)做法详LD-14.02图3	个	20.000	1843.32	36866.40
233	05B082	展示牌	(1)展示牌 (2)做法详LD-14.02图1	个	16.000	1843.32	29493.12
电气工程							
234	040801003001	组合型成套箱式变电站	(1)箱变2SB (2)CBLW1-S-100/10-1-S-J (3)AC-10/0.4KV (4)100KV (5)C25砼基础 (6)接地极L=2500MM L50*50*5角钢 (7)-40*4镀锌扁钢 (8)预埋槽钢 (9)挖土、外运 (10)C25防水砼、20厚1：2水泥砂浆抹灰 (11)不锈钢护栏 (12)余详施工图施	台	1.000	107245.79	107245.79
235	040807001001	变压器系统调试	(1)名称:输配电装置系统调试	系统	1.000	440.14	440.14
236	030404017008	配电箱	(1)名称:照明配电箱 (2)型号:ALjg1/ALjg2 (3)安装方式:落地式,80*80槽钢基础	台	2.000	6204.18	12408.36
237	030404017010	配电箱	(1)名称:照明配电箱 (2)型号:ALjg3 (3)安装方式:落地式,80*80槽钢基础	台	1.000	6204.18	6204.18
238	030404017011	配电箱	(1)名称:照明配电箱 (2)型号:ALjg4 (3)安装方式:落地式,80*80槽钢基础	台	1.000	6204.18	6204.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第24页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
239	030404017012	配电箱	(1)名称:照明配电箱 (2)型号:ALjg5 (3)安装方式:落地式,80*80槽钢基础	台	1.000	6204.18	6204.18
240	030404017009	配电箱	(1)名称:照明配电箱 (2)型号:APcdz1 (3)安装方式:落地式,80*80槽钢基础	台	1.000	6858.18	6858.18
241	030404017013	配电箱	(1)名称:照明配电箱 (2)型号:ALxt (3)安装方式:落地式,80*80槽钢基础	台	1.000	7948.18	7948.18
242	031101001001	开关电源设备	(1)名称:开关电源 (2)型号:AC220V/DC24V-350W (3)安装方式:明装	架/台	30.000	398.68	11960.40
243	030408001016	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZC-YJY (3)规格:4×35+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:室外 (6)电压等级(kV):1KV	m	150.000	187.10	28065.00
244	030408001017	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZC-YJY (3)规格:4×25+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:室外 (6)电压等级(kV):1KV	m	20.000	143.39	2867.80
245	030408001018	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:ZC-YJV (3)规格:3×6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:室外 (6)电压等级(kV):1KV	m	358.000	30.88	11055.04
246	030408006001	电力电缆头	(1)名称:干包电缆头 (2)型号:WDZC-YJY (3)规格:4×35+1×16mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV	个	4.000	131.40	525.60
247	030408006002	电力电缆头	(1)名称:干包电缆头 (2)型号:WDZC-YJY (3)规格:4×25+1×16mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV	个	2.000	131.40	262.80
248	030411004009	配线	(1)名称:软导线 (2)型号:ZC-RVV (3)规格:2×4mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:线槽	m	1099.000	2.39	2626.61

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第25页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
249	030408003001	电缆保护管	(1)名称:电管 (2)规格:PE32 (3)材质:塑料	m	373.000	5.26	1961.98
250	030408003002	电缆保护管	(1)名称:电管 (2)规格:PE75 (3)材质:塑料	m	600.000	9.73	5838.00
251	040805004012	景观照明灯	(1)庭院灯H=3.5m 50W LED灯 AC220V 4000K IP65 (2)C20基础(预拌非泵送普通混凝土) (3)镀锌扁钢-25*4 (4)镀锌扁钢-40*4 L=110 (5)角钢接地极	套	45.000	2368.34	106575.30
252	040805004011	景观照明灯	(1)草坪灯 10W LED灯 AC220V 4000K IP65 (2)C20基础(预拌非泵送普通混凝土) (3)镀锌扁钢-25*4 (4)镀锌扁钢-40*4 L=110 (5)角钢接地极	套	12.000	1457.61	17491.32
253	030412001015	普通灯具	(1)名称:LED洗墙灯 A(1000mm) (2)参数:25° ×40° ,色温3000K, 电压24V , 功率24W, 光源: LED, IP66	套	76.000	463.24	35206.24
254	030412001033	普通灯具	(1)名称:LED壁灯 (2)参数:25° , 色温3000K, 电压AV24V, 功率6W, 光源: LED, IP66	套	85.000	343.70	29214.50
255	030412001034	普通灯具	(1)名称:射树灯A (2)参数:防护等级:IP67 功率:24W/AC220V 光源:LED灯 色温:3000K 材料:灯体为压铸铝 (3)透光罩为钢化玻璃 (4)光束角度可调 带蜂窝防眩罩	套	12.000	213.00	2556.00
256	030503003001	控制器	(1)名称: 4路时控器	台/套	1.000	2049.15	2049.15
257	030501009001	路由器	(1)名称: 4G四路无线智能终端	台/套	1.000	3225.44	3225.44
258	040504001019	砌筑井	(1)混凝土井盖700*700 (2)C15混凝土垫层 (3)侧墙: 采用水泥砖 Mn15, M7.5砂浆砌筑。井壁内外采用1:2.5水泥砂浆抹面10mm厚。	座	10.000	1588.03	15880.30
259	040101002026	挖沟槽土方	(1)三类土 (2)2m以内	m3	685.000	4.96	3397.60

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第26页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
260	040103001043	填方	(1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:	m3	386.000	8.23	3176.78
261	03B001	充电桩设备	(1)充电桩设备	个	6.000	15361.04	92166.24
监控工程							
262	030501010001	收发器	(1)光纤收发器	台/套	10.000	839.59	8395.90
263	030501012007	交换机	(1)8口千兆交换机	台/套	3.000	1943.08	5829.24
264	030501012006	交换机	(1)4口POE交换机	台/套	7.000	1812.28	12685.96
265	030507008003	监控摄像设备	(1)枪式彩色摄像机 (2)摄像机抱杆支架	台	41.000	1301.15	53347.15
266	030507008004	监控摄像设备	(1)监控摄像设备(监控设备立杆 杆长3.5m)	台	41.000	1609.17	65975.97
267	030502001003	机柜、机架	(1)监控设备柜	台	10.000	1500.94	15009.40
268	030507014001	显示设备	(1)42寸液晶显示器 (2)监视器配件(支架、高清线)	台	1.000	4126.27	4126.27
269	030502001004	机柜、机架	(1)前端设备柜	台	1.000	310.97	310.97
270	030507013001	录像设备	(1)嵌入式网络硬盘录像机	台/套	1.000	4366.46	4366.46
271	030501004001	存储设备	(1)监控专用硬盘	台	8.000	1297.93	10383.44
272	030501012008	交换机	(1)24口千兆交换机	台/套	3.000	2774.61	8323.83
273	030502005003	双绞线缆	(1)双绞线缆(管内穿放≤4对) CAT5E	m	1872.000	5.08	9509.76
274	030502005004	双绞线缆	(1)双绞线缆(管内穿放≤4对) CAT6E	m	669.000	5.86	3920.34
275	030411001001	配管	(1)埋地敷设 PVC20	m	933.000	11.24	10486.92
276	030411004012	配线	(1)穿多芯软导线 RVV-2×1.5	m	1808.000	7.51	13578.08
277	030411004013	配线	(1)穿多芯软导线 RVV-2×1.0	m	130.000	6.59	856.70
278	030411006001	接线盒	(1)接线盒安装(暗装接线盒)	个	52.000	7.62	396.24
279	010501006001	设备基础	(1)基础制作(C20混凝土基础) (2)基础制作(C30混凝土基础) (3)素混凝土垫层 C15 (4)基础制作(地脚螺栓安装) (5)钢筋、铁件(铁件制作) (6)钢筋、铁件(铁件安装) (7)接地母线敷设(户内接地母线敷设)	m3	5.000	1726.81	8634.05

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第27页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(8)接地极（板）制作与安装(圆钢接地极 普通土)				
280	010101004002	挖基坑土方	(1) 基坑土方施工(普通土 挖深≤2m)	m3	21.000	56.39	1184.19
281	010103001013	回填方	(1) 回填工程(填土人工夯实 槽坑)	m3	14.000	14.99	209.86
282	030507017001	安全防范分系统调试	(1) 安全防范分系统调试(电视监控系统 ≤50台)	系统	1.000	6265.42	6265.42
283	030502019001	双绞线缆测试	(1) 测试(4对双绞线缆)	链路/点	26.000	13.81	359.06
农村休闲文化设施							
1. 水利文化园							
园林建筑							
284	050201001007	园路	(1) 1000*500*30厚芝麻白荔枝面 (2) 5厚纯水泥膏一道 (3) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4) 100厚C20混凝土结构层 (5) 150厚碎石灌砂垫层 (6) 素土夯实, 夯实度≥93%	m2	325.000	309.87	100707.75
285	050201001006	园路	(1) 600*300*30厚芝麻黑烧面 (2) 5厚纯水泥膏一道 (3) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4) 100厚C20混凝土结构层 (5) 150厚碎石灌砂垫层 (6) 素土夯实, 夯实度≥93%	m2	109.000	359.82	39220.38
286	050201001008	园路	(1) 边长200~600 30厚芝麻白荔枝面碎拼 (2) 5厚纯水泥膏一道 (3) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4) 100厚C20混凝土结构层 (5) 150厚碎石灌砂垫层 (6) 素土夯实, 夯实度≥93%	m2	68.000	311.55	21185.40
287	011107001002	石材台阶面	(1) 600*330*70厚芝麻白荔枝面踏面 (2) 600*150*25厚芝麻灰荔枝面踢面 (3) 5厚纯水泥膏一道 (4) 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层	m2	36.000	657.98	23687.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第28页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(5)120厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实（夯实度≥93%）				
288	050305006001	石桌石凳		个	1.000	2445.74	2445.74
289	050307019001	其他景观小摆设	(1)漫步机	个	2.000	1474.66	2949.32
290	050307019002	其他景观小摆设	(1)肩关节康复器	个	2.000	1228.89	2457.78
291	050307019003	其他景观小摆设	(1)高低杠	个	1.000	983.10	983.10
292	020510004004	坐凳面	(1)600*400/500*50厚芝麻白光面 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)240*60*10厚红砖贴片 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实（夯实度≥93%）	m2	25.000	1040.82	26020.50
景墙1							
293	010101003007	挖沟槽土方	(1)三类土 (2)2m以内	m3	44.000	42.70	1878.80
294	010103001006	回填方	(1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	25.000	10.42	260.50
295	010103002002	余方弃置	(1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m3	15.000	26.02	390.30
296	010404001003	垫层	(1)15cm灰土垫层	m3	3.000	287.35	862.05
297	010501001006	垫层	(1)100厚C20混凝土垫层	m3	2.000	503.40	1006.80
298	010503001006	基础梁	(1)非泵送 (2)C25	m3	4.000	502.24	2008.96
299	010507005003	压顶	(1)非泵送 (2)C25	m3	2.000	704.74	1409.48
300	010502001002	矩形柱	(1)非泵送 (2)C25	m3	3.000	506.19	1518.57
301	010401003003	实心砖墙	(1)清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	8.000	791.59	6332.72
302	011201004002	立面砂浆找平层	(1)20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	70.000	56.77	3973.90
303	011204003003	块料墙面	(1)600*150*15厚红色大小拼天然文化石	m2	6.000	136.25	817.50
304	011204003004	块料墙面	(1)240*60*10厚红砖贴片	m2	65.000	167.79	10906.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第29页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
305	010515001013	现浇构件钢筋	(1)HRB400E Φ8	t	0.680	5812.56	3952.54
306	010515001014	现浇构件钢筋	(1)HRB400E Φ10	t	1.590	5812.56	9241.97
307	011508005002	吸塑字	(1)字宽30,3厚PVC蓝色广告字,余同	个 (套)	8.000	130.80	1046.40
308	011502008001	GRC装饰线条	(1)GBR白色造型线条	m	26.000	147.17	3826.42
景墙2							
309	010101003008	挖沟槽土方	(1)三类土 (2)2m以内	m3	31.000	42.70	1323.70
310	010103001007	回填方	(1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	18.000	10.42	187.56
311	010103002003	余方弃置	(1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m3	10.000	26.02	260.20
312	010404001004	垫层	(1)15cm灰土垫层	m3	1.000	287.35	287.35
313	010501001007	垫层	(1)100厚C20混凝土垫层	m3	1.000	503.40	503.40
314	010503001007	基础梁	(1)非泵送 (2)C25	m3	1.000	502.24	502.24
315	010507005004	压顶	(1)非泵送 (2)C25	m3			
316	010401003004	实心砖墙	(1)清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	3.000	791.59	2374.77
317	011201004003	立面砂浆找平层	(1)20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	22.000	56.77	1248.94
318	011204003008	块料墙面	(1)240*60*10厚红砖贴片	m2	20.000	167.79	3355.80
319	010515001017	现浇构件钢筋	(1)HRB400E Φ8	t	0.390	5812.56	2266.90
320	010515001018	现浇构件钢筋	(1)HRB400E Φ10	t	0.980	5812.56	5696.31
321	011508005003	吸塑字	(1)字宽30,3厚PVC蓝色广告字,余同	个 (套)	16.000	196.20	3139.20
322	011108001002	石材零星项目	(1)600*300*100厚芝麻白荔枝面压顶	m2	3.000	434.87	1304.61
景墙3							
323	010101003009	挖沟槽土方	(1)三类土 (2)2m以内	m3	33.000	42.70	1409.10
324	010103001008	回填方	(1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	21.000	10.42	218.82
325	010103002004	余方弃置	(1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m3	9.000	26.02	234.18
326	010404001005	垫层	(1)15cm灰土垫层	m3	1.000	287.35	287.35
327	010501001008	垫层	(1)100厚C20混凝土垫层	m3	1.000	503.40	503.40
328	010503001008	基础梁	(1)非泵送	m3	1.000	502.24	502.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第30页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2)C25				
329	010507005005	压顶	(1)非泵送 (2)C25	m3			
330	010401003005	实心砖墙	(1)清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	6.000	791.59	4749.54
331	011201004004	立面砂浆找平层	(1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	53.000	56.77	3008.81
332	011204003009	块料墙面	(1)240*60*10厚红砖贴片	m2	53.000	167.79	8892.87
333	010515001021	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ8	t	0.410	5812.56	2383.15
334	010515001022	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ10	t	1.090	5812.56	6335.69
335	011508005004	吸塑字	(1)字宽30,3厚PVC蓝色广告字,余同	个 (套)	35.000	196.20	6867.00
336	011108001003	石材零星项目	(1)600*300*100厚芝麻白荔枝面压顶	m2	3.000	434.87	1304.61
337	011207001007	墙面装饰板	(1)3厚热镀锌钢板,黑色氟碳漆饰面 (2)文字UV打印	m2	14.000	261.88	3666.32
廊架							
338	010101003006	挖沟槽土方	(1)三类土 (2)2m以内	m3	32.000	42.70	1366.40
339	010103001005	回填方	(1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	13.000	10.42	135.46
340	010501001005	垫层	(1)100厚C20混凝土垫层	m3	2.000	503.40	1006.80
341	010501003001	独立基础	(1)非泵送 (2)C25	m3	5.000	496.07	2480.35
342	010502001001	矩形柱	(1)非泵送 (2)C25	m3	2.000	517.75	1035.50
343	010503001005	基础梁	(1)非泵送 (2)C25	m3	5.000	502.24	2511.20
344	010515001010	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ10	t	0.060	5812.50	348.75
345	010515001011	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ14	t	0.170	5381.65	914.88
346	010515001012	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ18	t	0.170	5381.65	914.88
347	010603003001	钢管柱	(1)镀锌钢管柱 (2)制安,含半成品运输	t	3.590	10594.95	38035.87
348	011405001004	金属面油漆	(1)面饰香槟金氟碳漆	m2	311.000	106.11	33000.21
349	010901002003	型材屋面	(1)2.5厚白色铝单板	m2	138.000	325.74	44952.12
给水工程							
350	040101002028	挖沟槽土方	(1)三类土 (2)2m以内	m3	57.000	7.59	432.63
351	040103001050	填方	(1)符合设计要求 (2)机制砂 (3)符合设计要求	m3	13.000	106.48	1384.24
352	040103001051	填方	(1)符合设计要求	m3	30.000	8.48	254.40

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第31页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2) 原土 (3) 符合设计要求				
353	010103002007	余方弃置	(1) 废弃料品种: 原土余方 (2) 运距: 运距自行考虑	m3	22.000	26.82	590.04
354	031001006055	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN25 (3) 1.25Mpa	m	62.000	14.31	887.22
355	031001006056	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN32 (3) 1.25Mpa	m	31.000	15.42	478.02
356	031003013004	水表	(1) 水表组(闸阀 DN80 2个, 水表LXS-80 1个, 防止倒流器 DN80 1个)	组/个	1.000	2448.12	2448.12
357	030901003001	水喷淋(雾)喷头	(1) 水喷淋(雾)喷头	个	3.000	56.95	170.85
358	040504001024	砌筑井	(1) C15混凝土垫层 (2) C25现浇底板 (3) C25预拌非泵送细石混凝土盖板 (4) 砌筑井壁(砖砌井壁矩形) (5) 预制混凝土(圆钢筋Φ10以外) (6) 井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (7) 井盖、井箅安装(安全防坠网) (8) 井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) (9) 05S502 16页	座	1.000	3730.65	3730.65
3. 无动力公园							
园林建筑							
359	050201001009	园路	(1) 13厚EPDM现浇 (2) 塑胶地面粘合剂 (3) 30厚1:3水泥砂浆找平层 (4) 180厚C25混凝土垫层 (5) 200厚级配碎石垫层 (6) 素土夯实, 夯实度≥93%	m2	608.000	407.44	247723.52
360	050201001010	园路	(1) 面饰丙烯酸涂料 (2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (3) 120厚C20混凝土垫层 (4) 150厚碎石灌沙垫层 (5) 素土夯实(夯实度≥93%)	m2	63.000	292.44	18423.72
361	011502001002	金属装饰线	(1) M8膨胀螺栓固定,	m	275.000	35.76	9834.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第32页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			④500 (2)L50*50*8热镀锌角钢通长				
362	011107001003	石材台阶面	(1)600*330*70厚芝麻白荔枝面踏面 (2)600*110*25厚芝麻白荔枝面踢面 (3)5厚纯水泥膏一道 (4)30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (5)120厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实(夯实度≥93%)	m ²	20.000	645.89	12917.80
363	040204004002	安砌侧(平、缘)石	(1)600*150*250高芝麻白机切面立路沿,一侧倒直,角10*10mm (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆坐浆 (3)C20混凝土垫高层 (4)C15混凝土护肩	m	22.000	115.78	2547.16
364	040204004003	安砌侧(平、缘)石	(1)120*280 通长C20混凝土高道牙 (2)外侧倒角R=15 (3)10厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (4)面饰深蓝色丙烯酸涂料	m	50.000	122.43	6121.50
365	040205006004	标线	(1)100宽白色热熔漆画线 (2)热熔漆	m ²	466.000	37.76	17596.16
366	05B055	玻璃钢坐凳	(1)玻璃钢坐凳	个	2.000	1843.32	3686.64
367	020510004005	坐凳面	(1)600*400/500*50厚芝麻白光面 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)240*60*10厚红砖贴片 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实(夯实度≥93%)	m ²	9.000	1029.22	9262.98
368	05B052	户外白色不锈钢“鲸鱼”滑梯意向图	(1)互动墙	个	1.000	104455.09	104455.09
369	05B054	互动墙	(1)互动墙	个	1.000	61444.17	61444.17
370	05B053	入口标识	(1)50宽3厚灰色不锈钢广告字 (2)3厚热镀锌钢板,玫红色氟碳漆饰面	个	1.000	55299.75	55299.75
371	01B001	摇摇乐		个	3.000	553.00	1659.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第33页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
372	01B003	扭腰器		个	1.000	983.10	983.10
373	01B002	儿童活动器械		个	1.000	14746.60	14746.60
绿化种植							
374	050102001017	栽植乔木	(1)大香樟 (2)胸径30-32cm (3)高度:9m,冠幅:5m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)特选,全冠假植苗,4级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	2.000	7275.96	14551.92
375	050102001021	栽植乔木	(1)南洋楹 (2)胸径19-20cm (3)高度:5.5m,冠幅:3m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	14.000	2574.87	36048.18
376	050102001020	栽植乔木	(1)墨西哥落羽杉 (2)胸径13-14cm (3)高度:5m,冠幅:2m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	16.000	1341.05	21456.80
377	050102001023	栽植乔木	(1)木棉 (2)腹径30-35 (3)高度:5m,冠幅:3m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	4.000	2329.10	9316.40
378	050102001024	栽植乔木	(1)蓝花楹 (2)胸径15-16cm (3)高度:3.8m,冠幅:1.5m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	41.000	2164.42	88741.22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第34页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
379	050102001025	栽植乔木	(1) 秋枫 (2) 胸径15-16cm (3) 高度:3.5m, 冠幅:2.5m (4) 带土球 (5) 成活养护半年, 日常养护半年 (6) 枝下高1.8-2.2米, 全冠假植苗, 3级以上分枝, 冠幅饱满, 树型优美 (7) 20kg/株	株	25.000	2206.20	55155.00
380	050102001026	栽植乔木	(1) 香樟 (2) 胸径15-17cm (3) 高度:3.5m, 冠幅:2.8m (4) 带土球 (5) 成活养护半年, 日常养护半年 (6) 枝下高1.8-2米, 全冠假植苗, 3级以上分枝, 树型优美 (7) 20kg/株	株	7.000	2574.87	18024.09
381	050102001027	栽植乔木	(1) 红花鸡蛋花 (2) 胸径11-12cm (3) 高度:3m, 冠幅:2.8m (4) 带土球 (5) 成活养护半年, 日常养护半年 (6) 全冠假植苗, 冠幅饱满, 树型优美 (7) 10kg/株	株	8.000	1202.55	9620.40
382	050102001028	栽植乔木	(1) 丛生四季桂 (2) 胸径10-12cm (3) 高度:2.5m, 冠幅:2m (4) 带土球 (5) 成活养护半年, 日常养护半年 (6) 低分枝, 冠幅伞形, 高度冠幅为准, 全冠假植苗, 冠幅饱满, 树型优美 (7) 10kg/株	株	5.000	2062.77	10313.85
383	050102002028	栽植灌木	(1) 丛生紫薇 (2) 带土球 (3) 成活养护期半年日常养护期半年 (4) H: 180-200cm (5) P: 150cm (6) 多株拼丛, 花淡粉, 以高度冠幅为准, 袋苗, 全冠, 冠幅饱满, 树型优美 (7) 10kg/株	株	13.000	659.28	8570.64
384	050102001029	栽植乔木	(1) 日本晚樱 (2) 胸径8-9cm (3) 高度:2.5-3m, 冠	株	13.000	1602.93	20838.09

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第35页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			幅：1.5m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)多花,全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株				
385	050102002022	栽植灌木	(1)海桐球 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：130-150cm (5)P：130-150cm (6)球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	8.000	655.08	5240.64
386	050102002023	栽植灌木	(1)同安红三角梅 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：120-150cm (5)P：80cm (6)盆苗,以高度冠幅为准,全冠,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	5.000	392.32	1961.60
387	050102002024	栽植灌木	(1)红花继木球 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：110-120cm (5)P：110-120cm (6)球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	17.000	243.22	4134.74
388	050102002025	栽植灌木	(1)金叶女贞球 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：110-120cm (5)P：110-120cm (6)球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	11.000	230.93	2540.23
389	050102002027	栽植灌木	(1)龟甲冬青球B (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：80cm (5)P：80cm (6)球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	4.000	167.49	669.96
390	050102007030	栽植色带	(1)成活养护半年，日常养护半年 (2)49株/m2 (3)红绒球	m2	265.000	114.99	30472.35

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第36页 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(4)H:45cm, P: 15cm (5)5kg/m2				
391	050102007032	栽植色带	(1)成活养护半年, 日常养护半年 (2)49株/m2 (3)银边山菅兰 (4)H:35cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	9.000	107.63	968.67
392	050102007033	栽植色带	(1)成活养护半年, 日常养护半年 (2)49株/m2 (3)金叶假连翘 (4)H:35cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	7.000	113.66	795.62
393	050102007034	栽植色带	(1)成活养护半年, 日常养护半年 (2)64株/m2 (3)紫花马樱丹 (4)H:35cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	42.000	121.89	5119.38
394	050102007035	栽植色带	(1)成活养护半年, 日常养护半年 (2)64株/m2 (3)大花芦莉 (4)H:20cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	23.000	114.03	2622.69
395	050102007036	栽植色带	(1)成活养护半年, 日常养护半年 (2)64株/m2 (3)紫雪茄 (4)H:20cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	4.000	114.03	456.12
396	050102012003	铺种草皮	(1)成活养护半年, 日常养护半年 (2)马尼拉草卷 (3)满铺 (4)5kg/m2	m2	2283.000	34.86	79585.38
397	050101010004	整理绿化用地	(1)绿地整理(整理绿化地) 客土回填	m2	2633.000	4.24	11163.92
398	050101009004	种植土回(换)填	(1)符合设计要求 (2)30cm	m3	790.000	44.64	35265.60
景墙							
399	010101003010	挖沟槽土方	(1)三类土 (2)2m以内	m3	36.000	42.70	1537.20
400	010103001009	回填方	(1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	2.000	10.42	20.84
401	010404001006	垫层	(1)15cm垫层(碎石灌砂)	m3	4.000	272.35	1089.40
402	010501001009	垫层	(1)100厚C20混凝土垫层	m3	3.000	503.40	1510.20
403	010401003006	实心砖墙	(1)粘土砖 (2)水泥砂浆M7.5	m3	18.000	706.51	12717.18
404	011201004005	立面砂浆找平层	(1)20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	129.000	56.77	7323.33

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
旧建筑改造提升							
1. 移民文化展示中心立面提升							
装饰							
1	011701002002	外脚手架及垂直封闭安全网		m2	797.000	56.92	45365.24
2. 库湾路戏台改造							
土方工程							
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1.000	4207.00	4207.00
混凝土工程							
3	011702001013	基础模板		m2	6.000	80.26	481.56
4	011702001014	基础模板		m2	25.000	65.44	1636.00
5	011702002004	柱模板		m2	49.000	86.72	4249.28
6	011702003001	构造柱模板		m2	5.000	108.98	544.90
7	011702006001	梁模板		m2	5.000	128.85	644.25
新制作工程							
拆除工程							
8	011701002004	外脚手架及垂直封闭安全网		m2	275.000	56.92	15653.00
3. 水泵房立面改造							
装饰							
9	011701002003	外脚手架及垂直封闭安全网		m2	275.000	56.92	15653.00
环库绿化景观提升							
1. 移民文化广场绿化提升							
园林建筑							
绿化种植							
给水工程							
2. 移民文化广场入口提升							
园林建筑							
给水工程							
3. 环库湾线性公园							
园林建筑							
文化景墙							
10	011702001007	基础模板		m2	6.000	76.43	458.58
11	011702005005	基础梁模板		m2	6.000	67.80	406.80
12	011702025002	其他现浇构件模板		m2	6.000	75.64	453.84
给水工程							
村容村貌提升							
1. 库湾路路口提升							
园林建筑							
绿化种植							
2. 休闲长廊提升							
园林建筑							
3. 库湾路起点文化展示墙							
展示墙							
13	011702001012	基础模板		m2	2.000	76.43	152.86
14	011702005010	基础梁模板		m2	2.000	67.80	135.60

单价措施项目清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
15	011702025007	其他现浇构件模板		m2	2.000	75.64	151.28
16	011702002003	柱模板		m2	34.000	82.58	2807.72
4. 景观平台提升							
园林建筑							
5. 亭子及周边修复							
园林建筑							
7. 垃圾桶							
园林建筑							
17	050401001002	砌筑脚手架		m2	237.000	9.13	2163.81
8. 智慧导览导视系统及夜景							
园林建筑							
18	050401001003	砌筑脚手架		m2	237.000	9.13	2163.81
电气工程							
监控工程							
农村休闲文化设施							
1. 水利文化园							
园林建筑							
景墙1							
19	011702001008	基础模板		m2	2.000	76.43	152.86
20	011702005006	基础梁模板		m2	2.000	67.80	135.60
21	011702025003	其他现浇构件模板		m2	2.000	75.64	151.28
22	011702002002	柱模板		m2	34.000	82.58	2807.72
景墙2							
23	011702001009	基础模板		m2	3.000	76.43	229.29
24	011702005007	基础梁模板		m2	3.000	67.80	203.40
25	011702025004	其他现浇构件模板		m2	2.000	75.64	151.28
景墙3							
26	011702001010	基础模板		m2	3.000	76.43	229.29
27	011702005008	基础梁模板		m2	3.000	67.80	203.40
28	011702025005	其他现浇构件模板		m2	3.000	75.64	226.92
廊架							
29	011702001005	基础模板		m2	4.000	76.43	305.72
30	011702001006	基础模板		m2	14.000	77.76	1088.64
31	011702002001	柱模板		m2	13.000	82.58	1073.54
32	011702005004	基础梁模板		m2	34.000	67.80	2305.20
33	011701002001	外脚手架及垂直封闭安全网		m2	32.000	56.70	1814.40
给水工程							
3. 无动力公园							
园林建筑							
绿化种植							
景墙							
34	011702001011	基础模板		m2	1.000	76.43	76.43
35	011702005009	基础梁模板		m2			
36	011702025006	其他现浇构件模板		m2	1.000	75.64	75.64

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
旧建筑改造提升													
1. 移民文化展示中心立面提升													
装饰													
1	011507001001	平面、箱式招牌 (1)2.5厚白色铝单板外包 (2)L50*50*5厚角钢通长 (3)50*50*3厚镀锌矩形钢管 (4)2.5厚白色冲孔铝单板(渐变冲孔) (5)100*50*3厚镀锌矩形钢管@1000 (6)200*200*10厚热镀锌钢板@1000 (7)50*50*3厚镀锌矩形钢管 (8)L50*50*5厚角钢通长 (9)2.5厚白色铝单板外包 (10)底部间隔750冲20mm排水孔	m2	280.000	154.98	496.02		1.73	44.32	41.83		66.50	805.37
1.1	10115177T	平面广告牌基层(钢结构 复杂)	m2	280.000	127.01	105.13		1.73	15.88	14.99		23.83	288.57
1.2	10115187T	灯箱、广告牌面层(铝塑板)	m2	301.000	26.02	238.70			17.97	16.96		26.97	326.62
1.3	101AB001T	新增店招（50宽*1.5厚不锈钢店招LOGO）	个	47.000		800.00			54.32	51.26		81.50	987.08
2	011302001001	天棚吊顶 (1)100*50*3厚镀锌矩形钢管@600 (2)3厚不锈钢水波板	m2	249.000	36.54	266.76			20.59	19.43		30.90	374.22
2.1	10113038	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型)(面层规格600mm×600mm 平面)	m2	249.000	19.81	23.96			2.97	2.80		4.46	54.00
2.2	10113108T	天棚面层(方形铝扣板300mm×300mm)	m2	249.000	16.73	242.80			17.62	16.63		26.44	320.22
3	011204003010	块料墙面 (1)240*60*10厚红砖贴片	m2	112.000	80.50	55.87		0.18	9.27	8.75		13.91	168.48
3.1	10112084	外墙面面砖(每块面积≤0.01m2 水泥砂浆粘贴面砖灰缝5mm)	m2	112.000	80.50	55.87		0.18	9.27	8.75		13.91	168.48
4	011201004007	立面砂浆找平层 (1)20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	112.000	39.08	5.81		0.63	3.09	2.92		4.64	56.17
4.1	10112018T	外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙20mm厚)	m2	112.000	39.08	5.81		0.63	3.09	2.92		4.64	56.17

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第2页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
5	011604002001	立面抹灰层拆除 (1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面)	m2	112.000	15.12				1.03	0.97		1.54	18.66
5.1	10116046	拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面)	m2	112.000	15.12				1.03	0.97		1.54	18.66
6	010103002009	余方弃置 (1)弃渣 (2)投标人自行考虑	m3	5.000	0.53			15.14	1.06	1.00		1.60	19.33
6.1	10101075	机械装土方(装载机装土方)	m3	5.000	0.35			2.30	0.18	0.17		0.27	3.27
6.2	10101086T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距5km以内)	m3	5.000	0.18			12.84	0.88	0.83		1.33	16.06
2. 库湾路戏台改造													
土方工程													
7	010101001001	平整场地 (1)平整场地(挖掘机)	m2	122.000	0.06			1.14	0.14	0.08		0.13	1.55
7.1	10101003	平整场地(挖掘机)	m2	122.000	0.06			1.14	0.14	0.08		0.13	1.55
8	010101004001	挖基坑土方 (1)三类土 (2)2m以内	m3	265.000	0.40			3.02	0.40	0.23		0.36	4.41
8.1	10101030T	人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5%	m3		55.32				6.47	3.71		5.90	71.40
8.2	10101055	挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土)	m3	1.000	0.40			3.02	0.40	0.23		0.36	4.41
9	010103001011	回填方 (1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	128.000	5.89			2.59	0.99	0.57		0.90	10.94
9.1	10101103	回填工程(填土机械夯实 槽坑)	m3	128.000	5.89			2.59	0.99	0.57		0.90	10.94
10	010103001012	回填方 (1)碎石灌砂 (2)压实度详设计及规范要求	m3	61.000	42.54	128.46		0.65	20.07	11.50		18.29	221.51
10.1	10104071T	砂石垫层(天然级配)	m3	61.000	42.54	128.46		0.65	20.07	11.50		18.29	221.51
11	010103002006	余方弃置	m3	118.000	0.18			20.99	2.47	1.42		2.26	27.32

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第3页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑											
11.1	10101086T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内)	m3	118.000	0.18			20.99	2.47	1.42		2.26	27.32
混凝土工程													
12	010501001011	垫层 (1)商品混凝土 (2)C20	m3	10.000	48.64	359.23			47.68	27.33		43.46	526.34
12.1	10105001T	基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层)	m3	10.000	48.64	359.23			47.68	27.33		43.46	526.34
13	010501004001	满堂基础 (1)商品混凝土 (2)C30	m3	42.000	33.34	392.80		0.07	49.82	28.56		45.41	550.00
13.1	10105007T	C30预拌泵送普通混凝土(无梁式满堂基础)	m3	42.000	33.34	392.80		0.07	49.82	28.56		45.41	550.00
14	010502001004	矩形柱 (1)商品混凝土 (2)C30	m3	7.000	53.88	390.19			51.91	29.76		47.32	573.06
14.1	10105011T	C30预拌非泵送普通混凝土(独立矩形柱)	m3	7.000	53.88	390.19			51.91	29.76		47.32	573.06
15	010502002001	构造柱 (1)非泵送 (2)C30	m3	1.000	257.68	367.94			73.13	41.93		66.66	807.34
15.1	10105014T	C20非泵送混凝土(构造柱)	m3	1.000	257.68	367.94			73.13	41.93		66.66	807.34
16	010503002001	矩形梁 (1)商品混凝土 (2)C30	m3	1.000	42.94	393.52			51.02	29.25		46.51	563.24
16.1	10105016T	C30预拌非泵送普通混凝土(梁)	m3	1.000	42.94	393.52			51.02	29.25		46.51	563.24
17	010515001030	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ8	t	0.390	1086.03	3624.47		19.45	552.93	316.97		503.99	6103.85
17.1	10105067T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	0.390	1086.03	3624.47		19.45	552.93	316.97		503.99	6103.84
18	010515001031	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ10	t	1.040	1086.03	3624.47		19.45	552.93	316.97		503.99	6103.84
18.1	10105067	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	1.040	1086.03	3624.47		19.45	552.93	316.97		503.99	6103.84

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第4页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
19	010515001032	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ14	t	4.020	863.19	3457.15		58.98	511.94	293.48		466.63	5651.37
19.1	10105068T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm)	t	4.020	863.19	3457.15		58.98	511.94	293.48		466.63	5651.37
20	010515001033	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ16	t	2.040	863.19	3457.15		58.98	511.94	293.48		466.63	5651.37
20.1	10105068T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm)	t	2.040	863.19	3457.15		58.98	511.94	293.48		466.63	5651.37
21	010515001034	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ18	t	2.590	863.19	3457.15		58.98	511.94	293.48		466.63	5651.37
21.1	10105068T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm)	t	2.590	863.19	3457.15		58.98	511.94	293.48		466.63	5651.37
22	010516006001	电渣压力焊接 (1)电渣压力焊接Φ≤18	个	68.000	3.78	0.13		0.91	0.56	0.32		0.51	6.21
22.1	10105108	电渣压力焊接Φ≤18	个	68.000	3.78	0.13		0.91	0.56	0.32		0.51	6.21
新制作工程													
23	020501001001	圆柱 (1)圆柱(Φ40cm以内 高8m以内)	m3	5.000	1181.34	9966.13		6.53	1303.90	747.47		1188.48	14393.85
23.1	20304050	圆柱(Φ40cm以内 高8m以内)	m3	5.000	1181.34	9966.13		6.53	1303.90	747.47		1188.48	14393.85
24	020501001002	圆柱 (1)圆柱(Φ36cm以内 高7m以内)	m3	6.000	1197.10	14620.38		7.65	1849.96	1060.51		1686.20	20421.80
24.1	20304035	圆柱(Φ36cm以内 高7m以内)	m3	6.000	1197.10	14620.38		7.65	1849.96	1060.51		1686.20	20421.80
25	020501003001	方柱 (1)方柱(21cm×21cm以内 高5m以内)	m3	1.000	728.91	7089.85		3.93	914.47	524.23		833.53	10094.92
25.1	20304056	方柱(21cm×21cm以内 高5m以内)	m3	1.000	728.91	7089.85		3.93	914.47	524.23		833.53	10094.92
26	020601001001	屋面 (1)筒板瓦屋面 (2)满铺钢筋网、1:3水泥砂浆层(最薄处不小于20厚) (3)603卷材加钉防腐木压条36X8@500 (4)15厚望板 (5)屋椽80宽X60高间距200 (6)椽檩80宽X110中高 (7)桁条D=200	m2	198.000	135.18	544.13		2.76	79.73	45.72		72.67	880.19

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第5页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(8)随檩枋80宽X120高											
26.1	20303204	本瓦屋面（有杠槽-亭）	m2	198.000	58.40	343.28			46.96	26.92		42.80	518.36
26.2	10109027	型材屋面(钢丝网屋面 二网一筋 厚3cm)	m2	198.000	40.52	70.08		2.50	13.22	7.58		12.05	145.95
26.3	10109053	卷材防水(高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面)	m2	198.000	5.85	26.05			3.73	2.14		3.40	41.17
26.4	20304306	矩形椽子（3.5cm×11cm 矩形）	m2	198.000	18.16	56.27		0.11	8.71	5.00		7.94	96.19
26.5	20304406	望板（厚15mm）（横铺 平缝）	m2	198.000	12.25	48.45		0.15	7.11	4.08		6.48	78.52
27	020602002001	屋面窑制正脊 (1)屋面正脊、垂脊（120厚砖墙 高0.3m）	m	46.000	123.98	119.55			28.47	16.32		25.95	314.27
27.1	20303215	屋面正脊、垂脊（120厚砖墙 高0.3m）	m	46.000	123.98	119.55			28.47	16.32		25.95	314.27
28	020602011001	屋脊头、吞头 (1)屋脊喜鹊尾、燕尾	只	8.000	1021.08	460.55			173.20	99.29		157.87	1911.99
28.1	20303223T	屋脊喜鹊尾、燕尾	只	8.000	1021.08	460.55			173.20	99.29		157.87	1911.99
29	020503006001	随梁枋 (1)斗盘枋 (2)180*50 (3)清漆二道	m3	4.000	2116.63	3631.64		1.38	671.99	385.10		612.46	7419.20
29.1	20304190	扁作枋（厚6cm以内 高20cm以内 长4m以内）	m3	4.000	955.31	3510.98		1.38	522.27	299.40		476.04	5765.38
29.2	10114065	醇酸清漆(其他木材面 刷底油、油色 清漆二遍)	m2	197.000	23.58	2.45			3.04	1.74		2.77	33.58
30	020507002001	柱头科斗拱 (1)斗拱四六式*0.9	攒	20.000	180.91	63.92			28.62	16.40		26.09	315.95
30.1	20304376	斗栱（一斗三升 一字型）	座	16.000	161.25	58.60			25.70	14.73		23.43	283.71
30.2	20304378	斗栱（一斗三升 十字型）	座	4.000	259.54	85.22			40.30	23.10		36.73	444.89
31	020502001002	圆梁 (1)趴梁 (2)直径150 (3)清漆二道	m3	6.000	2091.46	3125.02		0.67	609.80	349.50		555.79	6732.24
31.1	20304097	圆梁（Φ18cm以内 长4m以内）	m3	6.000	1419.43	3055.19		0.67	523.16	299.91		476.85	5775.21
31.2	10114065	醇酸清漆(其他木材面 刷底油、油色 清漆二	m2	171.000	23.58	2.45			3.04	1.74		2.77	33.58

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第6页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		遍)											
32	020501004001	童(瓜)柱 (1)矮柱 (2)上30 (3)下60 (4)清漆二道	m3	3.000	5076.14	4630.12		14.18	1136.06	651.02		1035.42	12542.94
32.1	20304085	瓜童（Φ30cm以内）	m3	3.000	3001.10	4414.52		14.18	868.54	497.90		791.66	9587.90
32.2	10114065	醇酸清漆(其他木材面 刷底油、油色 清漆二遍)	m2	264.000	23.58	2.45			3.04	1.74		2.77	33.58
33	020503001001	圆桁(檩) (1)桁条 (2)直径160 (3)清漆二道	m3	3.000	1283.31	2881.76		0.29	486.85	279.02		443.73	5374.96
33.1	20304242	圆木桁条（Φ16cm以内 长4m以内）	m3	3.000	623.07	2813.16		0.29	401.73	230.30		366.17	4434.72
33.2	10114065	醇酸清漆(其他木材面 刷底油、油色 清漆二遍)	m2	84.000	23.58	2.45			3.04	1.74		2.77	33.58
34	010704012001	封檐板 (1)200*30碳化木	m	58.000	43.04	16.52			6.96	3.99		6.35	76.86
34.1	20304417	封檐板（3cm×20cm）	m	58.000	43.04	16.52			6.96	3.99		6.35	76.86
35	020506001001	老角梁、由钺 (1)老钺 (2)130*150 (3)嫩钺 (4)100*120	m3	3.000	2873.58	3332.21		10.48	726.58	416.43		662.24	8021.52
35.1	20304343	老钺木（周长60cm以内）	m3	3.000	2071.86	3248.91		10.48	623.22	357.27		568.06	6879.80
35.2	20304347	嫩钺木（周长55cm以内）	m3		4447.44	2703.47		22.50	838.57	480.72		764.34	9257.04
35.3	10114065	醇酸清漆(其他木材面 刷底油、油色 清漆二遍)	m2	102.000	23.58	2.45			3.04	1.74		2.77	33.58
36	020512003001	栈板(间壁)墙 (1)镶板间壁（厚2cm）（平光）	m2	66.000	96.36	67.39		0.33	19.18	11.00		17.48	211.74
36.1	20304569	镶板间壁（厚2cm）（平光）	m2	66.000	96.36	67.39		0.33	19.18	11.00		17.48	211.74

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第7页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
37	020405004001	斗拱 (1)斗拱（一斗六升 十字型）	座	12.000	518.46	162.58			79.61	45.64		72.57	878.86
37.1	20304381	斗拱（一斗六升 十字型）	座	12.000	518.46	162.58			79.61	45.64		72.57	878.86
38	020405004002	斗拱 (1)斗拱（一斗六升 一字型）	座	6.000	272.51	96.03			43.08	24.70		39.27	475.59
38.1	20304379	斗拱（一斗六升 一字型）	座	6.000	272.51	96.03			43.08	24.70		39.27	475.59
39	AB001	雕刻及其他装饰 (1)雕刻及其他装饰	项	1.000		180000.00			21042.00	12062.52		19179.41	232283.93
39.1	203AB001	雕刻及其他装饰	项	1.000		180000.00			21042.00	12062.52		19179.41	232283.93
拆除工程													
40	011611002001	钢柱拆除 (1)钢柱拆除	t	1.000	266.58			169.67	29.62	27.95		44.44	538.26
40.1	10116114	拆除金属构件(拆除钢柱1t以内)	t	1.000	266.58			169.67	29.62	27.95		44.44	538.26
41	011611001001	钢梁拆除 (1)钢梁拆除	t	1.000	406.93			142.47	37.30	35.20		55.97	677.87
41.1	10116112	拆除金属构件(拆除钢梁1t以内)	t	1.000	406.93			142.47	37.30	35.20		55.97	677.87
42	011607003001	屋面附着层拆除	m2	146.000	10.57			26.41	2.51	2.37		3.77	45.63
42.1	10116071	拆除屋面(拆除金属压型板材屋面 型钢龙骨)	m2	146.000	10.57			26.41	2.51	2.37		3.77	45.63
43	040103002060	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5km	m3	15.000	0.65			24.58	1.71	1.62		2.57	31.13
43.1	40101155	机械装石方(装载机装车 石渣)	m3	15.000	0.47			3.55	0.27	0.26		0.41	4.96
43.2	40101162T	自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距5km以内)	m3	15.000	0.18			21.03	1.44	1.36		2.16	26.17
3. 水泵房立面改造													
装饰													
44	011204003011	块料墙面 (1)240*60*10厚红砖贴片	m2	223.000	80.50	55.87		0.18	9.27	8.75		13.91	168.48
44.1	10112084	外墙面面砖(每块面积≤0.01m2 水泥砂浆粘	m2	223.000	80.50	55.87		0.18	9.27	8.75		13.91	168.48

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第8页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		贴 面砖灰缝5mm)											
45	011201004006	立面砂浆找平层 (1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	275.000	39.08	6.48		0.63	3.14	2.96		4.71	57.00
45.1	10112018T	外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚)	m2	275.000	39.08	6.48		0.63	3.14	2.96		4.71	57.00
46	011406001002	抹灰面油漆涂料 (1)真石漆饰面	m2	52.000	54.18	34.42			6.02	5.68		9.03	109.33
46.1	10114125	调和漆、真石漆、氟碳漆、裂纹漆(真石漆 墙 面)	m2	52.000	54.18	34.42			6.02	5.68		9.03	109.33
47	011502008002	GRC装饰线条 (1)GRC装饰线条	m	199.000	37.31	82.06		0.39	8.13	7.67		12.20	147.76
47.1	10115075	其他装饰线(GRC欧式装饰线 外挂腰线板 宽× 高 ≤400×400)	m	199.000	37.31	82.06		0.39	8.13	7.67		12.20	147.76
48	011502003001	石材装饰线 (1)石材装饰线(砂浆粘贴 宽度 ≤150mm)	m	132.000	28.45	52.60		0.10	5.51	5.20		8.27	100.13
48.1	10115050	石材装饰线(砂浆粘贴 宽度 ≤150mm)	m	132.000	28.45	52.60		0.10	5.51	5.20		8.27	100.13
49	011605002001	立面块料拆除 (1)拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合 层)	m2	223.000	29.24				1.99	1.87		2.98	36.08
49.1	10116049	拆除墙面装饰层(拆除墙面块料层 含结合层)	m2	223.000	29.24				1.99	1.87		2.98	36.08
50	011604002002	立面抹灰层拆除 (1)拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合 砂浆面)	m2	275.000	15.12				1.03	0.97		1.54	18.66
50.1	10116046	拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆 面)	m2	275.000	15.12				1.03	0.97		1.54	18.66
51	010103002010	余方弃置 (1)弃渣 (2)投标人自行考虑	m3	23.000	0.53			15.14	1.06	1.00		1.60	19.33
51.1	10101075	机械装土方(装载机装土方)	m3	23.000	0.35			2.30	0.18	0.17		0.27	3.27
51.2	10101086T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距5km以内)	m3	23.000	0.18			12.84	0.88	0.83		1.33	16.06

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第9页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
环库绿化景观提升													
1. 移民文化广场绿化提升													
园林建筑													
52	050201001019	园路 (1)600*200*30厚芝麻白荔枝面压边 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%	m2	20.000	103.88	186.70		1.21	18.56	18.62		29.61	358.58
52.1	50103048T	600*200*30厚芝麻白荔枝面压边	m2	20.000	69.57	104.19		0.88	11.11	11.15		17.72	214.62
52.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	2.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
52.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	6.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
52.4	50103001	园路土基整理路床	m2	20.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
53	050201001020	园路 (1)1000*500*30厚芝麻白荔枝面、 1000*500*30厚芝麻黑烧面 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%	m2	48.000	103.60	186.94		1.21	18.56	18.62		29.61	358.53
53.1	50103048T	600*200*30厚芝麻白荔枝面压边	m2	48.000	69.57	104.19		0.88	11.11	11.15		17.72	214.62
53.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	5.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
53.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	14.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
53.4	50103001	园路土基整理路床	m2	48.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
54	050201001021	园路 (1)800*400*30厚芝麻白荔枝面 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层	m2	88.000	90.26	160.13		1.41	16.02	16.06		25.56	309.43

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(6)素土夯实，夯实度≥93%											
54.1	50103036T	900*300*30厚芝麻白荔枝面/芝麻黑烧面齐缝铺	m2	88.000	66.06	100.16		1.19	10.65	10.68		16.99	205.73
54.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	9.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
54.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	13.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
54.4	50103001	园路路基整理路床	m2	88.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
55	050201001022	园路 (1)边长200~600 30厚芝麻白荔枝面碎拼 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%	m2	22.000	100.05	196.78		0.91	18.93	19.00		30.21	365.88
55.1	50103045T	边长200~400 50厚毛石碎拼	m2	22.000	77.39	142.70		0.71	14.04	14.09		22.40	271.33
55.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	2.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
55.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	3.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
55.4	50103001	园路路基整理路床	m2	22.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
56	011107001004	石材台阶面 (1)600*330*70厚芝麻白荔枝面踏面、 600*300*70厚芝麻白荔枝面踏面 (2)600*110*25厚芝麻白荔枝面踢面 (3)5厚纯水泥膏一道 (4)30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 (5)120厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实（夯实度≥93%）	m2	23.000	209.98	331.26		8.90	34.99	35.10		55.82	676.05
56.1	50103078T	台阶(花岗岩)	m2	23.000	112.33	253.89		8.17	23.81	23.89		37.99	460.08
56.2	50103074T	C20台阶(预拌非泵送普通混凝土)	m3	3.000	667.79	434.19		4.98	70.40	70.64		112.32	1360.32
56.3	50103005T	垫层(碎石)	m3	3.000	25.13	158.95		0.60	11.75	11.79		18.74	226.96
56.4	50103001	园路路基整理路床	m2	23.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
57	050201015003	栈道	m2	30.000	128.82	412.91	42.93	8.54	32.26	32.37		55.35	670.26

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第11页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(1)面层材料种类:140宽25厚拉丝重竹木, 离缝宽5mm，专用不锈钢卡扣固定；20mm厚侧封板 (2)支架材料种类:60mm长L50*5mm厚热镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 (3)□50*50*5mm厚热镀锌矩形钢管 (4)10mm厚橡胶垫 (5)100mm厚C20混凝土墩 (6)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (7)100mm厚C20混凝土垫层 (8)150mm厚碎石灌砂垫层 (9)素土夯实，夯实程度≥93%											
57.1	50103055T	木（仿木）面层(木板地面满铺 厚100mm)	m2	33.000	28.75	182.72		1.11	13.52	13.57		21.57	261.24
57.2	10303027T	屋面(封檐板安装 高度≤20m)	m		10.93	36.44			3.01	3.02		4.81	58.21
57.3	50103058T	木（仿木）面层(钢 梁、龙骨)	t	0.630	2985.16	5168.98		319.96	538.95	540.78		859.84	10413.67
57.4	05B001T	橡胶垫	个	161.000		8.00	8.00					0.72	8.72
57.5	10111002T	水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 15mm厚) 未编制项目	m2	25.000	13.72	4.21		0.47	1.17	1.17		1.87	22.61
57.6	40305004T	C20基础(预拌非泵送普通混凝土)	m3		50.97	356.89			25.94	26.03		41.38	501.21
57.7	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	3.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
57.8	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	4.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
57.9	50103001	园路土基整理路床	m2	30.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
58	05B060	玻璃钢坐凳 (1)玻璃钢坐凳	个	3.000		1500.00			95.40	95.72		152.20	1843.32
58.1	05B001	玻璃钢坐凳	个	3.000		1500.00			95.40	95.72		152.20	1843.32
59	05B061	高低杆 (1)高低杆	个	2.000		1200.00			76.32	76.58		121.76	1474.66
59.1	05B001T	高低杆	个	2.000		1200.00			76.32	76.58		121.76	1474.66
60	05B062	成品漫步机 (1)成品漫步机	个	2.000		1500.00			95.40	95.72		152.20	1843.32
60.1	05B001T	成品漫步机	个	2.000		1500.00			95.40	95.72		152.20	1843.32

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第12页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
61	05B063	肩关节康复器 (1)肩关节康复器	个	2.000		1800.00			114.48	114.87		182.64	2211.99
61.1	05B001T	肩关节康复器	个	2.000		1800.00			114.48	114.87		182.64	2211.99
62	011605001001	平面块料拆除 (1)台阶拆除	m2	35.000	10.48				0.67	0.67		1.06	12.88
62.1	10116041	拆除地面装饰层(拆除石材面层 含结合层)	m2	35.000	10.48				0.67	0.67		1.06	12.88
63	050307016001	花池 (1)600*300*50厚黄金麻荔枝面压顶 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)600*400*30厚黄金麻菠萝面工字铺 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌砂垫层 (7)素土夯实, 夯实度≥93%	m3	17.000	934.85	2220.31		7.90	201.18	201.84		320.96	3887.05
63.1	10111121T	600*300*50厚黄金麻荔枝面压顶	m2	42.000	98.79	303.70		0.45	25.63	25.71		40.89	495.17
63.2	10104001	实心砖墙(实心标准砖墙)	m3	17.000	323.53	239.48		4.66	36.10	36.23		57.60	697.60
63.3	10112193T	600*400*30厚黄金麻菠萝面工字铺	m2	39.000	96.88	310.54		0.11	25.92	26.01		41.35	500.81
63.4	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	17.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
63.5	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	17.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
63.6	50103001	园路土基整理路床	m2	22.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
64	05B083	看台 (1)140宽20厚浅碳平面型户外高耐竹木板, 离缝宽5mm (2)800*400*30厚芝麻白荔枝面 (3)白色进口PVDF膜材, 厚0.9mm (4)腹板5mm翼板6mm厚异形H型钢 (5)Φ200 5厚热镀锌钢管 白色氟碳漆饰面 (6)Φ240 10厚热镀锌钢管 白色氟碳漆饰面 (7)1000*330*70厚芝麻白荔枝面踏面 (8)1000*150*25厚芝麻白荔枝面踢面	m2	134.000	399.41	719.29		21.74	72.54	72.77		115.72	1401.47
64.1	10109035T	膜结构屋面	m2	172.000	147.43	141.34			18.37	18.43		29.30	354.87
64.2	10106016	其他(附墙钢骨架制作、安装)	t	3.380	2097.92	5738.04		522.03	531.57	533.37		848.06	10270.99

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第13页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
64.3	10111036T	800*400*30厚芝麻白荔枝面	m2	77.000	49.82	101.97		0.55	9.69	9.72		15.46	187.21
64.4	10111085T	140宽20厚浅碳平面型户外高耐竹木板,离缝宽5mm	m2	57.000	12.39	133.83			9.30	9.33		14.84	179.69
64.5	50103078T	台阶(花岗岩)	m2	134.000	112.33	253.89		8.17	23.81	23.89		37.99	460.08
64.6	50103005T	垫层(碎石)	m3	20.000	25.13	158.95		0.60	11.75	11.79		18.74	226.96
64.7	50103001	园路路基整理路床	m2	134.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
绿化种植													
65	050102001001	栽植乔木 (1)小叶榄仁 (2)胸径13-14cm (3)高度:7.5m,冠幅:2m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)分层明显,具5层平展大枝以上,全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	25.000	144.93	1583.45		36.96	112.32	112.69		179.23	2169.58
65.1	50101083	栽植乔木(带土球) 土球直径70cm以内	株	25.000	37.44	0.38		14.10	3.30	3.31		5.27	63.80
65.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗(含容器苗、袋装苗)成活养护期半年日常养护期半年	株	25.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
65.3	501BC001T	小叶榄仁 胸径13-14cm, H:7.5m, P: 2m 分层明显,具5层平展大枝以上,全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美	株	25.000		1560.00			99.22	99.55		158.29	1917.06
65.4	501BC001	基肥	kg	500.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
66	050102001002	栽植乔木 (1)南洋楹 (2)胸径19-20cm (3)高度:5.5m,冠幅:3m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	34.000	206.71	1823.97		64.47	133.29	133.74		212.69	2574.87

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第14页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
66.1	50101085	栽植乔木（带土球） 土球直径100cm以内	株	34.000	99.22	0.90		41.61	9.01	9.04		14.38	174.16
66.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	34.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
66.3	501BC001T	南洋楹 胸径19-20cm，H:5.5m，P: 3m 全冠 假植苗，冠幅饱满，树型优美	株	34.000		1800.00			114.48	114.87		182.64	2211.99
66.4	501BC001	基肥	kg	680.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
67	050102001003	栽植乔木 (1)木棉 (2)腹径30-35 (3)高度:5m，冠幅：3m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)全冠假植苗，3级以上分枝，冠幅饱满，树型 优美 (7)20kg/株	株	5.000	206.71	1623.97		64.47	120.57	120.98		192.40	2329.10
67.1	50101085	栽植乔木（带土球） 土球直径100cm以内	株	5.000	99.22	0.90		41.61	9.01	9.04		14.38	174.16
67.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	5.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
67.3	501BC001T	木棉 腹径30-35，H:5m，P: 3m 全冠假植 苗，3级以上分枝，冠幅饱满，树型优美	株	5.000		1600.00			101.76	102.11		162.35	1966.22
67.4	501BC001	基肥	kg	100.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
68	050102001004	栽植乔木 (1)宫粉紫荆 (2)胸径13-14cm (3)高度:4.5m，冠幅：2m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)全冠假植苗，3级以上分枝，冠幅饱满，树型 优美 (7)20kg/株	株	14.000	144.93	1423.45		36.96	102.14	102.48		162.99	1972.95
68.1	50101083	栽植乔木（带土球） 土球直径70cm以内	株	14.000	37.44	0.38		14.10	3.30	3.31		5.27	63.80

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第15页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
68.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗 (含容器苗、袋装苗)成活养护期半年日常养 护期半年	株	14.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
68.3	501BC001T	宫粉紫荆 胸径13-14cm, H:4.5m, P: 2m 全 冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美	株	14.000		1400.00			89.04	89.34		142.05	1720.43
68.4	501BC001	基肥	kg	280.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
69	050102001005	栽植乔木 (1)蓝花楹 (2)胸径15-16cm (3)高度:3.8m, 冠幅: 1.5m (4)带土球 (5)成活养护半年, 日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型 优美 (7)20kg/株	株	26.000	206.71	1489.97		64.47	112.05	112.42		178.80	2164.42
69.1	50101085	栽植乔木(带土球) 土球直径100cm以内	株	26.000	99.22	0.90		41.61	9.01	9.04		14.38	174.16
69.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗 (含容器苗、袋装苗)成活养护期半年日常养 护期半年	株	26.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
69.3	501BC001T	蓝花楹 胸径15-16cm, H:3.8m, P: 1.5m 全 冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美	株	26.000		1466.00			93.24	93.55		148.75	1801.54
69.4	501BC001	基肥	kg	520.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
70	050102001006	栽植乔木 (1)香樟 (2)胸径15-17cm (3)高度:3.5m, 冠幅: 2.8m (4)带土球 (5)成活养护半年, 日常养护半年 (6)枝下高1.8-2米,全冠假植苗,3级以上分枝, 树型优美 (7)20kg/株	株	8.000	206.71	1823.97		64.47	133.29	133.74		212.69	2574.87

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第16页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
70.1	50101085	栽植乔木（带土球） 土球直径100cm以内	株	8.000	99.22	0.90		41.61	9.01	9.04		14.38	174.16
70.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	8.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
70.3	501BC001T	香樟 胸径15-17cm，H:3.5m，P: 2.8m 枝下 高1.8-2米，全冠假植苗，3级以上分枝，树型优 美	株	8.000		1800.00			114.48	114.87		182.64	2211.99
70.4	501BC001	基肥	kg	160.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
71	050102001007	栽植乔木 (1)黄花风铃木 (2)胸径13-14cm (3)高度:3m，冠幅：2m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)分层明显，具5层平展大枝以上，全冠假植 苗，3级以上分枝，冠幅饱满，树型优美 (7)20kg/株	株	25.000	155.69	1321.78		33.65	96.15	96.47		153.44	1857.18
71.1	50101083	栽植乔木（带土球） 土球直径70cm以内	株	25.000	37.44	0.38		14.10	3.30	3.31		5.27	63.80
71.2	50102014T	单排、独立落叶乔木 米径20cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	25.000	118.25	12.60		19.55	9.57	9.60		15.26	184.83
71.3	501BC001T	黄花风铃木 胸径13-14cm，H:3m，P: 2m 分 层明显，具5层平展大枝以上，全冠假植苗，3级 以上分枝，冠幅饱满，树型优美	株	25.000		1300.00			82.68	82.96		131.91	1597.55
71.4	501BC001	基肥	kg	500.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
72	050102001008	栽植乔木 (1)日本晚樱 (2)胸径8-9cm (3)高度:2.5-3m，冠幅：1.5m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)多花，全冠假植苗，3级以上分枝，冠幅饱满， 树型优美	株	49.000	83.29	1211.66		9.35	82.98	83.26		132.39	1602.93

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(7)10kg/株											
72.1	50101081	栽植乔木（带土球） 土球直径50cm以内	株	49.000	18.72	0.23			1.21	1.21		1.92	23.29
72.2	50102013T	单排、独立落叶乔木 米径10cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	49.000	64.57	7.03		9.35	5.15	5.17		8.21	99.48
72.3	501BC001T	日本晚樱 胸径8-9cm，H:2.5-3m，P: 1.5m 多花,全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树 型优美	株	49.000		1200.00			76.32	76.58		121.76	1474.66
72.4	501BC001	基肥	kg	490.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
73	050102001009	栽植乔木 (1)造型红花继木桩景 (2)胸径12-13cm (3)高度:2.5-3m，冠幅：2.5-3m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)特选,偏冠,造型飘逸,高度冠幅为准,全冠 假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	3.000	155.69	4517.38		33.65	299.37	300.38		477.63	5784.10
73.1	50101083	栽植乔木（带土球） 土球直径70cm以内	株	3.000	37.44	0.38		14.10	3.30	3.31		5.27	63.80
73.2	50102014T	单排、独立落叶乔木 米径20cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	3.000	118.25	12.60		19.55	9.57	9.60		15.26	184.83
73.3	501BC001T	造型红花继木桩景 胸径12-13cm，H:2.5- 3m，P: 2.5-3m 特选,偏冠,造型飘逸,高度冠 幅为准,全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美	株	3.000		4500.00			286.20	287.17		456.60	5529.97
73.4	501BC001	基肥	kg	30.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
74	050102001010	栽植乔木 (1)造型罗汉松飘 (2)胸径14-15cm (3)高度:2.5-3m，冠幅：3-3.5m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)特选,偏冠,造型飘逸,高度冠幅为准,全冠	株	3.000	169.89	5819.12		44.01	383.72	385.02		612.20	7413.96

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第18页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株											
74.1	50101084	栽植乔木(带土球) 土球直径80cm以内	株	3.000	62.40	0.45		21.15	5.34	5.36		8.52	103.22
74.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗 (含容器苗、袋装苗)成活养护期半年日常养 护期半年	株	3.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
74.3	501BC001T	造型罗汉松飘 胸径14-15cm, H:2.5-3m, P: 3-3.5m 特选,偏冠,造型飘逸,高度冠幅为准, 全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美	株	3.000		5800.00			368.88	370.13		588.51	7127.52
74.4	501BC001	基肥	kg	30.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
75	050102002001	栽植灌木 (1)同安红三角梅 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 120-150cm (5)P: 80cm (6)盆苗,以高度冠幅为准,全冠,冠幅饱满,树 型优美 (7)10kg/株	株	2.000	27.07	289.26		2.84	20.32	20.39		32.44	392.32
75.1	50101117	栽植灌木(带土球) 土球直径40cm以内	株	2.000	13.36	0.15			0.86	0.86		1.37	16.60
75.2	50102071T	常绿灌木 高度150cm以内 假植苗(含容器苗 、袋装苗)成活养护期半年日常养护期半年	株	2.000	13.71	4.71		2.84	1.35	1.36		2.16	26.13
75.3	501EB001	同安红三角梅 H: 120-150cm, P: 80cm	株	2.000		280.00			17.81	17.87		28.41	344.09
75.4	501BC001	基肥	kg	20.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
76	050102002002	栽植灌木 (1)龟甲冬青球A (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 120-150cm (5)P: 80cm (6)球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	6.000	32.41	128.56		2.77	10.43	10.47		16.67	201.31

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第19页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
76.1	50101118	栽植灌木（带土球） 土球直径50cm以内	株	6.000	20.80	0.23			1.34	1.34		2.13	25.84
76.2	50102103T	球形植物 蓬径100cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	6.000	11.61	3.93		2.77	1.16	1.17		1.86	22.50
76.3	501EB001T	龟甲冬青球A H：80-100cm，P：100cm 球型，不脱脚，冠幅饱满不偏冠，袋苗	株	6.000		120.00			7.63	7.66		12.18	147.47
76.4	501BC001	基肥	kg	60.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
77	050102002003	栽植灌木 (1)龟甲冬青球B (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：80cm (5)P：80cm (6)球型，不脱脚，冠幅饱满不偏冠，袋苗 (7)10kg/株	株	1.000	24.97	108.48		2.77	8.68	8.71		13.88	167.49
77.1	50101117	栽植灌木（带土球） 土球直径40cm以内	株	1.000	13.36	0.15			0.86	0.86		1.37	16.60
77.2	50102103T	球形植物 蓬径100cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	1.000	11.61	3.93		2.77	1.16	1.17		1.86	22.50
77.3	501EB001T	龟甲冬青球A H：80cm，P：80cm 球型，不脱脚，冠幅饱满不偏冠，袋苗	株	1.000		100.00			6.36	6.38		10.15	122.89
77.4	501BC001	基肥	kg	10.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
78	050102007001	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)64株/m2 (3)小兔狼尾草 (4)H:40cm，P：15cm (5)5kg/m2	m2	36.000	12.43	77.04		3.28	5.91	5.93		9.44	114.03
78.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	36.000		70.53			4.49	4.50		7.16	86.68
78.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	36.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
78.3	501BC001	基肥	kg	180.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
79	050102007002	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年	m2	52.000	12.43	76.74		3.28	5.89	5.91		9.41	113.66

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第20页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(2)49株/m2 (3)银边山菅兰 (4)H:35cm，P：15cm (5)5kg/m2											
79.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	52.000		70.23			4.47	4.48		7.13	86.31
79.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	52.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
79.3	501BC001	基肥	kg	260.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
80	050102007003	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)49株/m2 (3)红背桂 (4)H:35cm，P：20cm (5)5kg/m2	m2	60.000	12.43	71.84		3.28	5.57	5.60		8.91	107.63
80.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	60.000		65.33			4.15	4.17		6.63	80.28
80.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	60.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
80.3	501BC001	基肥	kg	300.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
81	050102007004	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)64株/m2 (3)紫花翠芦莉 (4)H:30cm，P：15cm (5)5kg/m2	m2	201.000	12.43	70.64		3.28	5.50	5.52		8.79	106.16
81.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	201.000		64.13			4.08	4.09		6.51	78.81
81.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	201.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
81.3	501BC001	基肥	kg	1005.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
82	050102007005	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)36盆/m2 (3)红花三角梅	m2	100.000	12.43	178.64		3.28	12.37	12.41		19.75	238.88

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第21页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(4)H:30cm, P: 20cm (5)5kg/m2											
82.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	100.000		172.13			10.95	10.98		17.47	211.53
82.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	100.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
82.3	501BC001	基肥	kg	500.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
83	050102007006	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)49株/m2 (3)花叶鹅掌柴 (4)H:25cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	46.000	12.43	71.84		3.28	5.57	5.60		8.91	107.63
83.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	46.000		65.33			4.15	4.17		6.63	80.28
83.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	46.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
83.3	501BC001	基肥	kg	230.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
84	050102007007	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)64株/m2 (3)肾蕨 (4)H:25cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	11.000	12.43	96.24		3.28	7.13	7.16		11.39	137.63
84.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	11.000		89.73			5.71	5.73		9.11	110.28
84.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	11.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
84.3	501BC001	基肥	kg	55.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
85	050102007008	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)64株/m2 (3)毛杜鹃 (4)H:20cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	72.000	12.43	77.04		3.28	5.91	5.93		9.44	114.03

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第22页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
85.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	72.000		70.53			4.49	4.50		7.16	86.68
85.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	72.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
85.3	501BC001	基肥	kg	360.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
86	050102007009	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)64株/m2 (3)大花芦莉 (4)H:20cm，P: 15cm (5)5kg/m2	m2	37.000	12.43	89.84		3.28	6.72	6.75		10.74	129.76
86.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	37.000		83.33			5.30	5.32		8.46	102.41
86.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	37.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
86.3	501BC001	基肥	kg	185.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
87	050102007010	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)81株/m2 (3)紫鸭跖草 (4)H:20cm，P: 15cm (5)5kg/m2	m2	31.000	12.43	77.84		3.28	5.96	5.98		9.52	115.01
87.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	31.000		71.33			4.54	4.55		7.24	87.66
87.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	31.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
87.3	501BC001	基肥	kg	155.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
88	050102007011	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)120株/m2 (3)麦冬 (4)H:10cm，P: 10cm (5)5kg/m2	m2	1017.000	12.43	85.04		3.28	6.41	6.44		10.25	123.85
88.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	1017.000		78.53			4.99	5.01		7.97	96.50
88.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年	m2	1017.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第23页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		日常养护期半年											
88.3	501BC001	基肥	kg	5085.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
89	050102012002	铺种草皮 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)马尼拉草卷 (3)满铺 (4)5kg/m2	m2	2397.000	10.15	15.93		2.25	1.81	1.82		2.90	34.86
89.1	50101162T	草皮类(铺植草皮 满铺)	m2	2397.000	1.87	11.70			0.86	0.87		1.38	16.68
89.2	50102121T	草坪类(草坪 满铺) 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	m2	2397.000	8.28	2.03		2.25	0.80	0.80		1.27	15.43
89.3	501BC001	基肥	kg	11985.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
90	050101010002	整理绿化用地 (1)绿地整理(整理绿化地) 客土回填	m2	4060.000	2.86			0.59	0.22	0.22		0.35	4.24
90.1	50101001T	绿地整理(整理绿化地) 客土回填	m2	4060.000	2.86			0.59	0.22	0.22		0.35	4.24
91	050101009002	种植土回(换)填 (1)符合设计要求 (2)30cm	m3	1218.000	0.41	31.80		4.11	2.31	2.32		3.69	44.64
91.1	50101002T	绿地整理(回填土)	m3	1218.000	0.41	31.80		4.11	2.31	2.32		3.69	44.64
92	040101001001	挖一般土方 (1)一、二类土 (2)2m以内	m3	5468.000	0.40			3.06	0.22	0.22		0.35	4.25
92.1	40101051	挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 一、二类土)	m3	5468.000	0.40			3.06	0.22	0.22		0.35	4.25
93	040103002047	余方弃置 (1)清杂草、砾石等,按0.3m深度计 (2)自行考虑	m3	5468.000	0.18			12.83	0.83	0.83		1.32	15.99
93.1	40101091T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距5km以内)	m3	5468.000	0.18			12.83	0.83	0.83		1.32	15.99
给水工程													
94	040101002016	挖沟槽土方 (1)三类土	m3	63.000	2.86			2.88	0.55	0.38		0.60	7.28

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第24页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(2)2m以内											
94.1	40101008T	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%	m3	3.000	52.11				5.05	3.43		5.45	66.04
94.2	40101055	挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土)	m3	60.000	0.40			3.02	0.33	0.23		0.36	4.34
95	040103001025	填方 (1)符合设计要求 (2)机制砂 (3)符合设计要求	m3	18.000	2.12	80.08		1.82	8.14	5.53		8.79	106.48
95.1	40101108T	槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实)	m3	18.000	2.12	80.08		1.82	8.14	5.53		8.79	106.48
96	040103001026	填方 (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求	m3	28.000	2.62	0.36		3.71	0.65	0.44		0.70	8.48
96.1	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填碾压)	m3	28.000	2.62	0.36		3.71	0.65	0.44		0.70	8.48
97	010103002008	余方弃置 (1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m3	31.000	0.18			20.99	2.05	1.39		2.21	26.82
97.1	10101086T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内)	m3	31.000	0.18			20.99	2.05	1.39		2.21	26.82
98	031001006012	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN25 (3)1.25Mpa	m	24.000	6.47	4.82		0.01	1.09	0.74		1.18	14.31
98.1	31001237T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内	m	24.000	6.47	4.82		0.01	1.09	0.74		1.18	14.31
99	031001006013	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN32 (3)1.25Mpa	m	77.000	6.47	5.69		0.01	1.18	0.80		1.27	15.42
99.1	31001237T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内	m	77.000	6.47	5.69		0.01	1.18	0.80		1.27	15.42
100	031001006014	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN40	m	5.000	7.14	7.63		0.01	1.43	0.97		1.55	18.73

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第25页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(3)1. 25Mpa											
100.1	31001238T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内	m	5.000	7.14	7.63		0.01	1.43	0.97		1.55	18.73
101	031001006015	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN50 (3)1. 25Mpa	m	65.000	7.77	11.25		0.02	1.84	1.25		1.99	24.12
101.1	31001239T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内	m	65.000	7.77	11.25		0.02	1.84	1.25		1.99	24.12
102	031001006016	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN63 (3)1. 25Mpa	m	95.000	8.53	17.59		0.02	2.53	1.72		2.74	33.13
102.1	31001240T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内	m	95.000	8.53	17.59		0.02	2.53	1.72		2.74	33.13
103	040504001006	砌筑井 (1)C15混凝土垫层 (2)C25现浇底板 (3)C25预拌非泵送细石混凝土盖板 (4)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (5)预制混凝土(圆钢筋 Φ10以外) (6)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (7)井盖、井箅安装(安全防坠网) (8)井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) (9)05S502 16页	座	1.000	921.38	2002.57		19.68	285.26	193.73		308.04	3730.65
103.1	40501005T	C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3		175.37	330.12		0.70	49.05	33.31		52.97	641.52
103.2	40501005T	C25预拌非泵送普通混凝土现浇底板	m3	1.000	175.37	366.30		0.70	52.56	35.70		56.76	687.39
103.3	40501104T	C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)	m3		327.83	487.53		0.32	79.04	53.68		85.36	1033.76
103.4	40501114	安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内))	m3		115.85	18.94		22.19	15.21	10.33		16.43	198.95
103.5	40501007	砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)	m3	3.000	209.71	303.90		4.21	50.18	34.08		54.19	656.27
103.6	40304007T	现浇混凝土(螺旋钢筋 Φ10以外)	t	0.060	598.45	3497.49		61.88	402.89	273.64		435.09	5269.44
103.7	40304002	预制混凝土(圆钢筋 Φ10以外)	t		701.64	3687.33		92.55	434.26	294.95		468.97	5679.70

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第26页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
103.8	40304003T	预制混凝土(螺纹钢筋 φ10以外)	t	0.040	578.95	3507.25		65.86	402.33	273.26		434.49	5262.14
103.9	40501039T	井盖、井算安装(检查井井盖、座 普通铸铁)	套	1.000	51.39	374.43			41.26	28.02		44.56	539.66
103.10	40501045	井盖、井算安装(塑钢爬梯踏步)	步	3.000	2.14				0.21	0.14		0.22	2.71
104	031003013001	水表 (1)水表组(闸阀 DN80 2个, 水表LXS-80 1个, 防止倒流器 DN80 1个)	组/个	1.000	253.58	1668.83		9.26	187.18	127.13		202.14	2448.12
104.1	31005324T	水表组(水表1个、蝶阀2个、止回阀1个、伸缩接头1个)	组	1.000	253.58	1668.83		9.26	187.18	127.13		202.14	2448.12
105	031003001003	螺纹阀门 (1)截止阀 DN50	个	6.000	31.85	184.53		2.09	21.17	14.38		22.86	276.88
105.1	31005006T	闸阀 DN50	个	6.000	31.85	184.53		2.09	21.17	14.38		22.86	276.88
106	031003001004	螺纹阀门 (1)快速取水阀DN25 (2)C20基础 (3)卵石透水层	个	8.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
106.1	31005489T	喷泉喷头(普通喷头 洒水栓 DN25)	个	8.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
106.2	40305004T	C20基础(预拌非泵送普通混凝土)	m3		50.97	356.88			39.52	26.84		42.68	516.89
106.3	40106002T	滤沟、滤层(砂滤层)	m3		21.89	108.31			12.62	8.57		13.63	165.02
107	030901003004	水喷淋(雾)喷头 (1)水喷淋(雾)喷头	个	3.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
107.1	31005489T	喷泉喷头(普通喷头 洒水栓 DN25)	个	3.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
2. 移民文化广场入口提升													
园林建筑													
108	050201001028	园路 (1)600*300*80厚芝麻白荔枝面工字铺 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实, 夯实度≥93%	m2	177.000	121.73	244.40		1.52	23.38	23.46		37.31	451.80

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第27页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
108.1	50103038T	600*300*80厚芝麻白荔枝面工字铺	m2	177.000	87.34	161.36		1.19	15.89	15.95		25.36	307.09
108.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	18.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
108.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	53.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
108.4	50103001	园路路基整理路床	m2	177.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
109	050201001027	园路 (1)600*300*80厚芝麻黑烧面压边 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实, 夯实度≥93%	m2	44.000	125.33	267.49		1.20	25.06	25.14		39.98	484.19
109.1	50103050T	600*300*80厚芝麻黑烧面压边	m2	44.000	91.95	188.99		0.88	17.92	17.98		28.59	346.31
109.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	4.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
109.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	13.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
109.4	50103001	园路路基整理路床	m2	44.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
110	011107001005	石材台阶面 (1)600*330*70厚芝麻白荔枝面踏面、 600*300*70厚芝麻白荔枝面踏面 (2)600*150*25厚芝麻白荔枝面踢面 (3)5厚纯水泥膏一道 (4)30厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层 (5)120厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实 (夯实度≥93%)	m2	16.000	206.22	328.03		8.87	34.54	34.65		55.11	667.42
110.1	50103078T	台阶(花岗岩)	m2	16.000	112.33	253.89		8.17	23.81	23.89		37.99	460.08
110.2	50103074T	C20台阶(预拌非泵送普通混凝土)	m3	2.000	667.79	434.19		4.98	70.40	70.64		112.32	1360.32
110.3	50103005T	垫层(碎石)	m3	2.000	25.13	158.95		0.60	11.75	11.79		18.74	226.96
110.4	50103001	园路路基整理路床	m2	16.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
111	050307016002	花池 (1)600*300*50厚黄金麻荔枝面压顶 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖	m3	21.000	925.21	2190.16		7.88	198.65	199.30		316.92	3838.12

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)600*400*30厚黄金麻菠萝面工字铺 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌砂垫层 (7)素土夯实, 夯实度≥93%											
111.1	10111121T	600*300*50厚黄金麻荔枝面压顶	m2	51.000	98.79	303.70		0.45	25.63	25.71		40.89	495.17
111.2	10104001	实心砖墙(实心标准砖墙)	m3	21.000	323.53	239.48		4.66	36.10	36.23		57.60	697.60
111.3	10112193T	600*400*30厚黄金麻菠萝面工字铺	m2	47.000	96.88	310.54		0.11	25.92	26.01		41.35	500.81
111.4	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	21.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
111.5	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	21.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
111.6	50103001	园路土基整理路床	m2	27.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
112	020202003002	栏杆 (1)Φ32 3厚热镀锌钢管,白色氟碳漆饰面 (2)Φ60 5厚热镀锌钢管,白色氟碳漆饰面 (3)Φ60 5厚热镀锌钢管,白色氟碳漆饰面	m	26.000	68.43	184.45		2.31	16.23	16.29		25.89	313.60
112.1	10115099	钢管栏杆(钢管扶手)	m	26.000	68.43	184.45		2.31	16.23	16.29		25.89	313.60
113	05B072	核心价值观小品 (1)2mm厚热镀锌钢板,红色氟碳漆 (2)白色氟碳漆 (3)□120*100*3.0厚热镀锌钢管,红色氟碳漆 (4)□120*80*3.0厚热镀锌钢管,红色氟碳漆 (5)2mm厚热镀锌钢板,红色氟碳漆 (6)白色氟碳漆 (7)□120*100*3.0厚热镀锌钢管,红色氟碳漆 (8)□120*80*3.0厚热镀锌钢管,红色氟碳漆 (9)黄色氟碳漆 (10)□120*80*5.0厚热镀锌钢管,红色氟碳漆 (11)2mm厚热镀锌钢板,红色氟碳漆	个	3.000		28000.00			1780.80	1786.85		2841.09	34408.74
113.1	05B001T	核心价值观小品	个	3.000		28000.00			1780.80	1786.85		2841.09	34408.74

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第29页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
114	050304005001	仿竹篱笆 (1)仿竹篱笆	m	58.000		200.00			12.72	12.76		20.29	245.77
114.1	01B001T	仿竹篱笆	m	58.000		200.00			12.72	12.76		20.29	245.77
115	041001002002	拆除人行道 (1)材质:透水砖 (2)厚度:8cm	m2	218.000	2.81				0.18	0.18		0.29	3.46
115.1	40104022	拆除人行道(普通粘土砖 平铺)	m2	218.000	2.81				0.18	0.18		0.29	3.46
116	041001003046	拆除基层 (1)材质:透水砼 (2)厚度:10cm (3)部位:垫层	m2	218.000	8.85	0.03		1.31	0.65	0.65		1.03	12.52
116.1	40104019	拆除人行道(现浇混凝土面(垫)层 厚10cm以内)	m2	218.000	8.85	0.03		1.31	0.65	0.65		1.03	12.52
117	041001003047	拆除基层 (1)材质:级配碎石 (2)厚度:15cm (3)部位:基层	m2	218.000	0.14			2.89	0.19	0.19		0.31	3.72
117.1	40101153T	挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路	m3	33.000	0.95			19.07	1.27	1.28		2.03	24.60
118	040103002059	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5km	m3	78.000	0.65			24.58	1.61	1.61		2.56	31.01
118.1	40101155	机械装石方(装载机装车 石渣)	m3	78.000	0.47			3.55	0.26	0.26		0.41	4.95
118.2	40101162T	自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距5km以内)	m3	78.000	0.18			21.03	1.35	1.35		2.15	26.06
119	011609001001	栏杆、栏板拆除 (1)拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除金属栏杆)	m	20.000	16.78				1.07	1.07		1.70	20.62
119.1	10116090	拆除栏杆栏板、轻质隔断隔墙(拆除金属栏杆)	m	20.000	16.78				1.07	1.07		1.70	20.62
给水工程													
120	040101002024	挖沟槽土方 (1)三类土	m3	37.000	3.20			2.86	0.59	0.40		0.64	7.68

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第30页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(2)2m以内											
120.1	40101008T	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%	m3	2.000	52.11				5.05	3.43		5.45	66.04
120.2	40101055	挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土)	m3	35.000	0.40			3.02	0.33	0.23		0.36	4.34
121	040103001039	填方 (1)符合设计要求 (2)机制砂 (3)符合设计要求	m3	17.000	2.12	80.08		1.82	8.14	5.53		8.79	106.48
121.1	40101108T	槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实)	m3	17.000	2.12	80.08		1.82	8.14	5.53		8.79	106.48
122	040103001040	填方 (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求	m3	21.000	2.62	0.36		3.71	0.65	0.44		0.70	8.48
122.1	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填碾压)	m3	21.000	2.62	0.36		3.71	0.65	0.44		0.70	8.48
123	031001006034	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN25 (3)1.25Mpa	m	91.000	6.47	4.82		0.01	1.09	0.74		1.18	14.31
123.1	31001237T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内	m	91.000	6.47	4.82		0.01	1.09	0.74		1.18	14.31
124	031001006035	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN32 (3)1.25Mpa	m	67.000	6.47	5.69		0.01	1.18	0.80		1.27	15.42
124.1	31001237T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内	m	67.000	6.47	5.69		0.01	1.18	0.80		1.27	15.42
125	031001006036	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN40 (3)1.25Mpa	m	116.000	7.14	7.63		0.01	1.43	0.97		1.55	18.73
125.1	31001238T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内	m	116.000	7.14	7.63		0.01	1.43	0.97		1.55	18.73
126	040504001018	砌筑井 (1)C15混凝土垫层	座	1.000	921.38	2002.57		19.68	285.26	193.73		308.04	3730.65

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第31页 共91页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第32页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
园林建筑													
129	050201001004	园路 (1)双丙聚氨酯密封处理 (2)撒布6-9mm粒径荧光石1kg/m2（按1:25与耐黄变聚氨酯胶水混合） (3)50厚6mm粒径C25彩色透水混凝土强固层 (4)150厚10mm粒径C25透水混凝土 (5)30厚砂滤层 (6)150厚级配碎石垫层 (7)素土夯实，夯实度≥93%	m2	1110.000	62.99	123.83		0.05	11.88	11.93		18.97	229.65
129.1	501EB001T	双丙聚氨酯密封处理	m2	1.000		12.00			0.76	0.77		1.22	14.75
129.2	50103017T	撒布6-9mm粒径荧光石1kg/m2（按1:25与耐黄变聚氨酯胶水混合）	m2	1.000	50.83	67.63			7.53	7.56		12.02	145.57
129.3	50103028T	50厚6mm粒径C25彩色透水混凝土强固层	m2	1.000	4.89	44.20		0.05	3.13	3.14		4.99	60.40
129.4	50103006T	150厚10mm粒径C25透水混凝土	m3		68.19	399.37		1.17	29.81	29.91		47.56	576.01
129.5	40106002T	滤沟、滤层(砂滤层)	m3		21.89	76.39			6.25	6.27		9.97	120.77
129.6	50103005T	垫层(碎石)	m3		25.13	158.95		0.60	11.75	11.79		18.74	226.96
129.7	50103001	园路路基整理路床	m2	1.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
130	050201001001	园路 (1)400*200*80厚八字形绿色植草砖,内掺草籽 (2)30厚黄土粗砂(砂:土=1:1) (3)100厚C20无砂大孔混凝土基层 (4)300厚级配碎石垫层 (5)素土夯实（夯实度≥93%）	m2	105.000	48.83	130.64		0.29	11.44	11.47		18.25	220.91
130.1	50103008	嵌草面层(嵌草砖 厚8cm)	m2	105.000	25.31	46.02			4.54	4.55		7.24	87.66
130.2	50101167	草皮类(铺植草皮 嵌草砖)	m2	105.000	2.34	2.97			0.34	0.34		0.54	6.53
130.3	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	10.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
130.4	50103005T	垫层(碎石)	m3	31.000	25.13	158.95		0.60	11.75	11.79		18.74	226.96
130.5	50103001	园路路基整理路床	m2	105.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
131	050201001002	园路	m2	20.000	103.88	186.70		1.21	18.56	18.62		29.61	358.58

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第33页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(1)600*200*30厚芝麻白荔枝面压边 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%											
131.1	50103048T	600*200*30厚芝麻白荔枝面压边	m2	20.000	69.57	104.19		0.88	11.11	11.15		17.72	214.62
131.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	2.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
131.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	6.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
131.4	50103001	园路路基整理路床	m2	20.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
132	050201001005	园路 (1)1000*500*30厚芝麻白荔枝面、 1000*500*30厚芝麻黑烧面 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%	m2	48.000	103.60	186.94		1.21	18.56	18.62		29.61	358.53
132.1	50103048T	600*200*30厚芝麻白荔枝面压边	m2	48.000	69.57	104.19		0.88	11.11	11.15		17.72	214.62
132.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	5.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
132.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	14.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
132.4	50103001	园路路基整理路床	m2	48.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
133	050201001003	园路 (1)900*300*30厚芝麻白荔枝面/芝麻黑烧面齐 缝铺,余同 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%	m2	151.000	90.37	159.76		1.41	16.00	16.04		25.53	309.12
133.1	50103036T	900*300*30厚芝麻白荔枝面/芝麻黑烧面齐缝 铺	m2	151.000	66.06	100.16		1.19	10.65	10.68		16.99	205.73

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
133.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	15.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
133.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	23.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
133.4	50103001	园路路基整理路床	m2	151.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
134	050201001011	园路 (1)边长200~600 30厚芝麻白荔枝面碎拼 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实, 夯实度≥93%	m2	22.000	100.05	196.78		0.91	18.93	19.00		30.21	365.88
134.1	50103045T	边长200~400 50厚毛石碎拼	m2	22.000	77.39	142.70		0.71	14.04	14.09		22.40	271.33
134.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	2.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
134.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	3.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
134.4	50103001	园路路基整理路床	m2	22.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
135	011107001001	石材台阶面 (1)600*330*70厚芝麻白荔枝面踏面、 600*300*70厚芝麻白荔枝面踏面 (2)600*150*25厚芝麻白荔枝面踢面 (3)5厚纯水泥膏一道 (4)30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (5)120厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实(夯实度≥93%)	m2	5.000	258.18	372.52		9.29	40.70	40.84		64.94	786.47
135.1	50103078T	台阶(花岗岩)	m2	5.000	112.33	253.89		8.17	23.81	23.89		37.99	460.08
135.2	50103074T	C20台阶(预拌非泵送普通混凝土)	m3	1.000	667.79	434.19		4.98	70.40	70.64		112.32	1360.32
135.3	50103005T	垫层(碎石)	m3	1.000	25.13	158.95		0.60	11.75	11.79		18.74	226.96
135.4	50103001	园路路基整理路床	m2	5.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
136	011502001001	金属装饰线 (1)M8膨胀螺栓固定, @500 (2)L50*50*8热镀锌角钢通长	m	1167.000	7.11	21.80		0.19	1.85	1.86		2.95	35.76
136.1	10115044T	金属装饰线(不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤50m	m	1167.000	7.11	21.80		0.19	1.85	1.86		2.95	35.76

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第35页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		m)											
137	050201015002	栈道 (1)面层材料种类:140宽25厚拉丝重竹木,离缝宽5mm,专用不锈钢卡扣固定;20mm厚侧封板 (2)支架材料种类:60mm长L50*5mm厚热镀锌角钢,M8膨胀螺栓固定 (3)□50*50*5mm厚热镀锌矩形钢管 (4)10mm厚橡胶垫 (5)100mm厚C20混凝土墩 (6)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (7)100mm厚C20混凝土垫层 (8)150mm厚碎石灌砂垫层 (9)素土夯实,夯实程度≥93%	m2	73.000	131.60	422.45	43.40	8.64	33.03	33.14		56.60	685.46
137.1	50103055T	木(仿木)面层(木板地面满铺 厚100mm)	m2	81.000	28.75	182.72		1.11	13.52	13.57		21.57	261.24
137.2	50103058T	木(仿木)面层(钢 梁、龙骨)	t	1.550	2985.16	5168.98		319.96	538.95	540.78		859.84	10413.67
137.3	05B001T	橡胶垫	个	396.000		8.00	8.00					0.72	8.72
137.4	10111002T	水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 15mm厚) 未编制项目	m2	62.000	13.72	4.21		0.47	1.17	1.17		1.87	22.61
137.5	40305004T	C20基础(预拌非泵送普通混凝土)	m3	1.000	50.97	356.89			25.94	26.03		41.38	501.21
137.6	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	7.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
137.7	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	11.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
137.8	50103001	园路路基整理路床	m2	73.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
138	020202003001	栏杆 (1)φ32 3厚热镀锌钢管,白色氟碳漆饰面 (2)φ60 5厚热镀锌钢管,白色氟碳漆饰面 (3)φ60 5厚热镀锌钢管,白色氟碳漆饰面	m	13.000	68.43	184.45		2.31	16.23	16.29		25.89	313.60
138.1	10115099	钢管栏杆(钢管扶手)	m	13.000	68.43	184.45		2.31	16.23	16.29		25.89	313.60
139	011503008001	玻璃栏板 (1)铝合金栏杆、铝合金扶手(100×44) (10mm厚钢化玻璃栏板 全玻)	m	14.000	290.95	139.82		2.70	27.57	27.66		43.98	532.68
139.1	10115083	铝合金栏杆、铝合金扶手(100×44)(10mm	m	14.000	290.95	139.82		2.70	27.57	27.66		43.98	532.68

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第36页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		厚钢化玻璃栏板 全玻)											
140	040205006002	标线 (1)100宽白色热熔漆画线 (2)热熔漆	m2	117.000	5.27	16.24		9.22	1.95	1.96		3.12	37.76
140.1	40205022	标线(分界线 热熔漆)	m2	117.000	5.27	16.24		9.22	1.95	1.96		3.12	37.76
141	020510004002	坐凳面 (1)600*400/500*50厚芝麻白光面 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)240*60*10厚红砖贴片 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实(夯实度≥93%)	m2	34.000	402.19	455.31		3.68	54.76	54.95		87.38	1058.27
141.1	10111121T	600*400/500*50厚芝麻白光面	m2	34.000	98.79	148.40		0.68	15.76	15.82		25.15	304.60
141.2	10104001	实心砖墙(实心标准砖墙)	m3	17.000	323.53	239.48		4.66	36.10	36.23		57.60	697.60
141.3	10112084	外墙面面砖(每块面积≤0.01m2 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝5mm)	m2	38.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
141.4	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	7.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
141.5	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	11.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
141.6	50103001	园路路基整理路床	m2	74.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
142	020510004003	坐凳面 (1)3厚热镀锌钢板,白色氟碳漆饰面 (2)100*100*5厚热镀锌钢管,黑色氟碳漆饰面 (3)100*100*5厚热镀锌钢管,黑色氟碳漆饰面 (4)200*200*5厚热镀锌钢板,4M8膨胀螺栓固定 (5)300*300*300C20混凝土块 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实(夯实度≥93%)	m2	6.000	203.85	422.97		27.13	41.59	41.72		66.36	803.61
142.1	10112241	墙面饰面(镀锌铁皮墙面)	m2	6.000	56.36	42.56		2.34	6.44	6.46		10.27	124.43

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第37页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
142.2	10106016	其他(附墙钢骨架制作、安装)	t	0.280	2097.92	5753.00		522.03	532.52	534.33		849.58	10289.38
142.3	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	1.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
142.4	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	2.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
142.5	50103001	园路路基整理路床	m2	13.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
143	020201001001	阶条石 (1)1000*400*300芝麻白荔枝面整条石 (2)120厚C20混凝土垫层 (3)150厚碎石灌沙垫层 (4)素土夯实(夯实度≥93%)	m3	2.000	775.42	833.61		4.85	102.63	102.98		163.77	1983.26
143.1	10104054	石台阶(方整石 台阶、廊沿)	m3	2.000	674.91	574.56		3.91	79.71	79.99		127.18	1540.26
143.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	1.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
143.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	1.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
143.4	50103001	园路路基整理路床	m2	9.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
144	05B048	异形水磨石坐凳 (1)玻璃钢坐凳	个	3.000		1500.00			95.40	95.72		152.20	1843.32
144.1	05B001	异形水磨石坐凳	个	3.000		1500.00			95.40	95.72		152.20	1843.32
145	05B049	玫瑰花灯 (1)感应互动花朵路灯成品购买，高约2.8m， 花开直径约1.5m	个	3.000		1200.00			76.32	76.58		121.76	1474.66
145.1	05B001T	玫瑰花灯	个	3.000		1200.00			76.32	76.58		121.76	1474.66
146	05B050	打卡相框 (1)打卡相框 (2)5厚浅蓝色亚克力板字、宽500 2厚彩色PVC 广告字 (3)2厚白色PVC广告字 (4)规格：300*300*20 (5)300*200*6厚热镀锌钢管 (6)白色氟碳漆饰面 (7)200*100*4厚热镀锌钢管 (8)白色氟碳漆饰面	个	1.000		12500.00			795.00	797.70		1268.34	15361.04
146.1	05B001T	打卡相框	个	1.000		12500.00			795.00	797.70		1268.34	15361.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第38页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
147	05B051	景观廊架 (1)100*50*3厚热镀锌钢管 (2)白色氟碳漆饰面 (3)100*50*3厚热镀锌钢管 (4)白色氟碳漆饰面 (5)100*100*3厚热镀锌钢管 (6)白色氟碳漆饰面 (7)3厚热镀锌钢板 (8)白色氟碳漆饰面	个	2.000		8900.00			566.04	567.96		903.06	10937.06
147.1	05B001T	景观廊架	个	2.000		8900.00			566.04	567.96		903.06	10937.06
		人行道改造											
148	041001002001	拆除人行道 (1)材质:透水砖 (2)厚度:8cm	m2	2543.000	2.81				0.18	0.18		0.29	3.46
148.1	40104022	拆除人行道(普通粘土砖 平铺)	m2	2543.000	2.81				0.18	0.18		0.29	3.46
149	041001003042	拆除基层 (1)材质:透水砼 (2)厚度:10cm (3)部位:垫层	m2	2543.000	8.85	0.03		1.31	0.65	0.65		1.03	12.52
149.1	40104019	拆除人行道(现浇混凝土面(垫)层 厚10cm以内)	m2	2543.000	8.85	0.03		1.31	0.65	0.65		1.03	12.52
150	041001003043	拆除基层 (1)材质:级配碎石 (2)厚度:15cm (3)部位:基层	m2	2543.000	0.14			2.86	0.19	0.19		0.30	3.69
150.1	40101153T	挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路	m3	381.000	0.95			19.07	1.27	1.28		2.03	24.60
151	040103002057	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5km	m3	864.000	0.46			23.18	1.51	1.51		2.40	29.06
151.1	40101155	机械装石方(装载机装车 石渣)	m3	523.000	0.47			3.55	0.26	0.26		0.41	4.95
151.2	40101162T	自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距5km以内)	m3	864.000	0.18			21.03	1.35	1.35		2.15	26.06
152	050201001029	园路	m2	2543.000	112.89	228.09		1.44	21.77	21.85		34.75	420.78

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第39页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(1)600*300*80厚芝麻白荔枝面工字铺 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 (4)120厚C20混凝土垫层 (5)150厚碎石灌沙垫层 (6)素土夯实（夯实度≥93%）											
152.1	50103038T	600*300*80厚芝麻白荔枝面工字铺	m2	2543.000	87.34	161.36		1.19	15.89	15.95		25.36	307.09
152.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	305.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
152.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	381.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
152.4	50103001	园路路基整理路床	m2	2543.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
文化景墙													
153	010101003002	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内	m3	56.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
153.1	10101018	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内)	m3	56.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
154	010103001001	回填方 (1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	38.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
154.1	10101103	回填工程(填土机械夯实 槽坑)	m3	38.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
155	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m3	12.000	0.18			20.99	1.35	1.35		2.15	26.02
155.1	10101086T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内)	m3	12.000	0.18			20.99	1.35	1.35		2.15	26.02
156	010404001001	垫层 (1)15cm灰土垫层	m3	3.000	50.03	182.60		1.20	14.87	14.92		23.73	287.35
156.1	10104068	灰土垫层	m3	3.000	50.03	182.60		1.20	14.87	14.92		23.73	287.35
157	010501001001	垫层 (1)100厚C20混凝土垫层	m3	2.000	65.31	344.34			26.05	26.14		41.56	503.40
157.1	10105001T	基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层)	m3	2.000	48.64	344.34			24.99	25.08		39.87	482.92
157.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	2.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第40页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
158	010503001001	基础梁 (1)非泵送 (2)C25	m3	3.000	55.34	353.36			25.99	26.08		41.47	502.24
158.1	10105015T	C25预拌非泵送普通混凝土(基础梁)	m3	3.000	38.67	353.36			24.93	25.02		39.78	481.76
158.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	3.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
159	010507005001	压顶 (1)非泵送 (2)C25	m3	1.000	216.68	356.80			36.47	36.60		58.19	704.74
159.1	10105043T	其他构件(C25预拌非泵送普通混凝土 扶手、压顶)	m3	1.000	216.68	356.80			36.47	36.60		58.19	704.74
160	010401003001	实心砖墙 (1)清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	29.000	304.17	339.39		0.59	40.97	41.11		65.36	791.59
160.1	20303049T	清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	29.000	304.17	339.39		0.59	40.97	41.11		65.36	791.59
161	011201004001	立面砂浆找平层 (1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	58.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
161.1	10112018T	外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙20mm厚)	m2	58.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
162	011204003001	块料墙面 (1)600*150*15厚红色大小拼天然文化石	m2	30.000	51.84	58.87		0.16	7.05	7.08		11.25	136.25
162.1	10112156	瓷板、文化石(外墙面瓷板 每块面积≤0.025m2 水泥砂浆粘贴)	m2	30.000	51.84	58.87		0.16	7.05	7.08		11.25	136.25
163	011204003002	块料墙面 (1)240*60*10厚红砖贴片	m2	130.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
163.1	10112084	外墙面面砖(每块面积≤0.01m2 水泥砂浆粘贴面砖灰缝5mm)	m2	130.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
164	011204001001	石材墙面 (1)600*300*50厚黄金麻菠萝面	m2	16.000	96.88	290.14		0.11	24.62	24.71		39.28	475.74
164.1	10112193T	石材墙面(外墙粘贴石材 水泥砂浆粘贴)	m2	16.000	96.88	290.14		0.11	24.62	24.71		39.28	475.74
165	011108001001	石材零星项目 (1)600*300*50厚芝麻黑烧面压顶	m2	8.000	98.79	148.40		0.68	15.76	15.82		25.15	304.60

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第41页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
165.1	10111121T	600*300*50厚芝麻黑烧面压顶	m2	8.000	98.79	148.40		0.68	15.76	15.82		25.15	304.60
166	010515001001	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ8	t	1.390	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
166.1	10105067T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	1.390	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
167	010515001002	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ10	t	2.590	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
167.1	10105067	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	2.590	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
168	011508005001	吸塑字 (1)字宽30,3厚PVC蓝色广告字,余同	个 (套)	50.000		120.00	120.00					10.80	130.80
168.1	01B001	字宽30,3厚PVC蓝色广告字	个	50.000		120.00	120.00					10.80	130.80
169	011207001002	墙面装饰板 (1)3厚热镀锌钢板,黑色氟碳漆饰面 (2)文字UV打印	m2	28.000	56.36	154.41		2.34	13.55	13.60		21.62	261.88
169.1	10112241T	墙面饰面(镀锌钢板墙面)	m2	28.000	56.36	154.41		2.34	13.55	13.60		21.62	261.88
给水工程													
170	040101002027	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内	m3	236.000	3.03			2.87	0.57	0.39		0.62	7.48
170.1	40101008T	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%	m3	12.000	52.11				5.05	3.43		5.45	66.04
170.2	40101055	挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土)	m3	224.000	0.40			3.02	0.33	0.23		0.36	4.34
171	040103001046	填方 (1)符合设计要求 (2)机制砂 (3)符合设计要求	m3	26.000	2.12	80.08		1.82	8.14	5.53		8.79	106.48
171.1	40101108T	槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实)	m3	26.000	2.12	80.08		1.82	8.14	5.53		8.79	106.48
172	040103001047	填方 (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求	m3	209.000	2.62	0.36		3.71	0.65	0.44		0.70	8.48

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
172.1	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填碾压)	m3	209.000	2.62	0.36		3.71	0.65	0.44		0.70	8.48
173	031001006043	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN25 (3)1.25Mpa	m	46.000	6.47	4.82		0.01	1.09	0.74		1.18	14.31
173.1	31001237T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内	m	46.000	6.47	4.82		0.01	1.09	0.74		1.18	14.31
174	031001006048	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN32 (3)1.25Mpa	m	34.000	6.47	5.69		0.01	1.18	0.80		1.27	15.42
174.1	31001237T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内	m	34.000	6.47	5.69		0.01	1.18	0.80		1.27	15.42
175	031001006044	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN40 (3)1.25Mpa	m	14.000	7.14	7.63		0.01	1.43	0.97		1.55	18.73
175.1	31001238T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内	m	14.000	7.14	7.63		0.01	1.43	0.97		1.55	18.73
176	031001006045	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN50 (3)1.25Mpa	m	335.000	7.77	11.25		0.02	1.84	1.25		1.99	24.12
176.1	31001239T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内	m	335.000	7.77	11.25		0.02	1.84	1.25		1.99	24.12
177	031001006046	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN63 (3)1.25Mpa	m	289.000	8.53	17.59		0.02	2.53	1.72		2.74	33.13
177.1	31001240T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内	m	289.000	8.53	17.59		0.02	2.53	1.72		2.74	33.13
178	031001006047	塑料管 (1)HDPE双壁波纹管DN200	m	80.000	12.39	46.00		5.48	6.19	4.20		6.68	80.94
178.1	31001308T	室外塑料排水管(胶圈接口) 外径200mm以内	m	80.000	12.39	46.00		5.48	6.19	4.20		6.68	80.94
179	040504001022	砌筑井 (1)C15混凝土垫层 (2)C25现浇底板	座	1.000	921.38	2002.57		19.68	285.26	193.73		308.04	3730.65

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第43页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(3)C25预拌非泵送细石混凝土盖板 (4)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (5)预制混凝土(圆钢筋 Φ10以外) (6)井盖、井算安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (7)井盖、井算安装(安全防坠网) (8)井盖、井算安装(塑钢爬梯踏步) (9)05S502 16页											
179.1	40501005T	C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3		175.37	330.12		0.70	49.05	33.31		52.97	641.52
179.2	40501005T	C25预拌非泵送普通混凝土现浇底板	m3	1.000	175.37	366.30		0.70	52.56	35.70		56.76	687.39
179.3	40501104T	C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)	m3		327.83	487.53		0.32	79.04	53.68		85.36	1033.76
179.4	40501114	安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内))	m3		115.85	18.94		22.19	15.21	10.33		16.43	198.95
179.5	40501007	砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)	m3	3.000	209.71	303.90		4.21	50.18	34.08		54.19	656.27
179.6	40304007T	现浇混凝土(螺纹钢钢筋 Φ10以外)	t	0.060	598.45	3497.49		61.88	402.89	273.64		435.09	5269.44
179.7	40304002	预制混凝土(圆钢筋 Φ10以外)	t		701.64	3687.33		92.55	434.26	294.95		468.97	5679.70
179.8	40304003T	预制混凝土(螺纹钢钢筋 Φ10以外)	t	0.040	578.95	3507.25		65.86	402.33	273.26		434.49	5262.14
179.9	40501039T	井盖、井算安装(检查井井盖、座 普通铸铁)	套	1.000	51.39	374.43			41.26	28.02		44.56	539.66
179.10	40501045	井盖、井算安装(塑钢爬梯踏步)	步	3.000	2.14				0.21	0.14		0.22	2.71
180	031003013003	水表 (1)水表组(闸阀 DN80 2个, 水表LXS-80 1个, 防止倒流器 DN80 1个)	组/个	1.000	253.58	1668.83		9.26	187.18	127.13		202.14	2448.12
180.1	31005324T	水表组(水表1个、蝶阀2个、止回阀1个、伸缩接头1个)	组	1.000	253.58	1668.83		9.26	187.18	127.13		202.14	2448.12
181	031003001011	螺纹阀门 (1)截止阀 DN50	个	9.000	31.85	184.53		2.09	21.17	14.38		22.86	276.88
181.1	31005006T	闸阀 DN50	个	9.000	31.85	184.53		2.09	21.17	14.38		22.86	276.88
182	031003001012	螺纹阀门 (1)快速取水阀DN25 (2)C20基础	个	12.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第44页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(3)卵石透水层											
182.1	31005489T	喷泉喷头(普通喷头 洒水栓 DN25)	个	12.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
182.2	40305004T	C20基础(预拌非泵送普通混凝土)	m3		50.97	356.88			39.52	26.84		42.68	516.89
182.3	40106002T	滤沟、滤层(砂滤层)	m3		21.89	108.31			12.62	8.57		13.63	165.02
183	030109011002	潜水泵 (1)加压潜水泵, DN110 (2)Q=12.0L/S, H=40m, N=11kW	台	1.000	475.21	3315.78	3250.00	31.64	55.49	37.69		352.42	4268.23
183.1	30108122T	加压潜泵, DN110 Q=12.0L/S, H=40m, N=11kW	台	1.000	291.33	3256.60	3250.00	24.89	31.28	21.25		326.28	3951.63
183.2	30406018	交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤13kw)	台	1.000	183.88	59.18		6.75	24.21	16.44		26.14	316.60
184	030901003003	水喷淋(雾)喷头 (1)水喷淋(雾)喷头	个	16.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
184.1	31005489T	喷泉喷头(普通喷头 洒水栓 DN25)	个	16.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
		破除修复											
185	041001001001	拆除路面 (1)水泥路面 (2)18cm	m2	36.000	0.82			11.97	1.24	0.84		1.34	16.22
185.1	40104070T	液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面	m3	7.000	4.23			61.57	6.38	4.33		6.89	83.40
186	041001003045	拆除基层 (1)材质:碎石灌砂 (2)厚度:18cm (3)部位:基层	m2	36.000	0.18			3.71	0.38	0.26		0.41	4.94
186.1	40101153T	挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路	m3	7.000	0.95			19.07	1.94	1.32		2.10	25.38
187	040103002058	余方弃置 (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:5km	m3	13.000	0.47			23.21	2.30	1.56		2.48	30.02
187.1	40101155	机械装石方(装载机装车 石渣)	m3	8.000	0.47			3.55	0.39	0.26		0.42	5.09
187.2	40101162T	自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距5km以内)	m3	13.000	0.18			21.03	2.06	1.40		2.22	26.89

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第45页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
村容村貌提升													
1. 库湾路路口提升													
园林建筑													
188	05B073	镇标 (1)100宽3厚红色不锈钢广告字 (2)3厚热镀锌钢板,深蓝色氟碳漆饰面 (3)3厚热镀锌钢板,浅蓝色氟碳漆饰面 (4)3厚热镀锌钢板,白色氟碳漆饰面 (5)3厚不锈钢深蓝色广告字 (6)3厚不锈钢浅蓝色广告字 (7)600*300*50厚芝麻灰荔枝面	个	1.000		1800.00			114.48	114.87		182.64	2211.99
188.1	05B001T	镇标	个	1.000		1800.00			114.48	114.87		182.64	2211.99
绿化种植													
189	050102001011	栽植乔木 (1)宫粉紫荆 (2)胸径13-14cm (3)高度:4.5m,冠幅:2m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型 优美 (7)20kg/株	株	5.000	144.93	1423.45		36.96	102.14	102.48		162.99	1972.95
189.1	50101083	栽植乔木(带土球) 土球直径70cm以内	株	5.000	37.44	0.38		14.10	3.30	3.31		5.27	63.80
189.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗 (含容器苗、袋装苗)成活养护期半年日常养 护期半年	株	5.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
189.3	501BC001T	宫粉紫荆 胸径13-14cm,H:4.5m,P:2m 全 冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美	株	5.000		1400.00			89.04	89.34		142.05	1720.43
189.4	501BC001	基肥	kg	100.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
190	050102002004	栽植灌木 (1)丛生紫薇	株	2.000	80.42	430.38		25.60	34.14	34.25		54.49	659.28

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 180-200cm (5)P: 150cm (6)多株拼丛,花淡粉,以高度冠幅为准,袋苗,全冠,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株											
190.1	50101121	栽植灌木（带土球） 土球直径80cm以内	株	2.000	55.06	0.45		21.15	4.88	4.89		7.78	94.21
190.2	50102080T	落叶灌木 高度200cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	2.000	25.36	5.53		4.45	2.25	2.26		3.59	43.44
190.3	501EB001T	丛生紫薇 H: 180-200cm, P: 150cm 多株拼丛,花淡粉,以高度冠幅为准,袋苗,全冠,冠幅饱满,树型优美	株	2.000		420.00			26.71	26.80		42.62	516.13
190.4	501BC001	基肥	kg	20.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
191	050102001012	栽植乔木 (1)鸡爪槭 (2)胸径8-9cm (3)高度:2m, 冠幅: 1.8m (4)带土球 (5)成活养护半年, 日常养护半年 (6)全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	2.000	83.29	831.66		9.35	58.81	59.01		93.83	1135.95
191.1	50101081	栽植乔木（带土球） 土球直径50cm以内	株	2.000	18.72	0.23			1.21	1.21		1.92	23.29
191.2	50102013T	单排、独立落叶乔木 米径10cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	2.000	64.57	7.03		9.35	5.15	5.17		8.21	99.48
191.3	501BC001T	鸡爪槭 胸径8-9cm, H:2m, P: 1.8m 全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美	株	2.000		820.00			52.15	52.33		83.20	1007.68
191.4	501BC001	基肥	kg	20.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
192	050102002005	栽植灌木 (1)同安红三角梅 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年	株	3.000	27.07	289.26		2.84	20.32	20.39		32.44	392.32

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第47页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(4)H：120-150cm (5)P：80cm (6)盆苗,以高度冠幅为准,全冠,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株											
192.1	50101117	栽植灌木（带土球） 土球直径40cm以内	株	3.000	13.36	0.15			0.86	0.86		1.37	16.60
192.2	50102071T	常绿灌木 高度150cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	3.000	13.71	4.71		2.84	1.35	1.36		2.16	26.13
192.3	501EB001	同安红三角梅 H：120-150cm，P：80cm	株	3.000		280.00			17.81	17.87		28.41	344.09
192.4	501BC001	基肥	kg	30.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
193	050102002006	栽植灌木 (1)红花继木球 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：110-120cm (5)P：110-120cm (6)球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	3.000	54.51	139.91		3.42	12.60	12.65		20.13	243.22
193.1	50101119	栽植灌木（带土球） 土球直径60cm以内	株	3.000	31.21	0.30			2.00	2.01		3.20	38.72
193.2	50102104T	球形植物 蓬径150cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	3.000	23.30	5.21		3.42	2.03	2.04		3.24	39.24
193.3	501EB001T	红花继木球 H：110-120cm，P：110-120cm 球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗	株	3.000		130.00			8.27	8.30		13.19	159.76
193.4	501BC001	基肥	kg	30.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
194	050102002007	栽植灌木 (1)金叶女贞球 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：110-120cm (5)P：110-120cm (6)球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	1.000	54.51	129.91		3.42	11.96	12.01		19.12	230.93

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第48页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
194.1	50101119	栽植灌木（带土球） 土球直径60cm以内	株	1.000	31.21	0.30			2.00	2.01		3.20	38.72
194.2	50102104T	球形植物 蓬径150cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	1.000	23.30	5.21		3.42	2.03	2.04		3.24	39.24
194.3	501EB001T	金叶女贞球 H：110-120cm，P：110-120cm 球型，不脱脚，冠幅饱满不偏冠，袋苗	株	1.000		120.00			7.63	7.66		12.18	147.47
194.4	501BC001	基肥	kg	10.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
195	050102002008	栽植灌木 (1) 龟甲冬青球A (2) 带土球 (3) 成活养护期半年日常养护期半年 (4) H：120-150cm (5) P：80cm (6) 球型，不脱脚，冠幅饱满不偏冠，袋苗 (7) 10kg/株	株	3.000	32.41	128.56		2.77	10.43	10.47		16.67	201.31
195.1	50101118	栽植灌木（带土球） 土球直径50cm以内	株	3.000	20.80	0.23			1.34	1.34		2.13	25.84
195.2	50102103T	球形植物 蓬径100cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	3.000	11.61	3.93		2.77	1.16	1.17		1.86	22.50
195.3	501EB001T	龟甲冬青球A H：80-100cm，P：100cm 球型，不脱脚，冠幅饱满不偏冠，袋苗	株	3.000		120.00			7.63	7.66		12.18	147.47
195.4	501BC001	基肥	kg	30.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
196	050102002009	栽植灌木 (1) 龟甲冬青球B (2) 带土球 (3) 成活养护期半年日常养护期半年 (4) H：80cm (5) P：80cm (6) 球型，不脱脚，冠幅饱满不偏冠，袋苗 (7) 10kg/株	株	5.000	24.97	108.48		2.77	8.68	8.71		13.88	167.49
196.1	50101117	栽植灌木（带土球） 土球直径40cm以内	株	5.000	13.36	0.15			0.86	0.86		1.37	16.60
196.2	50102103T	球形植物 蓬径100cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	5.000	11.61	3.93		2.77	1.16	1.17		1.86	22.50
196.3	501EB001T	龟甲冬青球A H：80cm，P：80cm 球型，不	株	5.000		100.00			6.36	6.38		10.15	122.89

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第49页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗											
196.4	501BC001	基肥	kg	50.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
197	050102007012	栽植色带 (1)成活养护半年,日常养护半年 (2)36盆/m2 (3)橙花三角梅 (4)H:30cm, P: 20cm (5)5kg/m2	m2	63.000	12.43	131.84		3.28	9.39	9.43		15.00	181.37
197.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	63.000		125.33			7.97	8.00		12.72	154.02
197.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	63.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
197.3	501BC001	基肥	kg	315.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
198	050102007013	栽植色带 (1)成活养护半年,日常养护半年 (2)36盆/m2 (3)粉花三角梅 (4)H:30cm, P: 20cm (5)5kg/m2	m2	36.000	12.43	139.04		3.28	9.85	9.89		15.73	190.22
198.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	36.000		132.53			8.43	8.46		13.45	162.87
198.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	36.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
198.3	501BC001	基肥	kg	180.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
199	050102007014	栽植色带 (1)成活养护半年,日常养护半年 (2)36盆/m2 (3)紫花三角梅 (4)H:30cm, P: 20cm (5)5kg/m2	m2	60.000	12.43	149.84		3.28	10.54	10.58		16.82	203.49
199.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	60.000		143.33			9.12	9.15		14.54	176.14
199.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	60.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
199.3	501BC001	基肥	kg	300.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第50页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
200	050102007015	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)64株/m2 (3)紫花马缨丹肾蕨混种 (4)H:25cm，P：15cm (5)5kg/m2	m2	131.000	12.43	89.84		3.28	6.72	6.75		10.74	129.76
200.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	131.000		83.33			5.30	5.32		8.46	102.41
200.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	131.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
200.3	501BC001	基肥	kg	655.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
201	050102007016	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)120株/m2 (3)麦冬 (4)H:10cm，P：10cm (5)5kg/m2	m2	52.000	12.43	85.04		3.28	6.41	6.44		10.25	123.85
201.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	52.000		78.53			4.99	5.01		7.97	96.50
201.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	52.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
201.3	501BC001	基肥	kg	260.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
202	050101010003	整理绿化用地 (1)绿地整理(整理绿化地) 客土回填	m2	342.000	2.86			0.59	0.22	0.22		0.35	4.24
202.1	50101001T	绿地整理(整理绿化地) 客土回填	m2	342.000	2.86			0.59	0.22	0.22		0.35	4.24
203	050101009003	种植土回(换)填 (1)符合设计要求 (2)30cm	m3	103.000	0.41	31.80		4.11	2.31	2.32		3.69	44.64
203.1	50101002T	绿地整理(回填土)	m3	103.000	0.41	31.80		4.11	2.31	2.32		3.69	44.64
2. 休闲长廊提升													
园林建筑													
204	011207001008	墙面装饰板 (1)新增3厚热镀锌钢板	m2	31.000	170.76	209.92		2.34	24.35	24.44		38.86	470.68

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(2)面饰仿木纹氟碳漆											
204.1	10112241T	墙面饰面(镀锌钢板墙面)	m2	31.000	56.36	154.41		2.34	13.55	13.60		21.62	261.88
204.2	10114116	金属面其他油漆(金属面 氟碳漆)	m2	61.000	58.14	28.21			5.49	5.51		8.76	106.11
205	020111003001	挂落 (1)挂落制作 (五纹头、宫万式)	m2	26.000	228.16	21.93			15.91	15.96		25.38	307.34
205.1	20304534	挂落制作 (五纹头、宫万式)	m2	26.000	228.16	21.93			15.91	15.96		25.38	307.34
206	010604001001	钢梁 (1)钢梁、吊车梁(钢梁安装1.5t以内) (2)金属构件运输(一类金属构件 运距15km以内)	t	2.070	495.45	8270.11		244.68	573.05	575.00		914.24	11072.53
206.1	10302132T	钢梁、吊车梁(钢梁安装1.5t以内)	t	2.070	472.67	8263.80		136.96	564.35	566.27		900.36	10904.41
206.2	10302198T	金属构件运输(一类金属构件 运距15km以内)	t	2.070	22.78	6.31		107.72	8.70	8.73		13.88	168.12
207	011405001005	金属面油漆 (1)金属面其他油漆(金属面 氟碳漆)	m2	87.000	58.14	28.21			5.49	5.51		8.76	106.11
207.1	10114116	金属面其他油漆(金属面 氟碳漆)	m2	87.000	58.14	28.21			5.49	5.51		8.76	106.11
3.库湾路起点文化展示墙													
展示墙													
208	010101003012	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内	m3	89.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
208.1	10101018	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内)	m3	89.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
209	010103001010	回填方 (1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	51.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
209.1	10101103	回填工程(填土机械夯实 槽坑)	m3	51.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
210	010103002005	余方弃置 (1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m3	31.000	0.18			20.99	1.35	1.35		2.15	26.02
210.1	10101086T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内)	m3	31.000	0.18			20.99	1.35	1.35		2.15	26.02
211	010404001007	垫层	m3	6.000	50.03	182.60		1.20	14.87	14.92		23.73	287.35

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第52页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(1)15cm灰土垫层											
211.1	10104068	灰土垫层	m3	6.000	50.03	182.60		1.20	14.87	14.92		23.73	287.35
212	010501001010	垫层 (1)100厚C20混凝土垫层	m3	4.000	65.31	344.34			26.05	26.14		41.56	503.40
212.1	10105001T	基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层)	m3	4.000	48.64	344.34			24.99	25.08		39.87	482.92
212.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	4.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
213	010503001009	基础梁 (1)非泵送 (2)C25	m3	8.000	55.34	353.36			25.99	26.08		41.47	502.24
213.1	10105015T	C25预拌非泵送普通混凝土(基础梁)	m3	8.000	38.67	353.36			24.93	25.02		39.78	481.76
213.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	8.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
214	010507005006	压顶 (1)非泵送 (2)C25	m3	5.000	216.68	356.80			36.47	36.60		58.19	704.74
214.1	10105043T	其他构件(C25预拌非泵送普通混凝土 扶手、 压顶)	m3	5.000	216.68	356.80			36.47	36.60		58.19	704.74
215	010502001003	矩形柱 (1)非泵送 (2)C25	m3	7.000	70.55	341.37			26.20	26.28		41.79	506.19
215.1	10105011T	C25预拌非泵送普通混凝土(独立矩形柱)	m3	7.000	53.88	341.37			25.14	25.22		40.10	485.71
215.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	7.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
216	010401003007	实心砖墙 (1)清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	17.000	304.17	339.39		0.59	40.97	41.11		65.36	791.59
216.1	20303049T	清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	17.000	304.17	339.39		0.59	40.97	41.11		65.36	791.59
217	011201004008	立面砂浆找平层 (1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	141.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
217.1	10112018T	外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚)	m2	141.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
218	011204003014	块料墙面 (1)600*150*15厚红色大小拼天然文化石	m2	12.000	51.84	58.87		0.16	7.05	7.08		11.25	136.25

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
218.1	10112156	瓷板、文化石(外墙面瓷板 每块面积≤0.025m2 水泥砂浆粘贴)	m2	12.000	51.84	58.87		0.16	7.05	7.08		11.25	136.25
219	011204003015	块料墙面 (1)240*60*10厚红砖贴片	m2	129.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
219.1	10112084	外墙面面砖(每块面积≤0.01m2 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝5mm)	m2	129.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
220	010515001025	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ8	t	1.360	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
220.1	10105067T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	1.360	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
221	010515001026	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ10	t	3.180	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
221.1	10105067	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	3.180	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
222	011508005005	吸塑字 (1)字宽30,3厚PVC蓝色广告字,余同	个 (套)	16.000		120.00	120.00					10.80	130.80
222.1	01B001	字宽30,3厚PVC蓝色广告字	个	16.000		120.00	120.00					10.80	130.80
223	011502008003	GRC装饰线条 (1)GBR白色造型线条	m	53.000	37.31	82.06		0.39	7.62	7.64		12.15	147.17
223.1	10115075	其他装饰线(GRC欧式装饰线 外挂腰线板 宽×高 ≤400×400)	m	53.000	37.31	82.06		0.39	7.62	7.64		12.15	147.17
4. 景观平台提升													
园林建筑													
224	050201015004	栈道 (1)面层材料种类:140宽25厚拉丝重竹木,离缝宽5mm,专用不锈钢卡扣固定;20mm厚侧封板 (2)支架材料种类:60mm长L50*5mm厚热镀锌角钢,M8膨胀螺栓固定 (3)□50*50*5mm厚热镀锌矩形钢管 (4)10mm厚橡胶垫 (5)100mm厚C20混凝土墩 (6)15mm厚1:3水泥砂浆找平层 (7)100mm厚C20混凝土垫层	m2	78.000	145.94	504.65	43.79	8.72	39.14	39.27		66.40	804.12

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第54页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(8)150mm厚碎石灌砂垫层 (9)素土夯实，夯实程度≥93%											
224.1	50103055T	木（仿木）面层(木板地面满铺 厚100mm)	m2	87.000	28.75	213.38		1.11	15.47	15.52		24.68	298.91
224.2	10303027T	屋面(封檐板安装 高度≤20m)	m	92.000	10.93	36.44			3.01	3.02		4.81	58.21
224.3	50103058T	木（仿木）面层(钢 梁、龙骨)	t	1.670	2985.16	5168.98		319.96	538.95	540.78		859.84	10413.67
224.4	05B001T	橡胶垫	个	427.000		8.00	8.00					0.72	8.72
224.5	10111002T	水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 15mm厚) 未编制项目	m2	67.000	13.72	4.21		0.47	1.17	1.17		1.87	22.61
224.6	40305004T	C20基础(预拌非泵送普通混凝土)	m3	1.000	50.97	356.89			25.94	26.03		41.38	501.21
224.7	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	8.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
224.8	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	12.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
224.9	50103001	园路路基整理路床	m2	78.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
5. 亭子及周边修复													
园林建筑													
225	050304005002	仿竹篱笆 (1)仿竹篱笆	m	52.000		200.00			12.72	12.76		20.29	245.77
225.1	01B001T	仿竹篱笆	m	52.000		200.00			12.72	12.76		20.29	245.77
226	050201001030	园路 (1)600*300*50厚青石菠萝面做旧处理 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%	m2	29.000	104.74	236.52		1.53	21.80	21.87		34.78	421.25
226.1	50103037T	600*300*50厚青石菠萝面做旧处理	m2	29.000	69.50	151.16		1.19	14.11	14.16		22.51	272.63
226.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	3.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
226.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	9.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
226.4	50103001	园路路基整理路床	m2	29.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
227	011107001006	石材台阶面	m2	8.000	207.54	146.35		1.19	22.58	22.66		36.03	436.34

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第55页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(1)1000x300x150厚毛条石 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 (4)100厚C20混凝土垫层 (5)150厚碎石灌沙垫层 (6)素土夯实（夯实度≥93%）											
227.1	50103075T	台阶(整毛石)	m3	1.000	909.20	577.69		3.91	94.81	95.14		151.27	1832.02
227.2	50103074T	C20台阶(预拌非泵送普通混凝土)	m3	1.000	667.79	434.19		4.98	70.40	70.64		112.32	1360.32
227.3	50103005T	垫层(碎石)	m3	1.000	25.13	158.95		0.60	11.75	11.79		18.74	226.96
227.4	50103001	园路路基整理路床	m2	8.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
228	011201004009	立面砂浆找平层 (1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	50.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
228.1	10112018T	外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚)	m2	50.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
229	011406001003	抹灰面油漆涂料 (1)乳胶漆饰面	m2	50.000	24.05	8.11			2.05	2.05		3.26	39.52
229.1	10114132	乳胶漆(室外 墙面 二遍)	m2	50.000	24.05	8.11			2.05	2.05		3.26	39.52
7. 垃圾桶													
园林建筑													
230	050307017001	垃圾箱 (1)垃圾箱 (2)做法详LD-14.02图7	个	16.000		850.00			54.06	54.24		86.25	1044.55
230.1	05B001	垃圾箱	个	16.000		850.00			54.06	54.24		86.25	1044.55
8. 智慧导览导视系统及夜景													
园林建筑													
231	05B080	警示牌 (1)警示牌 (2)做法详LD-14.02图5	个	18.000		1800.00			114.48	114.87		182.64	2211.99
231.1	05B001T	警示牌	个	18.000		1800.00			114.48	114.87		182.64	2211.99
232	05B081	指示牌	个	20.000		1500.00			95.40	95.72		152.20	1843.32

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第56页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(1)指示牌 (2)做法详LD-14. 02图3											
232. 1	05B001T	指示牌	个	20. 000		1500. 00			95. 40	95. 72		152. 20	1843. 32
233	05B082	展示牌 (1)展示牌 (2)做法详LD-14. 02图1	个	16. 000		1500. 00			95. 40	95. 72		152. 20	1843. 32
233. 1	05B001T	展示牌	个	16. 000		1500. 00			95. 40	95. 72		152. 20	1843. 32
电气工程													
234	040801003001	组合型成套箱式变电站 (1)箱变2SB (2)CBLW1-S-100/10-1-S-J (3)AC-10/0. 4KV (4)100KV (5)C25砼基础 (6)接地极L=2500MM L50*50*5角钢 (7)-40*4镀锌扁钢 (8)预埋槽钢 (9)挖土、外运 (10)C25防水砼、20厚1：2水泥砂浆抹灰 (11)不锈钢护栏 (12)余详施工图施	台	1. 000	7144. 04	88306. 23	81146. 02	992. 16	972. 42	975. 76		8855. 18	107245. 79
234. 1	40901010T	组合型成套箱式变电站安装(带高压开关柜 变压器容量100kV· A以下)	台	1. 000	1118. 67	81416. 04	81146. 02	373. 80	112. 09	112. 47		7481. 98	90615. 05
234. 2	40501005T	C25排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	5. 000	175. 37	428. 72		0. 51	38. 45	38. 58		61. 35	742. 98
234. 3	40501012T	C25现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 矩形30cm以外)	m3	5. 000	427. 07	481. 21		9. 22	58. 35	58. 55		93. 10	1127. 50
234. 4	40906007	接地母线敷设	m	27. 000	16. 83	0. 15		0. 22	1. 09	1. 10		1. 75	21. 14
234. 5	40906003	接地极(板)制作安装(角钢接地极 普通土)	根	4. 000	33. 44	39. 54		9. 46	5. 24	5. 26		8. 36	101. 30
234. 6	40101055	挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土)	m3	45. 000	0. 40			2. 50	0. 18	0. 18		0. 29	3. 55
234. 7	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填碾压)	m3	31. 000	2. 62	0. 39		3. 48	0. 41	0. 41		0. 66	7. 97
234. 8	40101091T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内)	m3	9. 000	0. 18			8. 83	0. 57	0. 57		0. 91	11. 06

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第57页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
234.9	10115086	不锈钢栏杆(不锈钢扶手)	m	16.000	145.26	135.39		14.13	18.75	18.81		29.91	362.25
235	040807001001	变压器系统调试 (1)名称:输配电装置系统调试	系统	1.000	319.92			38.24	22.78	22.86		36.34	440.14
235.1	40907001	输配电装置系统调试(1kV以下交流供电)	系统	1.000	319.92			38.24	22.78	22.86		36.34	440.14
236	030404017008	配电箱 (1)名称:照明配电箱 (2)型号:ALjg1/ALjg2 (3)安装方式:落地式, 80*80槽钢基础	台	2.000	270.68	5260.52	5200.00	105.13	27.74	27.84		512.27	6204.18
236.1	30402074T	成套配电箱安装 配电箱ALjg1/ALjg2	台	2.000	243.56	5218.44	5200.00	102.51	23.18	23.26		504.99	6115.94
236.2	30407001	基础槽钢制作、安装	m	4.000	13.56	21.04		1.31	2.28	2.29		3.64	44.12
237	030404017010	配电箱 (1)名称:照明配电箱 (2)型号:ALjg3 (3)安装方式:落地式, 80*80槽钢基础	台	1.000	270.68	5260.52	5200.00	105.13	27.74	27.84		512.27	6204.18
237.1	30402074T	成套配电箱安装 配电箱ALjg3	台	1.000	243.56	5218.44	5200.00	102.51	23.18	23.26		504.99	6115.94
237.2	30407001	基础槽钢制作、安装	m	2.000	13.56	21.04		1.31	2.28	2.29		3.64	44.12
238	030404017011	配电箱 (1)名称:照明配电箱 (2)型号:ALjg4 (3)安装方式:落地式, 80*80槽钢基础	台	1.000	270.68	5260.52	5200.00	105.13	27.74	27.84		512.27	6204.18
238.1	30402074T	成套配电箱安装 配电箱ALjg4	台	1.000	243.56	5218.44	5200.00	102.51	23.18	23.26		504.99	6115.94
238.2	30407001	基础槽钢制作、安装	m	2.000	13.56	21.04		1.31	2.28	2.29		3.64	44.12
239	030404017012	配电箱 (1)名称:照明配电箱 (2)型号:ALjg5 (3)安装方式:落地式, 80*80槽钢基础	台	1.000	270.68	5260.52	5200.00	105.13	27.74	27.84		512.27	6204.18
239.1	30402074T	成套配电箱安装 配电箱ALjg5	台	1.000	243.56	5218.44	5200.00	102.51	23.18	23.26		504.99	6115.94
239.2	30407001	基础槽钢制作、安装	m	2.000	13.56	21.04		1.31	2.28	2.29		3.64	44.12
240	030404017009	配电箱 (1)名称:照明配电箱 (2)型号:APcdz1	台	1.000	270.68	5860.52	5800.00	105.13	27.74	27.84		566.27	6858.18

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第58页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(3)安装方式:落地式，80*80槽钢基础											
240.1	30402074T	成套配电箱安装 配电箱APcdz1	台	1.000	243.56	5818.44	5800.00	102.51	23.18	23.26		558.99	6769.94
240.2	30407001	基础槽钢制作、安装	m	2.000	13.56	21.04		1.31	2.28	2.29		3.64	44.12
241	030404017013	配电箱 (1)名称:照明配电箱 (2)型号:ALxt (3)安装方式:落地式，80*80槽钢基础	台	1.000	270.68	6860.52	6800.00	105.13	27.74	27.84		656.27	7948.18
241.1	30402074T	成套配电箱安装 配电箱ALxt	台	1.000	243.56	6818.44	6800.00	102.51	23.18	23.26		648.99	7859.94
241.2	30407001	基础槽钢制作、安装	m	2.000	13.56	21.04		1.31	2.28	2.29		3.64	44.12
242	031101001001	开关电源设备 (1)名称:开关电源 (2)型号:AC220V/DC24V-350W (3)安装方式:明装	架/台	30.000	23.59	300.84			20.63	20.70		32.92	398.68
242.1	30507120T	开关电源AC220V/DC24V-350W	台	30.000	23.59	300.84			20.63	20.70		32.92	398.68
243	030408001016	电力电缆 (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZC-YJY (3)规格:4×35+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:室外 (6)电压等级(kV):1KV	m	150.000	4.30	146.77		1.18	9.68	9.72		15.45	187.10
243.1	30409137T	室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-4×35+1×16 五芯电力电缆敷设 室外敷设	m	150.000	4.30	146.77		1.18	9.68	9.72		15.45	187.10
244	030408001017	电力电缆 (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZC-YJY (3)规格:4×25+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:室外 (6)电压等级(kV):1KV	m	20.000	4.30	111.20		1.18	7.42	7.45		11.84	143.39
244.1	30409137T	室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-4×25+1×	m	20.000	4.30	111.20		1.18	7.42	7.45		11.84	143.39

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第59页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		16 五芯电力电缆敷设 室外敷设											
245	030408001018	电力电缆 (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZC-YJV (3)规格:3×6mm ² (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:室外 (6)电压等级(kV):1KV	m	358.000	2.76	21.35		1.02	1.60	1.60		2.55	30.88
245.1	30409135T	铜芯电力电缆敷设 ZC-YJV-3×6	m	358.000	2.76	21.35		1.02	1.60	1.60		2.55	30.88
246	030408006001	电力电缆头 (1)名称:干包电缆头 (2)型号:WDZC-YJY (3)规格:4×35+1×16mm ² (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV	个	4.000	52.13	54.80			6.80	6.82		10.85	131.40
246.1	30409223	1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm ²)	个	4.000	52.13	54.80			6.80	6.82		10.85	131.40
247	030408006002	电力电缆头 (1)名称:干包电缆头 (2)型号:WDZC-YJY (3)规格:4×25+1×16mm ² (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV	个	2.000	52.13	54.80			6.80	6.82		10.85	131.40
247.1	30409223	1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm ²)	个	2.000	52.13	54.80			6.80	6.82		10.85	131.40
248	030411004009	配线 (1)名称:软导线 (2)型号:ZC-RVV (3)规格:2×4mm ² (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:线槽	m	1099.000	0.83	1.12			0.12	0.12		0.20	2.39
248.1	30413106T	线槽配线(多芯软导线(芯以内) ZC-RVV-2×4	m单线	1099.000	0.83	1.12			0.12	0.12		0.20	2.39

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第60页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
249	030408003001	电缆保护管 (1)名称:电管 (2)规格:PE32 (3)材质:塑料	m	373.000	2.12	2.08		0.09	0.27	0.27		0.43	5.26
249.1	30409035T	电管PE32	m	373.000	2.12	2.08		0.09	0.27	0.27		0.43	5.26
250	030408003002	电缆保护管 (1)名称:电管 (2)规格:PE75 (3)材质:塑料	m	600.000	2.66	5.17		0.09	0.50	0.51		0.80	9.73
250.1	30409036T	电管PE75	m	600.000	2.66	5.17		0.09	0.50	0.51		0.80	9.73
251	040805004012	景观照明灯 (1)庭院灯H=3.5m 50W LED灯 AC220V 4000K IP65 (2)C20基础(预拌非泵送普通混凝土) (3)镀锌扁钢-25*4 (4)镀锌扁钢-40*4 L=110 (5)角钢接地极	套	45.000	291.40	1600.84		35.01	122.57	122.98		195.54	2368.34
251.1	40905116T	庭院灯H=3.5m 36W LED灯 AC220V 4000K IP65	套	1.000	241.13	1557.84		25.40	116.03	116.42		185.11	2241.93
251.2	40902067T	基础制作(C20预拌非泵送普通混凝土基础)	m3		132.03	374.88		43.84	35.03	35.15		55.88	676.81
251.3	40906007T	镀锌扁钢-25*4	m	1.000	16.83	3.39		0.22	1.30	1.30		2.07	25.11
251.4	40906007T	镀锌扁钢-40*4 L=110	m		16.83	3.39		0.22	1.30	1.30		2.07	25.11
251.5	40906003	接地极(板)制作安装(角钢接地极 普通土)	根	1.000	33.44	39.61		9.39	5.24	5.26		8.36	101.30
252	040805004011	景观照明灯 (1)草坪灯 10W LED灯 AC220V 4000K IP65 (2)C20基础(预拌非泵送普通混凝土) (3)镀锌扁钢-25*4 (4)镀锌扁钢-40*4 L=110 (5)角钢接地极	套	12.000	236.05	896.42		53.67	75.44	75.69		120.34	1457.61
252.1	30414270T	草坪灯 10W LED灯 AC220V 4000K IP65	套	1.000	36.92	475.15			32.57	32.68		51.96	629.28
252.2	40902067T	基础制作(C20预拌非泵送普通混凝土基础)	m3	1.000	132.03	374.88		43.84	35.03	35.15		55.88	676.81
252.3	40906007T	镀锌扁钢-25*4	m	1.000	16.83	3.39		0.22	1.30	1.30		2.07	25.11

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第61页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
252.4	40906007T	镀锌扁钢-40*4 L=110	m	1.000	16.83	3.39		0.22	1.30	1.30		2.07	25.11
252.5	40906003	接地极（板）制作安装(角钢接地极 普通土)	根	1.000	33.44	39.61		9.39	5.24	5.26		8.36	101.30
253	030412001015	普通灯具 (1)名称:LED洗墙灯A(1000mm) (2)参数:25° ×40° ，色温3000K, 电压24V ，功率24W,光源：LED，IP66	套	76.000	23.36	353.60			23.97	24.06		38.25	463.24
253.1	30414281	LED洗墙灯A(1000mm) 25° ×40° ，色温 3000K, 电压24V ，功率24W,光源：LED，IP66	m	76.000	23.36	353.60			23.97	24.06		38.25	463.24
254	030412001033	普通灯具 (1)名称:LED壁灯 (2)参数:25° ，色温3000K, 电压AV24V, 功率 6W,光源：LED，IP66	套	85.000	8.73	270.95			17.79	17.85		28.38	343.70
254.1	30414166T	LED壁灯 25° ，色温3000K, 电压AV24V, 功率 6W,光源：LED，IP66	套	85.000	8.73	270.95			17.79	17.85		28.38	343.70
255	030412001034	普通灯具 (1)名称:射树灯A (2)参数:防护等级:IP67 功率:24W/AC220V 光 源:LED灯 色温:3000K 材料:灯体为压铸铝 (3)透光罩为钢化玻璃 (4)光束角度可调 带蜂窝防眩罩	套	12.000	33.50	139.83			11.02	11.06		17.59	213.00
255.1	30414275T	射树灯A IP67 功率:24W/AC220V 光源:LED灯 色温:3000K 材料:灯体为压铸铝	套	12.000	33.50	139.83			11.02	11.06		17.59	213.00
256	030503003001	控制器 (1)名称：4路时控器	台/套	1.000	58.97	1810.73	1800.00	1.21	4.51	4.53		169.20	2049.15
256.1	30503195	4路时控器	台	1.000	58.97	1810.73	1800.00	1.21	4.51	4.53		169.20	2049.15
257	030501009001	路由器 (1)名称：4G四路无线智能终端	台/套	1.000	117.95	2819.08	2800.00	4.10	8.98	9.01		266.32	3225.44
257.1	30501065T	4G四路无线智能终端	台	1.000	117.95	2819.08	2800.00	4.10	8.98	9.01		266.32	3225.44
258	040504001019	砌筑井 (1)混凝土井盖700*700 (2)C15混凝土垫层 (3)侧墙：采用水泥砖Mn15，M7.5砂浆砌筑。	座	10.000	485.01	801.53		5.71	82.18	82.48		131.12	1588.03

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第62页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		井壁内外采用1:2.5水泥砂浆抹面10mm厚。											
258.1	40501040T	井盖、井算安装(检查井井盖、座 混凝土)700*700	套	1.000	46.59	155.03			12.82	12.87		20.46	247.77
258.2	40501007T	砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)	m3	1.000	209.71	303.90		4.21	32.93	33.05		52.54	636.34
258.3	40501026T	勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井底)	m2		17.33	6.24		0.40	1.52	1.53		2.43	29.45
258.4	40501025T	勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧)	m2	2.000	26.67	6.24		0.40	2.12	2.13		3.38	40.94
258.5	40501005T	C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	1.000	175.37	330.12		0.70	32.19	32.30		51.36	622.04
259	040101002026	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内	m3	685.000	0.40			3.63	0.26	0.26		0.41	4.96
259.1	40101008T	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%	m3		52.11				3.31	3.33		5.29	64.04
259.2	40101058	挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土)	m3	1.000	0.40			3.63	0.26	0.26		0.41	4.96
260	040103001043	填方 (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土 (3)密实度要求:按设计要求 (4)填方材料品种:	m3	386.000	2.62	0.36		3.71	0.43	0.43		0.68	8.23
260.1	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填碾压)	m3	386.000	2.62	0.36		3.71	0.43	0.43		0.68	8.23
261	03B001	充电桩设备 (1)充电桩设备	个	6.000		12500.00			795.00	797.70		1268.34	15361.04
261.1	03B001T	充电桩设备	个	6.000		12500.00			795.00	797.70		1268.34	15361.04
监控工程													
262	030501010001	收发器 (1)光纤收发器	台/套	10.000	176.92	461.81	450.00	86.72	26.69	18.13		69.32	839.59
262.1	30501075	光纤收发器	台	10.000	176.92	461.81	450.00	86.72	26.69	18.13		69.32	839.59
263	030501012007	交换机 (1)8口千兆交换机	台/套	3.000	1061.51	497.88	480.00	40.96	108.56	73.73		160.44	1943.08
263.1	30501088	8口千兆交换机	台	3.000	1061.51	497.88	480.00	40.96	108.56	73.73		160.44	1943.08

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第63页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
264	030501012006	交换机 (1)4口POE交换机	台/套	7.000	1061.51	377.88	360.00	40.96	108.56	73.73		149.64	1812.28
264.1	30501088T	4口POE交换机	台	7.000	1061.51	377.88	360.00	40.96	108.56	73.73		149.64	1812.28
265	030507008003	监控摄像设备 (1)枪式彩色摄像机 (2)摄像机抱杆支架	台	41.000	181.05	968.18	885.00	1.28	25.73	17.47		107.44	1301.15
265.1	30507087T	枪式彩色摄像机	台	41.000	133.87	888.95	885.00	1.28	13.48	9.15		94.21	1140.94
265.2	30507103T	摄像机抱杆支架	套	41.000	47.18	79.23			12.25	8.32		13.23	160.21
266	030507008004	监控摄像设备 (1)监控摄像设备(监控设备立杆 杆长3.5m)	台	41.000	401.36	546.61		321.74	123.03	83.56		132.87	1609.17
266.1	30507112T	监控摄像设备(监控设备立杆 杆长3.5m)	根	41.000	401.36	546.61		321.74	123.03	83.56		132.87	1609.17
267	030502001003	机柜、机架 (1)监控设备柜	台	10.000	235.89	856.92		91.50	114.76	77.94		123.93	1500.94
267.1	30502001T	监控设备柜	台	10.000	235.89	856.92		91.50	114.76	77.94		123.93	1500.94
268	030507014001	显示设备 (1)42寸液晶显示器 (2)监视器配件（支架、高清线）	台	1.000	141.54	3558.09	3180.00	1.21	50.46	34.27		340.70	4126.27
268.1	30506177	42寸液晶显示器	台	1.000	94.36	3183.86	3180.00	1.21	9.63	6.54		296.60	3592.20
268.2	30506182T	监视器配件（支架、高清线）	台	1.000	47.18	374.23			40.83	27.73		44.10	534.07
269	030502001004	机柜、机架 (1)前端设备柜	台	1.000	76.66	168.57		0.13	23.78	16.15		25.68	310.97
269.1	30502002T	前端设备柜	台	1.000	76.66	168.57		0.13	23.78	16.15		25.68	310.97
270	030507013001	录像设备 (1)嵌入式网络硬盘录像机	台/套	1.000	353.84	3574.03	3560.00	15.66	37.16	25.24		360.53	4366.46
270.1	30507138	嵌入式网络硬盘录像机	台	1.000	353.84	3574.03	3560.00	15.66	37.16	25.24		360.53	4366.46
271	030501004001	存储设备 (1)监控专用硬盘	台	8.000	29.49	1154.74	1150.00	0.82	3.40	2.31		107.17	1297.93
271.1	30501038	监控专用硬盘	台	8.000	29.49	1154.74	1150.00	0.82	3.40	2.31		107.17	1297.93
272	030501012008	交换机 (1)24口千兆交换机	台/套	3.000	353.84	2119.08	2100.00	10.24	37.13	25.22		229.10	2774.61

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第64页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
272.1	30501085T	24口千兆交换机	台	3.000	353.84	2119.08	2100.00	10.24	37.13	25.22		229.10	2774.61
273	030502005003	双绞线缆 (1)双绞线缆(管内穿放 ≤4对) CAT5E	m	1872.000	1.53	2.45		0.03	0.39	0.26		0.42	5.08
273.1	30502021T	双绞线缆(管内穿放 ≤4对) CAT5E	m	1872.000	1.53	2.45		0.03	0.39	0.26		0.42	5.08
274	030502005004	双绞线缆 (1)双绞线缆(管内穿放 ≤4对) CAT6E	m	669.000	1.53	3.07		0.03	0.45	0.30		0.48	5.86
274.1	30502021T	双绞线缆(管内穿放 ≤4对) CAT6E	m	669.000	1.53	3.07		0.03	0.45	0.30		0.48	5.86
275	030411001001	配管 (1)埋地敷设 PVC20	m	933.000	5.09	3.78			0.86	0.58		0.93	11.24
275.1	30412193T	埋地敷设 PVC20	m	933.000	5.09	3.78			0.86	0.58		0.93	11.24
276	030411004012	配线 (1)穿多芯软导线 RVV-2×1.5	m	1808.000	0.85	5.08			0.57	0.39		0.62	7.51
276.1	30413040T	穿多芯软导线 RVV-2×1.5	m	1808.000	0.85	5.08			0.57	0.39		0.62	7.51
277	030411004013	配线 (1)穿多芯软导线 RVV-2×1.0	m	130.000	0.85	4.36			0.50	0.34		0.54	6.59
277.1	30413039T	穿多芯软导线 RVV-2×1.0	m	130.000	0.85	4.36			0.50	0.34		0.54	6.59
278	030411006001	接线盒 (1)接线盒安装(暗装接线盒)	个	52.000	3.65	2.36			0.58	0.40		0.63	7.62
278.1	30413193	接线盒安装(暗装接线盒)	个	52.000	3.65	2.36			0.58	0.40		0.63	7.62
279	010501006001	设备基础 (1)基础制作(C20混凝土基础) (2)基础制作(C30混凝土基础) (3)素混凝土垫层 C15 (4)基础制作(地脚螺栓安装) (5)钢筋、铁件(铁件制作) (6)钢筋、铁件(铁件安装) (7)接地母线敷设(户内接地母线敷设) (8)接地极(板)制作与安装(圆钢接地极 普通土)	m3	5.000	335.17	922.78		104.59	132.02	89.70		142.56	1726.81
279.1	40902067	基础制作(C20混凝土基础)	m3		132.03	305.49		53.61	47.59	32.32		51.39	622.43
279.2	40902067T	基础制作(C30混凝土基础)	m3	5.000	132.03	314.82		53.61	48.49	32.94		52.37	634.26

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第65页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
279.3	40501053T	素混凝土垫层 C15	m3	3.000	58.11	257.59		0.70	30.66	20.82		33.11	400.99
279.4	40902065T	基础制作(地脚螺栓安装)	t	0.100	1440.72	6492.23		355.79	803.18	545.52		867.37	10504.81
279.5	30411154	钢筋、铁件(铁件制作)	t	0.010	1413.94	4021.57		328.73	558.55	379.37		603.19	7305.35
279.6	30411155	钢筋、铁件(铁件安装)	t	0.010	820.19	122.59		176.49	108.46	73.66		117.13	1418.52
279.7	30410058	接地母线敷设(户内接地母线敷设)	m	26.000	9.68	7.20		0.54	1.69	1.15		1.82	22.08
279.8	30410054	接地极(板)制作与安装(圆钢接地极 普通土)	根	26.000	16.28	53.43		7.62	7.49	5.09		8.09	98.00
280	010101004002	挖基坑土方 (1)基坑土方施工(普通土 挖深≤2m)	m3	21.000	42.35			2.14	4.31	2.93		4.66	56.39
280.1	30411051	基坑土方施工(普通土 挖深≤2m)	m3	21.000	42.35			2.14	4.31	2.93		4.66	56.39
281	010103001013	回填方 (1)回填工程(填土人工夯实 槽坑)	m3	14.000	11.77	0.05			1.15	0.78		1.24	14.99
281.1	10101101	回填工程(填土人工夯实 槽坑)	m3	14.000	11.77	0.05			1.15	0.78		1.24	14.99
282	030507017001	安全防范分系统调试 (1)安全防范分系统调试(电视监控系统 ≤50台)	系统	1.000	4912.08			31.61	479.04	325.36		517.33	6265.42
282.1	30507181	安全防范分系统调试(电视监控系统 ≤50台)	系统	1.000	4912.08			31.61	479.04	325.36		517.33	6265.42
283	030502019001	双绞线缆测试 (1)测试(4对双绞线缆)	链路/ 点	26.000	5.90	0.08		4.91	1.06	0.72		1.14	13.81
283.1	30502078	测试(4对双绞线缆)	链路	26.000	5.90	0.08		4.91	1.06	0.72		1.14	13.81
农村休闲文化设施													
1. 水利文化园													
园林建筑													
284	050201001007	园路 (1)1000*500*30厚芝麻白荔枝面 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实, 夯实度≥93%	m2	325.000	90.42	160.32		1.42	16.04	16.08		25.59	309.87

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第66页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
284.1	50103036T	1000*500*30厚芝麻白荔枝面	m2	325.000	66.06	100.16		1.19	10.65	10.68		16.99	205.73
284.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	33.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
284.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	49.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
284.4	50103001	园路路基整理路床	m2	325.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
285	050201001006	园路 (1)600*300*30厚芝麻黑烧面 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实, 夯实度≥93%	m2	109.000	104.13	187.46		1.21	18.62	18.69		29.71	359.82
285.1	50103048T	600*300*30厚芝麻黑烧面	m2	109.000	69.57	104.19		0.88	11.11	11.15		17.72	214.62
285.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	11.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
285.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	33.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
285.4	50103001	园路路基整理路床	m2	109.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
286	050201001008	园路 (1)边长200~600 30厚芝麻白荔枝面碎拼 (2)5厚纯水泥膏一道 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20混凝土结构层 (5)150厚碎石灌砂垫层 (6)素土夯实, 夯实度≥93%	m2	68.000	97.78	154.81		0.93	16.12	16.17		25.73	311.55
286.1	50103044T	边长200~600 30厚芝麻白荔枝面碎拼	m2	68.000	73.58	94.70		0.71	10.75	10.78		17.15	207.67
286.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	7.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
286.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	10.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
286.4	50103001	园路路基整理路床	m2	68.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
287	011107001002	石材台阶面 (1)600*330*70厚芝麻白荔枝面踏面 (2)600*150*25厚芝麻灰荔枝面踢面 (3)5厚纯水泥膏一道 (4)30厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层	m2	36.000	203.16	323.45		8.82	34.05	34.16		54.33	657.98

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第67页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(5)120厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实（夯实度≥93%）											
287.1	50103078T	台阶(花岗岩)	m2	36.000	112.33	253.89		8.17	23.81	23.89		37.99	460.08
287.2	50103074T	C20台阶(预拌非泵送普通混凝土)	m3	4.000	667.79	434.19		4.98	70.40	70.64		112.32	1360.32
287.3	50103002	垫层(碎石灌砂)	m3	5.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
287.4	50103001	园路路基整理路床	m2	36.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
288	050305006001	石桌石凳	个	1.000	43.88	1809.81		136.52	126.58	127.01		201.94	2445.74
288.1	50106040T	C20预拌非泵送普通混凝土成品桌椅安装(自然石桌椅 安装)	套	1.000	43.88	9.81		136.52	12.10	12.14		19.30	233.75
288.2	05B001	石桌石凳	套	1.000		1800.00			114.48	114.87		182.64	2211.99
289	050307019001	其他景观小摆设 (1)漫步机	个	2.000		1200.00			76.32	76.58		121.76	1474.66
289.1	05B001T	漫步机	个	2.000		1200.00			76.32	76.58		121.76	1474.66
290	050307019002	其他景观小摆设 (1)肩关节康复器	个	2.000		1000.00			63.60	63.82		101.47	1228.89
290.1	05B001T	肩关节康复器	个	2.000		1000.00			63.60	63.82		101.47	1228.89
291	050307019003	其他景观小摆设 (1)高低杠	个	1.000		800.00			50.88	51.05		81.17	983.10
291.1	05B001T	高低杠	个	1.000		800.00			50.88	51.05		81.17	983.10
292	020510004004	坐凳面 (1)600*400/500*50厚芝麻白光面 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)240*60*10厚红砖贴片 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实（夯实度≥93%）	m2	25.000	395.44	447.97		3.58	53.85	54.04		85.94	1040.82
292.1	10111121T	600*400/500*50厚芝麻白光面	m2	25.000	98.79	148.40		0.68	15.76	15.82		25.15	304.60
292.2	10104001	实心砖墙(实心标准砖墙)	m3	12.000	323.53	239.48		4.66	36.10	36.23		57.60	697.60

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第68页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
292.3	10112084	外墙面面砖(每块面积≤0.01m ² 水泥砂浆粘贴面砖灰缝5mm)	m ²	28.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
292.4	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m ³	5.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
292.5	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m ³	8.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
292.6	50103001	园路路基整理路床	m ²	55.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
景墙1													
293	010101003007	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内	m ³	44.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
293.1	10101018	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内)	m ³	44.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
294	010103001006	回填方 (1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m ³	25.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
294.1	10101103	回填工程(填土机械夯实 槽坑)	m ³	25.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
295	010103002002	余方弃置 (1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m ³	15.000	0.18			20.99	1.35	1.35		2.15	26.02
295.1	10101086T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内)	m ³	15.000	0.18			20.99	1.35	1.35		2.15	26.02
296	010404001003	垫层 (1)15cm灰土垫层	m ³	3.000	50.03	182.60		1.20	14.87	14.92		23.73	287.35
296.1	10104068	灰土垫层	m ³	3.000	50.03	182.60		1.20	14.87	14.92		23.73	287.35
297	010501001006	垫层 (1)100厚C20混凝土垫层	m ³	2.000	65.31	344.34			26.05	26.14		41.56	503.40
297.1	10105001T	基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层)	m ³	2.000	48.64	344.34			24.99	25.08		39.87	482.92
297.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m ³	2.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
298	010503001006	基础梁 (1)非泵送 (2)C25	m ³	4.000	55.34	353.36			25.99	26.08		41.47	502.24
298.1	10105015T	C25预拌非泵送普通混凝土(基础梁)	m ³	4.000	38.67	353.36			24.93	25.02		39.78	481.76
298.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m ³	4.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第69页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
299	010507005003	压顶 (1)非泵送 (2)C25	m3	2.000	216.68	356.80			36.47	36.60		58.19	704.74
299.1	10105043T	其他构件(C25预拌非泵送普通混凝土 扶手、压顶)	m3	2.000	216.68	356.80			36.47	36.60		58.19	704.74
300	010502001002	矩形柱 (1)非泵送 (2)C25	m3	3.000	70.55	341.37			26.20	26.28		41.79	506.19
300.1	10105011T	C25预拌非泵送普通混凝土(独立矩形柱)	m3	3.000	53.88	341.37			25.14	25.22		40.10	485.71
300.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	3.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
301	010401003003	实心砖墙 (1)清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	8.000	304.17	339.39		0.59	40.97	41.11		65.36	791.59
301.1	20303049T	清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	8.000	304.17	339.39		0.59	40.97	41.11		65.36	791.59
302	011201004002	立面砂浆找平层 (1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	70.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
302.1	10112018T	外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙20mm厚)	m2	70.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
303	011204003003	块料墙面 (1)600*150*15厚红色大小拼天然文化石	m2	6.000	51.84	58.87		0.16	7.05	7.08		11.25	136.25
303.1	10112156	瓷板、文化石(外墙面瓷板 每块面积≤0.025m2 水泥砂浆粘贴)	m2	6.000	51.84	58.87		0.16	7.05	7.08		11.25	136.25
304	011204003004	块料墙面 (1)240*60*10厚红砖贴片	m2	65.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
304.1	10112084	外墙面面砖(每块面积≤0.01m2 水泥砂浆粘贴面砖灰缝5mm)	m2	65.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
305	010515001013	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ8	t	0.680	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
305.1	10105067T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	0.680	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
306	010515001014	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ10	t	1.590	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第70页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
306.1	10105067	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	1.590	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
307	011508005002	吸塑字 (1)字宽30,3厚PVC蓝色广告字,余同	个 (套)	8.000		120.00	120.00					10.80	130.80
307.1	01B001	字宽30,3厚PVC蓝色广告字	个	8.000		120.00	120.00					10.80	130.80
308	011502008001	GRC装饰线条 (1)GBR白色造型线条	m	26.000	37.31	82.06		0.39	7.62	7.64		12.15	147.17
308.1	10115075	其他装饰线(GRC欧式装饰线 外挂腰线板 宽×高 ≤400×400)	m	26.000	37.31	82.06		0.39	7.62	7.64		12.15	147.17
景墙2													
309	010101003008	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内	m3	31.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
309.1	10101018	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内)	m3	31.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
310	010103001007	回填方 (1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	18.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
310.1	10101103	回填工程(填土机械夯实 槽坑)	m3	18.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
311	010103002003	余方弃置 (1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m3	10.000	0.18			20.99	1.35	1.35		2.15	26.02
311.1	10101086T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内)	m3	10.000	0.18			20.99	1.35	1.35		2.15	26.02
312	010404001004	垫层 (1)15cm灰土垫层	m3	1.000	50.03	182.60		1.20	14.87	14.92		23.73	287.35
312.1	10104068	灰土垫层	m3	1.000	50.03	182.60		1.20	14.87	14.92		23.73	287.35
313	010501001007	垫层 (1)100厚C20混凝土垫层	m3	1.000	65.31	344.34			26.05	26.14		41.56	503.40
313.1	10105001T	基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层)	m3	1.000	48.64	344.34			24.99	25.08		39.87	482.92
313.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	1.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
314	010503001007	基础梁 (1)非泵送	m3	1.000	55.34	353.36			25.99	26.08		41.47	502.24

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第71页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(2)C25											
314.1	10105015T	C25预拌非泵送普通混凝土(基础梁)	m3	1.000	38.67	353.36			24.93	25.02		39.78	481.76
314.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	1.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
315	010507005004	压顶 (1)非泵送 (2)C25	m3										
315.1	10105043T	其他构件(C25预拌非泵送普通混凝土 扶手、压顶)	m3		216.68	356.80			36.47	36.60		58.19	704.74
316	010401003004	实心砖墙 (1)清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	3.000	304.17	339.39		0.59	40.97	41.11		65.36	791.59
316.1	20303049T	清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	3.000	304.17	339.39		0.59	40.97	41.11		65.36	791.59
317	011201004003	立面砂浆找平层 (1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	22.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
317.1	10112018T	外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙20mm厚)	m2	22.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
318	011204003008	块料墙面 (1)240*60*10厚红砖贴片	m2	20.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
318.1	10112084	外墙面面砖(每块面积≤0.01m2 水泥砂浆粘贴面砖灰缝5mm)	m2	20.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
319	010515001017	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ8	t	0.390	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
319.1	10105067T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	0.390	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
320	010515001018	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ10	t	0.980	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
320.1	10105067	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	0.980	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
321	011508005003	吸塑字 (1)字宽30,3厚PVC蓝色广告字,余同	个 (套、	16.000		180.00	180.00					16.20	196.20
321.1	01B001T	字宽30,3厚PVC蓝色广告字	个	16.000		180.00	180.00					16.20	196.20
322	011108001002	石材零星项目 (1)600*300*100厚芝麻白荔枝面压顶	m2	3.000	98.79	254.40		0.68	22.51	22.58		35.91	434.87

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第72页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
322.1	10111121T	600*300*100厚芝麻白荔枝面压顶	m2	3.000	98.79	254.40		0.68	22.51	22.58		35.91	434.87
景墙3													
323	010101003009	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内	m3	33.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
323.1	10101018	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内)	m3	33.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
324	010103001008	回填方 (1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	21.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
324.1	10101103	回填工程(填土机械夯实 槽坑)	m3	21.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
325	010103002004	余方弃置 (1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m3	9.000	0.18			20.99	1.35	1.35		2.15	26.02
325.1	10101086T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内)	m3	9.000	0.18			20.99	1.35	1.35		2.15	26.02
326	010404001005	垫层 (1)15cm灰土垫层	m3	1.000	50.03	182.60		1.20	14.87	14.92		23.73	287.35
326.1	10104068	灰土垫层	m3	1.000	50.03	182.60		1.20	14.87	14.92		23.73	287.35
327	010501001008	垫层 (1)100厚C20混凝土垫层	m3	1.000	65.31	344.34			26.05	26.14		41.56	503.40
327.1	10105001T	基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层)	m3	1.000	48.64	344.34			24.99	25.08		39.87	482.92
327.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	1.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
328	010503001008	基础梁 (1)非泵送 (2)C25	m3	1.000	55.34	353.36			25.99	26.08		41.47	502.24
328.1	10105015T	C25预拌非泵送普通混凝土(基础梁)	m3	1.000	38.67	353.36			24.93	25.02		39.78	481.76
328.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	1.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
329	010507005005	压顶 (1)非泵送 (2)C25	m3										
329.1	10105043T	其他构件(C25预拌非泵送普通混凝土 扶手、	m3		216.68	356.80			36.47	36.60		58.19	704.74

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第73页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		压顶)											
330	010401003005	实心砖墙 (1)清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	6.000	304.17	339.39		0.59	40.97	41.11		65.36	791.59
330.1	20303049T	清水标准砖墙 (240mm以内)	m3	6.000	304.17	339.39		0.59	40.97	41.11		65.36	791.59
331	011201004004	立面砂浆找平层 (1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	53.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
331.1	10112018T	外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚)	m2	53.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
332	011204003009	块料墙面 (1)240*60*10厚红砖贴片	m2	53.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
332.1	10112084	外墙面面砖(每块面积≤0.01m2 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝5mm)	m2	53.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
333	010515001021	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ8	t	0.410	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
333.1	10105067T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	0.410	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
334	010515001022	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ10	t	1.090	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
334.1	10105067	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	1.090	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
335	011508005004	吸塑字 (1)字宽30,3厚PVC蓝色广告字,余同	个 (套	35.000		180.00	180.00					16.20	196.20
335.1	01B001T	字宽30,3厚PVC蓝色广告字	个	35.000		180.00	180.00					16.20	196.20
336	011108001003	石材零星项目 (1)600*300*100厚芝麻白荔枝面压顶	m2	3.000	98.79	254.40		0.68	22.51	22.58		35.91	434.87
336.1	10111121T	600*300*100厚芝麻白荔枝面压顶	m2	3.000	98.79	254.40		0.68	22.51	22.58		35.91	434.87
337	011207001007	墙面装饰板 (1)3厚热镀锌钢板,黑色氟碳漆饰面 (2)文字UV打印	m2	14.000	56.36	154.41		2.34	13.55	13.60		21.62	261.88
337.1	10112241T	墙面饰面(镀锌钢板墙面)	m2	14.000	56.36	154.41		2.34	13.55	13.60		21.62	261.88
廊架													
338	010101003006	挖沟槽土方	m3	32.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第74页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(1) 三类土 (2) 2m以内											
338.1	10101018	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内)	m3	32.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
339	010103001005	回填方 (1) 原土回填 (2) 压实度详设计及规范要求	m3	13.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
339.1	10101103	回填工程(填土机械夯实 槽坑)	m3	13.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
340	010501001005	垫层 (1) 100厚C20混凝土垫层	m3	2.000	65.31	344.34			26.05	26.14		41.56	503.40
340.1	10105001T	基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层)	m3	2.000	48.64	344.34			24.99	25.08		39.87	482.92
340.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	2.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
341	010501003001	独立基础 (1) 非泵送 (2) C25	m3	5.000	51.55	352.13			25.67	25.76		40.96	496.07
341.1	10105003T	C25预拌非泵送普通混凝土(独立基础)	m3	5.000	34.88	352.13			24.61	24.70		39.27	475.59
341.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	5.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
342	010502001001	矩形柱 (1) 非泵送 (2) C25	m3	2.000	70.55	350.77			26.80	26.88		42.75	517.75
342.1	10105011T	C25预拌非泵送普通混凝土(独立矩形柱)	m3	2.000	53.88	350.77			25.74	25.82		41.06	497.27
342.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	2.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
343	010503001005	基础梁 (1) 非泵送 (2) C25	m3	5.000	55.34	353.36			25.99	26.08		41.47	502.24
343.1	10105015T	C25预拌非泵送普通混凝土(基础梁)	m3	5.000	38.67	353.36			24.93	25.02		39.78	481.76
343.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	5.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
344	010515001010	现浇构件钢筋 (1) HRB400E Φ10	t	0.060	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.50
344.1	10105067	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径≤10mm)	t	0.060	1086.03	3624.47		19.45	300.82	301.85		479.94	5812.56
345	010515001011	现浇构件钢筋	t	0.170	863.19	3457.15		58.98	278.52	279.47		444.36	5381.65

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第75页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(1)HRB400EΦ14											
345.1	10105068T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm)	t	0.170	863.19	3457.15		58.98	278.52	279.47		444.36	5381.67
346	010515001012	现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ18	t	0.170	863.19	3457.15		58.98	278.52	279.47		444.36	5381.65
346.1	10105068T	现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm)	t	0.170	863.19	3457.15		58.98	278.52	279.47		444.36	5381.67
347	010603003001	钢管柱 (1)镀锌钢管柱 (2)制安,含半成品运输	t	3.590	1787.65	5977.18		856.77	548.34	550.20		874.81	10594.95
347.1	10302013T	钢柱制作(钢板柱制作 箱型 最大钢板厚20mm以内)	t	3.590	1223.46	5534.15		671.29	472.48	474.08		753.79	9129.25
347.2	10302127	钢柱安装(3.0t以内)	t	3.590	541.41	436.88		81.26	67.39	67.62		107.51	1302.07
347.3	10302198	金属构件运输(一类金属构件 运距10km以内)	t	3.590	22.78	6.15		104.22	8.47	8.50		13.51	163.63
348	011405001004	金属面油漆 (1)面饰香槟金氟碳漆	m2	311.000	58.14	28.21			5.49	5.51		8.76	106.11
348.1	10114116	金属面其他油漆(金属面 氟碳漆)	m2	311.000	58.14	28.21			5.49	5.51		8.76	106.11
349	010901002003	型材屋面 (1)2.5厚白色铝单板	m2	138.000	23.39	240.80		0.87	16.86	16.92		26.90	325.74
349.1	10109025T	2.5厚白色铝单板	m2	138.000	23.39	240.80		0.87	16.86	16.92		26.90	325.74
给水工程													
350	040101002028	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内	m3	57.000	3.12			2.86	0.58	0.40		0.63	7.59
350.1	40101008T	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%	m3	3.000	52.11				5.05	3.43		5.45	66.04
350.2	40101055	挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土)	m3	54.000	0.40			3.02	0.33	0.23		0.36	4.34
351	040103001050	填方 (1)符合设计要求 (2)机制砂 (3)符合设计要求	m3	13.000	2.12	80.08		1.82	8.14	5.53		8.79	106.48

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
351.1	40101108T	槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实)	m3	13.000	2.12	80.08		1.82	8.14	5.53		8.79	106.48
352	040103001051	填方 (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求	m3	30.000	2.62	0.36		3.71	0.65	0.44		0.70	8.48
352.1	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填碾压)	m3	30.000	2.62	0.36		3.71	0.65	0.44		0.70	8.48
353	010103002007	余方弃置 (1)废弃料品种:原土余方 (2)运距:运距自行考虑	m3	22.000	0.18			20.99	2.05	1.39		2.21	26.82
353.1	10101086T	自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内)	m3	22.000	0.18			20.99	2.05	1.39		2.21	26.82
354	031001006055	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN25 (3)1.25Mpa	m	62.000	6.47	4.82		0.01	1.09	0.74		1.18	14.31
354.1	31001237T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内	m	62.000	6.47	4.82		0.01	1.09	0.74		1.18	14.31
355	031001006056	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN32 (3)1.25Mpa	m	31.000	6.47	5.69		0.01	1.18	0.80		1.27	15.42
355.1	31001237T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内	m	31.000	6.47	5.69		0.01	1.18	0.80		1.27	15.42
356	031003013004	水表 (1)水表组(闸阀 DN80 2个, 水表LXS-80 1个, 防止倒流器 DN80 1个)	组/个	1.000	253.58	1668.83		9.26	187.18	127.13		202.14	2448.12
356.1	31005324T	水表组(水表1个、蝶阀2个、止回阀1个、伸缩接头1个)	组	1.000	253.58	1668.83		9.26	187.18	127.13		202.14	2448.12
357	030901003001	水喷淋(雾)喷头 (1)水喷淋(雾)喷头	个	3.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
357.1	31005489T	喷泉喷头(普通喷头 洒水栓 DN25)	个	3.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
358	040504001024	砌筑井 (1)C15混凝土垫层 (2)C25现浇底板 (3)C25预拌非泵送细石混凝土盖板	座	1.000	921.38	2002.57		19.68	285.26	193.73		308.04	3730.65

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第77页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(4)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (5)预制混凝土(圆钢筋 Φ10以外) (6)井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (7)井盖、井箅安装(安全防坠网) (8)井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步) (9)05S502 16页											
358.1	40501005T	C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3		175.37	330.12		0.70	49.05	33.31		52.97	641.52
358.2	40501005T	C25预拌非泵送普通混凝土现浇底板	m3	1.000	175.37	366.30		0.70	52.56	35.70		56.76	687.39
358.3	40501104T	C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)	m3		327.83	487.53		0.32	79.04	53.68		85.36	1033.76
358.4	40501114	安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内))	m3		115.85	18.94		22.19	15.21	10.33		16.43	198.95
358.5	40501007	砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)	m3	3.000	209.71	303.90		4.21	50.18	34.08		54.19	656.27
358.6	40304007T	现浇混凝土(螺纹钢 钢筋 Φ10以外)	t	0.060	598.45	3497.49		61.88	402.89	273.64		435.09	5269.44
358.7	40304002	预制混凝土(圆钢筋 Φ10以外)	t		701.64	3687.33		92.55	434.26	294.95		468.97	5679.70
358.8	40304003T	预制混凝土(螺纹钢 钢筋 Φ10以外)	t	0.040	578.95	3507.25		65.86	402.33	273.26		434.49	5262.14
358.9	40501039T	井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁)	套	1.000	51.39	374.43			41.26	28.02		44.56	539.66
358.10	40501045	井盖、井箅安装(塑钢爬梯踏步)	步	3.000	2.14				0.21	0.14		0.22	2.71
3. 无动力公园													
园林建筑													
359	050201001009	园路 (1)13厚EPDM现浇 (2)塑胶地面粘合剂 (3)30厚1:3水泥砂浆找平层 (4)180厚C25混凝土垫层 (5)200厚级配碎石垫层 (6)素土夯实，夯实度≥93%	m2	608.000	69.99	260.35		1.21	21.09	21.15		33.64	407.44
359.1	50103013T	塑胶面层(塑胶地毯)	m2	608.000	27.52	152.18			11.43	11.47		18.23	220.83
359.2	10111002T	水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上30mm厚)	m2	608.000	17.93	9.15		0.88	1.78	1.78		2.84	34.36

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第78页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
359.3	50103006T	C25垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	109.000	68.19	374.44		1.17	28.23	28.32		45.03	545.38
359.4	50103005T	垫层(碎石)	m3	122.000	25.13	158.95		0.60	11.75	11.79		18.74	226.96
359.5	50103001	园路路基整理路床	m2	608.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
360	050201001010	园路 (1)面饰丙烯酸涂料 (2)20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 (3)120厚C20混凝土垫层 (4)150厚碎石灌沙垫层 (5)素土夯实（夯实度≥93%）	m2	63.000	134.42	102.28		1.28	15.13	15.18		24.15	292.44
360.1	10114156	外墙丙烯酸酯涂料(墙面 二遍)	m2	63.000	19.12	19.01			2.43	2.43		3.87	46.86
360.2	10111002	水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚)	m2	63.000	13.60	6.20		0.55	1.29	1.30		2.06	25.00
360.3	50103074T	C20台阶(预拌非泵送普通混凝土)	m3	8.000	667.79	434.19		4.98	70.40	70.64		112.32	1360.32
360.4	50103002	垫层(碎石灌砂)	m3	9.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
360.5	50103001	园路路基整理路床	m2	63.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
361	011502001002	金属装饰线 (1)M8膨胀螺栓固定，@500 (2)L50*50*8热镀锌角钢通长	m	275.000	7.11	21.80		0.19	1.85	1.86		2.95	35.76
361.1	10115044T	金属装饰线(不锈钢装饰线 角线 宽度 ≤ 50mm)	m	275.000	7.11	21.80		0.19	1.85	1.86		2.95	35.76
362	011107001003	石材台阶面 (1)600*330*70厚芝麻白荔枝面踏面 (2)600*110*25厚芝麻白荔枝面踢面 (3)5厚纯水泥膏一道 (4)30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 (5)120厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层 (7)素土夯实（夯实度≥93%）	m2	20.000	196.49	320.34		8.77	33.43	33.53		53.34	645.89
362.1	50103078T	台阶(花岗岩)	m2	20.000	112.33	253.89		8.17	23.81	23.89		37.99	460.08
362.2	50103074T	C20台阶(预拌非泵送普通混凝土)	m3	2.000	667.79	434.19		4.98	70.40	70.64		112.32	1360.32
362.3	50103002	垫层(碎石灌砂)	m3	3.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第79页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
362.4	50103001	园路路基整理路床	m2	20.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
363	040204004002	安砌侧（平、缘）石 (1)600*150*250高芝麻白机切面立路沿，一侧倒直，角10*10mm (2)20厚1：3干硬性水泥砂浆坐浆 (3)C20混凝土垫高层 (4)C15混凝土护肩	m	22.000	16.91	77.18		0.12	6.00	6.01		9.56	115.78
363.1	40204027T	侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座)	m	22.000	11.47	60.94			4.61	4.62		7.35	88.99
363.2	40204025T	C20侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座	m3	1.000	119.69	357.35		2.55	30.50	30.61		48.66	589.36
364	040204004003	安砌侧（平、缘）石 (1)120*280 通长C20混凝土高道牙 (2)外侧倒角R=15 (3)10厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 (4)面饰深蓝色丙烯酸涂料	m	50.000	16.26	83.27		0.10	6.34	6.35		10.11	122.43
364.1	40204027T	侧缘石安砌(路沿石(立缘石)安砌 截面半周长50cm以内 有基座)	m	50.000	11.47	68.98			5.12	5.13		8.16	98.86
364.2	40204025T	C20侧缘石预拌非泵送普通混凝土基座	m3	2.000	119.69	357.35		2.55	30.50	30.61		48.66	589.36
365	040205006004	标线 (1)100宽白色热熔漆画线 (2)热熔漆	m2	466.000	5.27	16.24		9.22	1.95	1.96		3.12	37.76
365.1	40205022	标线(分界线 热熔漆)	m2	466.000	5.27	16.24		9.22	1.95	1.96		3.12	37.76
366	05B055	玻璃钢坐凳 (1)玻璃钢坐凳	个	2.000		1500.00			95.40	95.72		152.20	1843.32
366.1	05B001	玻璃钢坐凳	个	2.000		1500.00			95.40	95.72		152.20	1843.32
367	020510004005	坐凳面 (1)600*400/500*50厚芝麻白光面 (2)1：3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1：3水泥砂浆粘结层 (4)240*60*10厚红砖贴片 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌沙垫层	m2	9.000	384.99	449.10		3.45	53.25	53.44		84.98	1029.22

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(7)素土夯实（夯实度≥93%）											
367.1	10111121T	600*400/500*50厚芝麻白光面	m2	9.000	98.79	148.40		0.68	15.76	15.82		25.15	304.60
367.2	10104001	实心砖墙(实心标准砖墙)	m3	4.000	323.53	239.48		4.66	36.10	36.23		57.60	697.60
367.3	10112084	外墙面面砖(每块面积≤0.01m2 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝5mm)	m2	10.000	80.50	55.87		0.18	8.68	8.71		13.85	167.79
367.4	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	2.000	68.19	364.59		1.17	27.60	27.69		44.03	533.27
367.5	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	3.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
367.6	50103001	园路土基整理路床	m2	19.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
368	05B052	户外白色不锈钢“鲸鱼”滑梯意向图 (1)互动墙	个	1.000		85000.00			5406.00	5424.36		8624.73	104455.09
368.1	05B001T	户外白色不锈钢“鲸鱼”滑梯意向图	个	1.000		85000.00			5406.00	5424.36		8624.73	104455.09
369	05B054	互动墙 (1)互动墙	个	1.000		50000.00			3180.00	3190.80		5073.37	61444.17
369.1	05B001T	互动墙	个	1.000		50000.00			3180.00	3190.80		5073.37	61444.17
370	05B053	入口标识 (1)50宽3厚灰色不锈钢广告字 (2)3厚热镀锌钢板,玫红色氟碳漆饰面	个	1.000		45000.00			2862.00	2871.72		4566.03	55299.75
370.1	05B001T	入口标识	个	1.000		45000.00			2862.00	2871.72		4566.03	55299.75
371	01B001	摇摇乐	个	3.000		450.00			28.62	28.72		45.66	553.00
371.1	01B001T	摇摇乐（弹簧+塑料：1000*640*750mm）	个	3.000		450.00			28.62	28.72		45.66	553.00
372	01B003	扭腰器	个	1.000		800.00			50.88	51.05		81.17	983.10
372.1	01B001T	扭腰器（碳素钢管：1500*1400*1300mm）	个	1.000		800.00			50.88	51.05		81.17	983.10
373	01B002	儿童活动器械	个	1.000		12000.00			763.20	765.79		1217.61	14746.60
373.1	01B001T	儿童活动器械（碳素钢管： 4800*4000*4300mm）	个	1.000		12000.00			763.20	765.79		1217.61	14746.60
绿化种植													
374	050102001017	栽植乔木 (1)大香樟 (2)胸径30-32cm	株	2.000	408.10	5338.78		173.75	376.60	377.87		600.86	7275.96

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第81页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(3)高度:9m，冠幅：5m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)特选,全冠假植苗,4级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株											
374.1	50101088	栽植乔木（带土球） 土球直径160cm以内	株	2.000	175.52	1.81		116.47	18.69	18.75		29.81	361.05
374.2	50102005T	单排、独立常绿乔木 米径40cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	2.000	232.58	28.17		57.28	20.23	20.30		32.27	390.83
374.3	501BC001T	大香樟 胸径30-32cm，H:9m，P: 5m 特选, 全冠假植苗,4级以上分枝,冠幅饱满,树型优美	株	2.000		5300.00			337.08	338.22		537.78	6513.08
374.4	501BC001	基肥	kg	40.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
375	050102001021	栽植乔木 (1)南洋楹 (2)胸径19-20cm (3)高度:5.5m，冠幅：3m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	14.000	206.71	1823.97		64.47	133.29	133.74		212.69	2574.87
375.1	50101085	栽植乔木（带土球） 土球直径100cm以内	株	14.000	99.22	0.90		41.61	9.01	9.04		14.38	174.16
375.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	14.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
375.3	501BC001T	南洋楹 胸径19-20cm，H:5.5m，P: 3m 全冠 假植苗,冠幅饱满,树型优美	株	14.000		1800.00			114.48	114.87		182.64	2211.99
375.4	501BC001	基肥	kg	280.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
376	050102001020	栽植乔木 (1)墨西哥落羽杉 (2)胸径13-14cm (3)高度:5m，冠幅：2m	株	16.000	155.69	901.78		33.65	69.44	69.67		110.82	1341.05

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型 优美 (7)20kg/株											
376.1	50101083	栽植乔木（带土球） 土球直径70cm以内	株	16.000	37.44	0.38		14.10	3.30	3.31		5.27	63.80
376.2	50102014T	单排、独立落叶乔木 米径20cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	16.000	118.25	12.60		19.55	9.57	9.60		15.26	184.83
376.3	501BC001T	墨西哥落羽杉 胸径13-14cm，H:5m，P: 2m 全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美	株	16.000		880.00			55.97	56.16		89.29	1081.42
376.4	501BC001	基肥	kg	320.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
377	050102001023	栽植乔木 (1)木棉 (2)腹径30-35 (3)高度:5m，冠幅：3m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型 优美 (7)20kg/株	株	4.000	206.71	1623.97		64.47	120.57	120.98		192.40	2329.10
377.1	50101085	栽植乔木（带土球） 土球直径100cm以内	株	4.000	99.22	0.90		41.61	9.01	9.04		14.38	174.16
377.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	4.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
377.3	501BC001T	木棉 腹径30-35，H:5m，P: 3m 全冠假植 苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美	株	4.000		1600.00			101.76	102.11		162.35	1966.22
377.4	501BC001	基肥	kg	80.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
378	050102001024	栽植乔木 (1)蓝花楹 (2)胸径15-16cm (3)高度:3.8m，冠幅：1.5m	株	41.000	206.71	1489.97		64.47	112.05	112.42		178.80	2164.42

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型 优美 (7)20kg/株											
378.1	50101085	栽植乔木（带土球） 土球直径100cm以内	株	41.000	99.22	0.90		41.61	9.01	9.04		14.38	174.16
378.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	41.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
378.3	501BC001T	蓝花楹 胸径15-16cm，H:3.8m，P：1.5m 全 冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美	株	41.000		1466.00			93.24	93.55		148.75	1801.54
378.4	501BC001	基肥	kg	820.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
379	050102001025	栽植乔木 (1)秋枫 (2)胸径15-16cm (3)高度:3.5m，冠幅：2.5m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)枝下高1.8-2.2米,全冠假植苗,3级以上分 枝,冠幅饱满,树型优美 (7)20kg/株	株	25.000	206.71	1523.97		64.47	114.21	114.59		182.25	2206.20
379.1	50101085	栽植乔木（带土球） 土球直径100cm以内	株	25.000	99.22	0.90		41.61	9.01	9.04		14.38	174.16
379.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养 护期半年	株	25.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
379.3	501BC001T	秋枫 胸径15-16cm，H:3.5m，P：2.5m 枝下 高1.8-2.2米,全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅 饱满,树型优美	株	25.000		1500.00			95.40	95.72		152.20	1843.32
379.4	501BC001	基肥	kg	500.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
380	050102001026	栽植乔木 (1)香樟 (2)胸径15-17cm	株	7.000	206.71	1823.97		64.47	133.29	133.74		212.69	2574.87

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第84页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(3)高度:3.5m，冠幅：2.8m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)枝下高1.8-2米,全冠假植苗,3级以上分枝,树型优美 (7)20kg/株											
380.1	50101085	栽植乔木（带土球） 土球直径100cm以内	株	7.000	99.22	0.90		41.61	9.01	9.04		14.38	174.16
380.2	50102003T	单排、独立常绿乔木 米径20cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	7.000	107.49	14.27		22.86	9.20	9.23		14.67	177.72
380.3	501BC001T	香樟 胸径15-17cm，H:3.5m，P：2.8m 枝下高1.8-2米,全冠假植苗,3级以上分枝,树型优美	株	7.000		1800.00			114.48	114.87		182.64	2211.99
380.4	501BC001	基肥	kg	140.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
381	050102001027	栽植乔木 (1)红花鸡蛋花 (2)胸径11-12cm (3)高度:3m，冠幅：2.8m (4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	8.000	141.65	817.30		19.55	62.26	62.46		99.33	1202.55
381.1	50101082	栽植乔木（带土球） 土球直径60cm以内	株	8.000	23.40	0.30			1.51	1.51		2.40	29.12
381.2	50102014T	单排、独立落叶乔木 米径20cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	8.000	118.25	12.60		19.55	9.57	9.60		15.26	184.83
381.3	501BC001T	红花鸡蛋花 胸径11-12cm，H:3m，P：2.8m 全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美	株	8.000		800.00			50.88	51.05		81.17	983.10
381.4	501BC001	基肥	kg	80.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
382	050102001028	栽植乔木 (1)丛生四季桂 (2)胸径10-12cm (3)高度:2.5m，冠幅：2m	株	5.000	141.65	1517.30		19.55	106.78	107.13		170.36	2062.77

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)低分枝，冠幅伞形，高度冠幅为准，全冠假植苗，冠幅饱满，树型优美 (7)10kg/株											
382.1	50101082	栽植乔木（带土球） 土球直径60cm以内	株	5.000	23.40	0.30			1.51	1.51		2.40	29.12
382.2	50102014T	单排、独立落叶乔木 米径20cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	5.000	118.25	12.60		19.55	9.57	9.60		15.26	184.83
382.3	501BC001T	丛生四季桂 胸径10-12cm，H:2.5m，P: 2m 低分枝，冠幅伞形，高度冠幅为准，全冠假植苗，冠幅饱满，树型优美	株	5.000		1500.00			95.40	95.72		152.20	1843.32
382.4	501BC001	基肥	kg	50.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
383	050102002028	栽植灌木 (1)丛生紫薇 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：180-200cm (5)P：150cm (6)多株拼丛，花淡粉，以高度冠幅为准，袋苗，全冠，冠幅饱满，树型优美 (7)10kg/株	株	13.000	80.42	430.38		25.60	34.14	34.25		54.49	659.28
383.1	50101121	栽植灌木（带土球） 土球直径80cm以内	株	13.000	55.06	0.45		21.15	4.88	4.89		7.78	94.21
383.2	50102080T	落叶灌木 高度200cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	13.000	25.36	5.53		4.45	2.25	2.26		3.59	43.44
383.3	501EB001T	丛生紫薇 H：180-200cm，P：150cm 多株拼丛，花淡粉，以高度冠幅为准，袋苗，全冠，冠幅饱满，树型优美	株	13.000		420.00			26.71	26.80		42.62	516.13
383.4	501BC001	基肥	kg	130.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
384	050102001029	栽植乔木 (1)日本晚樱 (2)胸径8-9cm (3)高度:2.5-3m，冠幅：1.5m	株	13.000	83.29	1211.66		9.35	82.98	83.26		132.39	1602.93

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第86页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(4)带土球 (5)成活养护半年，日常养护半年 (6)多花,全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株											
384.1	50101081	栽植乔木（带土球） 土球直径50cm以内	株	13.000	18.72	0.23			1.21	1.21		1.92	23.29
384.2	50102013T	单排、独立落叶乔木 米径10cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	13.000	64.57	7.03		9.35	5.15	5.17		8.21	99.48
384.3	501BC001T	日本晚樱 胸径8-9cm，H:2.5-3m，P: 1.5m 多花,全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美	株	13.000		1200.00			76.32	76.58		121.76	1474.66
384.4	501BC001	基肥	kg	130.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
385	050102002022	栽植灌木 (1)海桐球 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 130-150cm (5)P: 130-150cm (6)球形,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	8.000	78.36	430.06		24.57	33.92	34.03		54.14	655.08
385.1	50101121	栽植灌木（带土球） 土球直径80cm以内	株	8.000	55.06	0.45		21.15	4.88	4.89		7.78	94.21
385.2	50102104T	球形植物 蓬径150cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	8.000	23.30	5.21		3.42	2.03	2.04		3.24	39.24
385.3	501EB001T	海桐球 H: 130-150cm，P: 130-150cm 球形,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗	株	8.000		420.00			26.71	26.80		42.62	516.13
385.4	501BC001	基肥	kg	80.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
386	050102002023	栽植灌木 (1)同安红三角梅 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 120-150cm (5)P: 80cm	株	5.000	27.07	289.26		2.84	20.32	20.39		32.44	392.32

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第87页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(6)盆苗,以高度冠幅为准,全冠,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株											
386.1	50101117	栽植灌木（带土球） 土球直径40cm以内	株	5.000	13.36	0.15			0.86	0.86		1.37	16.60
386.2	50102071T	常绿灌木 高度150cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	5.000	13.71	4.71		2.84	1.35	1.36		2.16	26.13
386.3	501EB001	同安红三角梅 H：120-150cm，P：80cm	株	5.000		280.00			17.81	17.87		28.41	344.09
386.4	501BC001	基肥	kg	50.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
387	050102002024	栽植灌木 (1)红花继木球 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：110-120cm (5)P：110-120cm (6)球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	17.000	54.51	139.91		3.42	12.60	12.65		20.13	243.22
387.1	50101119	栽植灌木（带土球） 土球直径60cm以内	株	17.000	31.21	0.30			2.00	2.01		3.20	38.72
387.2	50102104T	球形植物 蓬径150cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	17.000	23.30	5.21		3.42	2.03	2.04		3.24	39.24
387.3	501EB001T	红花继木球 H：110-120cm，P：110-120cm 球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗	株	17.000		130.00			8.27	8.30		13.19	159.76
387.4	501BC001	基肥	kg	170.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
388	050102002025	栽植灌木 (1)金叶女贞球 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：110-120cm (5)P：110-120cm (6)球型,不脱脚,冠幅饱满不偏冠,袋苗 (7)10kg/株	株	11.000	54.51	129.91		3.42	11.96	12.01		19.12	230.93
388.1	50101119	栽植灌木（带土球） 土球直径60cm以内	株	11.000	31.21	0.30			2.00	2.01		3.20	38.72
388.2	50102104T	球形植物 蓬径150cm以内 假植苗（含容器苗	株	11.000	23.30	5.21		3.42	2.03	2.04		3.24	39.24

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第88页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年											
388.3	501EB001T	金叶女贞球 H：110-120cm，P：110-120cm 球型，不脱脚，冠幅饱满不偏冠，袋苗	株	11.000		120.00			7.63	7.66		12.18	147.47
388.4	501BC001	基肥	kg	110.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
389	050102002027	栽植灌木 (1)龟甲冬青球B (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H：80cm (5)P：80cm (6)球型，不脱脚，冠幅饱满不偏冠，袋苗 (7)10kg/株	株	4.000	24.97	108.48		2.77	8.68	8.71		13.88	167.49
389.1	50101117	栽植灌木（带土球） 土球直径40cm以内	株	4.000	13.36	0.15			0.86	0.86		1.37	16.60
389.2	50102103T	球形植物 蓬径100cm以内 假植苗（含容器苗 、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	4.000	11.61	3.93		2.77	1.16	1.17		1.86	22.50
389.3	501EB001T	龟甲冬青球A H：80cm，P：80cm 球型，不脱 脚，冠幅饱满不偏冠，袋苗	株	4.000		100.00			6.36	6.38		10.15	122.89
389.4	501BC001	基肥	kg	40.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
390	050102007030	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)49株/m2 (3)红绒球 (4)H:45cm，P：15cm (5)5kg/m2	m2	265.000	19.92	70.33		3.28	5.96	5.98		9.52	114.99
390.1	50101157T	栽植地被植物 高60cm以内 片植	m2	265.000	7.49	63.82			4.54	4.55		7.24	87.64
390.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日 常养护期半年	m2	265.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
390.3	501BC001	基肥	kg	1325.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
391	050102007032	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)49株/m2 (3)银边山营兰	m2	9.000	12.43	71.84		3.28	5.57	5.60		8.91	107.63

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第89页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(4)H:35cm, P: 15cm (5)5kg/m2											
391.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	9.000		65.33			4.15	4.17		6.63	80.28
391.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	9.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
391.3	501BC001	基肥	kg	45.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
392	050102007033	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)49株/m2 (3)金叶假连翘 (4)H:35cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	7.000	12.43	76.74		3.28	5.89	5.91		9.41	113.66
392.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	7.000		70.23			4.47	4.48		7.13	86.31
392.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	7.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
392.3	501BC001	基肥	kg	35.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
393	050102007034	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)64株/m2 (3)紫花马樱丹 (4)H:35cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	42.000	12.43	83.44		3.28	6.31	6.34		10.09	121.89
393.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	42.000		76.93			4.89	4.91		7.81	94.54
393.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	42.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
393.3	501BC001	基肥	kg	210.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
394	050102007035	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)64株/m2 (3)大花茉莉 (4)H:20cm, P: 15cm (5)5kg/m2	m2	23.000	12.43	77.04		3.28	5.91	5.93		9.44	114.03

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第90页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
394.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	23.000		70.53			4.49	4.50		7.16	86.68
394.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	23.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
394.3	501BC001	基肥	kg	115.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
395	050102007036	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)64株/m2 (3)紫雪茄 (4)H:20cm，P: 15cm (5)5kg/m2	m2	4.000	12.43	77.04		3.28	5.91	5.93		9.44	114.03
395.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	4.000		70.53			4.49	4.50		7.16	86.68
395.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	4.000	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
395.3	501BC001	基肥	kg	20.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
396	050102012003	铺种草皮 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)马尼拉草卷 (3)满铺 (4)5kg/m2	m2	2283.000	10.15	15.93		2.25	1.81	1.82		2.90	34.86
396.1	50101162T	草皮类(铺植草皮 满铺)	m2	2283.000	1.87	11.70			0.86	0.87		1.38	16.68
396.2	50102121T	草坪类(草坪 满铺)假植苗(含容器苗、袋装苗)成活养护期半年日常养护期半年	m2	2283.000	8.28	2.03		2.25	0.80	0.80		1.27	15.43
396.3	501BC001	基肥	kg	11415.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
397	050101010004	整理绿化用地 (1)绿地整理(整理绿化地)客土回填	m2	2633.000	2.86			0.59	0.22	0.22		0.35	4.24
397.1	50101001T	绿地整理(整理绿化地)客土回填	m2	2633.000	2.86			0.59	0.22	0.22		0.35	4.24
398	050101009004	种植土回(换)填 (1)符合设计要求 (2)30cm	m3	790.000	0.41	31.80		4.11	2.31	2.32		3.69	44.64
398.1	50101002T	绿地整理(回填土)	m3	790.000	0.41	31.80		4.11	2.31	2.32		3.69	44.64

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第91页 共91页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
景墙													
399	010101003010	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内	m3	36.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
399.1	10101018	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内)	m3	36.000	34.74				2.21	2.22		3.53	42.70
400	010103001009	回填方 (1)原土回填 (2)压实度详设计及规范要求	m3	2.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
400.1	10101103	回填工程(填土机械夯实 槽坑)	m3	2.000	5.89			2.59	0.54	0.54		0.86	10.42
401	010404001006	垫层 (1)15cm垫层(碎石灌砂)	m3	4.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
401.1	50103002	垫层(碎石灌砂)	m3	4.000	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
402	010501001009	垫层 (1)100厚C20混凝土垫层	m3	3.000	65.31	344.34			26.05	26.14		41.56	503.40
402.1	10105001T	基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层)	m3	3.000	48.64	344.34			24.99	25.08		39.87	482.92
402.2	10105057	混凝土调整费(非泵送调整费)	m3	3.000	16.67				1.06	1.06		1.69	20.48
403	010401003006	实心砖墙 (1)粘土砖 (2)水泥砂浆M7.5	m3	18.000	323.53	246.73		4.66	36.56	36.69		58.34	706.51
403.1	10104001T	实心砖墙(实心标准砖墙)	m3	18.000	323.53	246.73		4.66	36.56	36.69		58.34	706.51
404	011201004005	立面砂浆找平层 (1)20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	129.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
404.1	10112018T	外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 20mm厚)	m2	129.000	39.08	6.48		0.63	2.94	2.95		4.69	56.77
405	011406001001	抹灰面油漆涂料 (1)满刮腻子两遍 (2)封闭底漆一道 (3)浅蓝色丙烯酸外墙漆饰面 (4)罩面漆一道	m2	129.000	23.62	27.46			3.25	3.26		5.18	62.77
405.1	10114156T	外墙丙烯酸酯涂料(墙面 三遍)	m2	129.000	23.62	27.46			3.25	3.26		5.18	62.77

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第1页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			1518400.59
二		材料					
1	01000030	型钢	综合	kg	8.800	3.363	29.59
2	01010010	钢筋		kg	2.200	2.970	6.53
3	01010030	钢筋	Φ10以内	kg	5.754	3.070	17.66
4	01010080	螺纹钢	HRB335Φ20以内	t	0.250	3275.000	817.44
5	01010120	螺纹钢	HRB335Φ16	t	0.556	3159.000	1755.37
6	01010120	螺纹钢	HRB335Φ16	t	0.046	3250.000	149.60
7	01010210	螺纹钢	HRB400Φ20以内	t	0.166	3275.000	544.96
8	01010340	螺纹钢	HRB400EΦ14	t	4.295	3250.000	13957.94
9	01010350	螺纹钢	HRB400EΦ16	t	2.091	3250.000	6795.75
10	01010360	螺纹钢	HRB400EΦ18	t	2.829	3250.000	9194.25
11	01010590	线材	HRB400EΦ8	t	4.712	3470.000	16352.03
12	01010600	线材	HRB400EΦ10	t	10.741	3470.000	37269.88
13	01030001	镀锌铁丝	综合	kg	13.284	8.320	110.52
14	01030080	镀锌铁丝	10#	kg	0.249	4.870	1.21
15	01030110	镀锌铁丝	16#	kg	0.331	8.340	2.76
16	01030140	镀锌铁丝	22#	kg	189.881	9.270	1760.20
17	01030140	镀锌铁丝	22#	kg	0.251	9.270	2.33
18	01030190	镀锌铁丝	Φ2.2~1.2	kg	3.732	8.220	30.68
19	01050260	钢丝绳	Φ26	m	68.800	21.170	1456.50
20	01090180	圆钢	Φ10以内	t	1.663	3530.000	5871.10
21	01090300	圆钢	Φ12	t		3450.000	
22	01110010	方钢	综合	kg	22.400	3.995	89.49
23	01130140	扁钢	45×4	kg	14.820	3.611	53.52
24	01130140	扁钢	45×4	kg	1.040	3.810	3.96
25	01130190	镀锌扁钢	综合	kg	21.698	4.270	92.65
26	01130230	镀锌扁钢	40×4	kg	29.000	4.160	120.64
27	01130240	镀锌扁钢	40×4	m	12.000	3.120	37.44
28	01130240	镀锌扁钢	25×4	m	57.000	3.120	177.84
29	01150020	六角空心钢	Φ22-25	kg	8.835	3.080	27.21
30	01170010	镀锌工字钢	综合	kg	326.106	4.710	1535.96
31	01190020	槽钢	综合	m	14.140	17.440	246.60
32	01190150	镀锌槽钢	5#-11#	kg	838.506	4.630	3882.28
33	01210090	角钢	50×5以外	kg	8822.156	3.177	28027.99
34	01210250	角钢	50×5	kg	28.814	3.177	91.54
35	01210320	镀锌角钢	综合	kg	2149.884	4.660	10018.46

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第2页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
36	01290110	钢板	综合	kg	1.400	3.566	4.99
37	01290570	普通钢板	0#-3# δ 1.6-1.9	kg	0.100	3.522	0.35
38	01291110	镀锌薄钢板	综合	kg	55.496	4.500	249.73
39	01291220	镀锌薄钢板	δ 0.75	m2	102.480	27.270	2794.63
40	01291390	镀锌钢板	δ 1	m2	6.804	36.360	247.39
41	01291420	镀锌钢板	δ 3.0	m2	82.782	135.000	11175.57
42	01291750	热轧厚钢板	δ 8.0~15	kg	5.141	3.900	20.05
43	01291790	热轧厚钢板	δ 12~20	kg	4.427	3.880	17.18
44	01530010	封铅	含铅65% 锡35%	kg	4.103	48.670	199.69
45	01610250	铁件	综合	kg	49.950	4.832	241.36
46	01610250	铁件	综合	kg	100.191	3.670	367.70
47	01610250	铁件	综合	kg	18.900	3.670	69.36
48	01610270	预埋铁件		kg	726.219	4.970	3609.31
49	02010180	橡胶板	δ 1-3	kg	1.251	3.860	4.83
50	02051940	橡胶密封圈(室内排水)	DN200	个	13.440	8.360	112.36
51	02070240	橡胶垫	δ 2	m2	0.554	3.420	1.89
52	02090050	塑料薄膜		m2		0.420	
53	02130050	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	56.520	0.120	6.78
54	02130120	三色塑料带	20mm×40m	m	0.840	0.300	0.25
55	02250030	玻璃钢波纹瓦		m2	138.040	19.650	2712.49
56	02270001	白布		kg	4.212	26.360	111.02
57	02270110	土工布	300G	m2	0.256	4.870	1.25
58	02270260	棉纱		kg	4.602	5.220	24.02
59	02270260	棉纱		kg	0.150	5.290	0.79
60	02270270	棉纱头		kg	2.890	5.440	15.72
61	02270310	破布		kg	0.176	5.800	1.02
62	02290090	麻刀		kg	38.211		
63	02330001	草袋		m2	35.280	2.480	87.49
64	02350020	白色进口PVDF膜材	厚0.9mm	m2	279.500	38.000	10621.00
65	03010440	铁钉		kg	105.398	9.930	1046.61
66	03010440	铁钉		kg	61.189	9.930	607.60
67	03010550	圆钉		kg	10.286	9.930	102.14
68	03010550	圆钉		kg	1.427	5.580	7.96
69	03010640	木螺钉	M2-4×6-65	个	176.800	0.060	10.61
70	03010950	镀锌自攻螺钉	Φ4~6×10~16	个	126.160	0.030	3.78
71	03011990	镀锌锁紧螺母	3×20	个	11.596	0.260	3.01
72	03012600	地脚螺栓M18		套	183.600	15.000	2754.00
73	03012611	地脚螺栓	成套	kg	102.000	6.000	612.00
74	03013240	镀锌精制带帽螺栓	M16×200	套	6.100	7.960	48.56
75	03014380	精制六角带帽螺栓	M8×75	套	0.770	0.260	0.20

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第3页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
76	03014950	拉杆螺栓		kg	3.672	8.370	30.73
77	03014970	六角螺栓		kg	22.319	6.460	144.18
78	03015420	膨胀螺栓	M6	个	57.280	6.150	352.27
79	03015430	膨胀螺栓	M6	套	97.920	0.600	58.75
80	03015460	膨胀螺栓	M10	套	31.280	1.540	48.17
81	03016970	六角螺栓带螺母、垫圈	M16×65~80	套	197.760	0.620	122.61
82	03017590	地板铁钉		个	8442.000	1.060	8948.52
83	03130160	低合金实芯焊丝	Φ1.2	kg	91.367	8.850	808.60
84	03130170	低合金药芯焊丝	Φ1.2	kg	108.241	10.620	1149.52
85	03130280	焊锡丝		kg	0.500	24.340	12.17
86	03130300	松香焊锡丝	综合	m	1.050	1.170	1.23
87	03130370	电焊条	结422Φ3.2	kg	94.290	6.860	646.83
88	03130370	电焊条	结422Φ3.2	kg	1.196	5.930	7.09
89	03130650	焊锡膏		kg	0.070	33.630	2.35
90	03130650	焊锡膏		kg	0.102	36.990	3.77
91	03130700	埋弧焊剂		kg	75.251	3.910	294.23
92	03130790	冲击钻头	Φ6~8	个	1.862	5.130	9.55
93	03130830	冲击钻头	Φ8	个	0.358	4.780	1.71
94	03130850	冲击钻头	Φ12	只	0.196	8.850	1.73
95	03130920	合金钻头	Φ10 一字型	个	5.522	5.470	30.21
96	03130970	合金钢钻头	Φ10	个	1.107	3.660	4.05
97	03131110	锯条	综合	根	16.902	0.440	7.44
98	03131120	钢锯条		根	87.950	0.230	20.23
99	03131180	砂轮片	Φ400	片	0.140	15.040	2.11
100	03131240	尼龙砂轮片	Φ100	片	0.416	2.110	0.88
101	03131270	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.443	8.880	3.93
102	03131320	石料切割锯片		片	15.302	14.160	216.67
103	03131360	塑料胀管	Φ6-8	个	187.000	0.040	7.48
104	03131420	砂纸		张	0.096	0.250	0.02
105	03131480	铁砂布		张	5.868	0.880	5.16
106	03131490	铁砂布	0#-2#	张	2.000	0.810	1.62
107	03131590	低碳钢焊条	综合	kg	5.700	7.100	40.47
108	03131600	低碳钢焊条	J422 综合	kg	1.732	7.100	12.30
109	03131630	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	4.668	7.100	33.14
110	03131890	锡基钎料		kg	1.938	42.480	82.33
111	03131970	低合金钢焊条	E43系列	kg	48.546	13.820	670.91
112	03210110	不锈钢装饰盖	Φ63	个	21.194	1.330	28.19
113	03210180	垫铁		kg	105.170	4.820	506.92
114	03210610	零星卡具		kg	4.250	5.730	24.35

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第4页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
115	03210610	零星卡具		kg	19.086	4.420	84.36
116	03210660	平垫铁	综合	kg	2.100	4.480	9.41
117	03211660	金属结构铁件		kg	25.130	6.110	153.54
118	03230300	锚头	Φ26	套	3.440	185.840	639.29
119	04010001	水泥	32.5	kg	59746.818	0.345	20612.65
120	04010001	水泥	32.5	kg	0.275	0.492	0.14
121	04010001	水泥	32.5	kg	2901.200	0.345	1000.91
122	04010010	水泥	42.5	kg	1116.482	0.370	413.10
123	04010020	白水泥		kg	75.700	0.660	49.96
124	04010050	袋装水泥	32.5	kg		0.345	
125	04010090	袋装水泥	42.5	kg	1865.000	0.370	690.05
126	04010170	散装水泥	42.5	kg	245974.022	0.345	84861.04
127	04010170	散装水泥	42.5	kg	2699.900	0.493	1331.05
128	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	122.465	111.650	13673.24
129	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	1.356	111.650	151.40
130	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3		111.650	0.05
131	04030150	中(粗)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	5.552	111.650	619.87
132	04030150	中(粗)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	13.328	111.650	1488.02
133	04030150	中(粗)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	2.310	111.650	257.91
134	04030170	机制砂		m3	5.874	111.650	655.83
135	04030174	机制砂	用于回填、垫层	m3	243.348	67.960	16537.91
136	04030174	机制砂	用于回填、垫层	m3	86.802	67.960	5899.06
137	04030230	净干砂（机制砂）		m3	600.339	111.650	67027.80
138	04030230	净干砂（机制砂）		m3	2.380	111.650	265.78
139	04050020	夜光石	Φ6-9mm	kg	1132.200	60.000	67932.00
140	04050130	砾石	Φ5-20	m3	2.582	104.870	270.79
141	04050200	碎石	Φ5-10（细石）	m3	47.855	120.000	5742.56
142	04050240	碎石	Φ5-31.5	m3	523.879	120.000	62865.49
143	04050250	碎石	Φ5-40	m3	822.510	120.000	98701.20
144	04050320	碎石	Φ40以上	m3	4.315	120.000	517.80
145	04050410	碎石（级配）		m3	238.680	119.870	28610.57
146	04050430	卵石		m3		96.360	
147	04090030	粉煤灰	II级	kg		0.180	
148	04090030	粉煤灰	II级	kg	55300.582	0.180	9954.10

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第5页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
149	04090030	粉煤灰	Ⅱ级	kg	663.049	0.210	139.24
150	04090230	石灰		kg	4.000	0.540	2.16
151	04090250	生石灰		kg	3470.040	0.540	1873.82
152	04090350	粘土		m3	16.422	40.780	669.69
153	04090360	粘土膏		m3	1.597	29.010	46.34
154	04090360	粘土膏		m3	0.106	29.010	3.09
155	04090370	种植土		m3	1954.630	34.340	67121.98
156	04110020	方整石	160-180×360-450×1000-2000	m3	3.093	521.000	1611.45
157	04110090	高芝麻白机切面立路沿	600*150*250, 2*2倒角	m	22.000	60.000	1320.00
158	04110090	通长C20混凝土高道牙	120*280	m	50.000	68.000	3400.00
159	04130160	红砖	240×115×53	块	34965.000	0.540	18881.10
160	04130460	植草砖	600×400×8	m2	107.100	40.590	4347.19
161	04130540	烧结煤矸石普通砖	240×115×53	块	49341.600	0.370	18256.39
162	04130720	水泥实心砖	240×115×53 MU10	块	11987.800	0.350	4195.73
163	04170110	筒瓦	208×94×8	块	280.389	4.370	1225.30
164	04170290	本瓦	240×220×10	块	27347.343	2.570	70282.67
165	04270100	混凝土内撑条	20mm×25mm	m	46.751	0.990	46.28
166	05030060	杉枋材		m3	5.236	2080.000	10890.88
167	05030210	杉木锯材		m3	6.343	1858.000	11786.04
168	05030220	松木锯材		m3	11.116	1379.000	15328.83
169	05030240	枕木	综合	m3	0.160	1969.000	315.04
170	05030290	杉木中板	厚1.9-3.5CM 长4M以内	m3	1.472	2270.000	3341.44
171	05030290	杉木中板	厚1.9-3.5CM 长4M以内	m3	7.143	2270.000	16214.61
172	05030440	杉木大方	截面101-225cm2 长2m以内	m3		2389.000	
173	05030450	杉木大方	截面101-225cm2 长4m以内	m3	8.476	2788.000	23632.20
174	05050050	胶合板	13厚	m2	0.207	26.550	5.50
175	06570010	反光玻璃珠		kg	233.200	4.340	1012.09
176	07010010	瓷板	152×152	m2	49.440	54.870	2712.77
177	07010060	瓷质面砖	95×95	m2	748.046	57.520	43027.63
178	07230001	棕色竹木板	140*20厚	m2	116.280	135.000	15697.80
179	07230001	咖色硅晶石栈道板	2400*250*25厚	m2	88.740	165.000	14642.10
180	07230001	浅碳平面型户外高耐竹木板, 离缝宽5mm	140宽20厚	m2	59.850	125.000	7481.25
181	07290040	EPDM现浇	13厚	m2	620.160	135.000	83721.60

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第6页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
182	08030001	芝麻白荔枝面压顶	600*300*100厚	m2	6.360	230.000	1462.80
183	08030001	芝麻白光面	600*400/500*50厚	m2	72.080	130.000	9370.40
184	08030001	芝麻黑烧面压顶	600*300*50厚	m2	8.480	130.000	1102.40
185	08030001	黄金麻荔枝面压顶	600*300*50厚	m2	98.580	280.000	27602.40
186	08030001	芝麻白荔枝面	800*400*30厚	m2	78.540	90.000	7068.60
187	08030090	芝麻白荔枝面踢面	600*110*25厚	m2	10.200	90.000	918.00
188	08030090	芝麻灰荔枝面踢面	600*150*25厚	m2	18.360	90.000	1652.40
189	08030090	芝麻白荔枝面踢面	600*150*25厚	m2	22.440	90.000	2019.60
190	08030090	芝麻白荔枝面踢面	1000*150*25厚	m2	68.340	90.000	6150.60
191	08030100	黄金麻菠萝面	600*300*50厚	m2	16.320	280.000	4569.60
192	08030100	黄金麻菠萝面工字铺	600*400*30厚	m2	87.720	300.000	26316.00
193	08030110	芝麻白荔枝面踏面	600*330*70厚	m2	108.800	180.000	19584.00
194	08030110	芝麻白荔枝面踏面	1000*330*70厚	m2	145.792	180.000	26242.56
195	08030130	芝麻白荔枝面压边	600*200*30厚	m2	144.160	90.000	12974.40
196	08030130	芝麻白荔枝面/芝麻黑烧面齐缝铺	900*300*30厚	m2	243.780	90.000	21940.20
197	08030130	芝麻白荔枝面	1000*500*30厚	m2	331.500	90.000	29835.00
198	08030130	芝麻黑烧面	600*300*30厚	m2	115.540	90.000	10398.60
199	08030140	青石菠萝面做旧处理	600*300*50厚	m2	29.580	140.000	4141.20
200	08030150	芝麻白荔枝面工字铺	600*300*80厚	m2	2774.400	150.000	416160.00
201	08030150	芝麻黑烧面压边	600*300*80厚	m2	46.640	170.000	7928.80
202	08030350	芝麻白荔枝面碎拼	边长200~600 30厚	m2	65.280	90.000	5875.20
203	08030360	毛石碎拼	边长200~400 50厚	m2	42.240	140.000	5913.60
204	09050070	铝单板	2.5厚 氟碳	m2	316.050	225.660	71319.84
205	09050070	白色铝单板	2.5厚 氟碳	m2	145.148	225.660	32754.19
206	09050190	不锈钢水波板	3厚	m2	261.450	231.240	60457.70
207	10030060	铝合金龙骨(不上人型)	平面 600×600	m2	261.450	18.580	4857.74
208	12030240	铝合金	┐型 30×12×1.0	m	0.700	4.870	3.41
209	12030250	铝合金	┐型 80×13×1.2	m	1.918	5.750	11.03
210	12050190	石材装饰线	150	m	139.920	48.670	6809.91
211	12150020	欧式GRC装饰线条	400×400以内	m	283.560	66.370	18819.88
212	12210100	钢管栏杆		kg	644.284	5.750	3704.63
213	12210140	不锈钢装饰圆管	25.4×1.5	m	50.880	14.070	715.88
214	12210180	不锈钢装饰圆管	45×1.5	m	19.640	25.690	504.55
215	12210200	不锈钢装饰圆管	63.5×2	m	16.960	48.410	821.03
216	13010070	醇酸清漆		kg	109.282	12.480	1363.83
217	13010160	酚醛调和漆		kg	0.740	11.970	8.86
218	13010370	沥青清漆		kg	0.260	9.820	2.55
219	13010390	煤焦沥青漆	L01-17	kg	8.845	10.620	93.94
220	13010550	醇酸调和漆	各色	kg	3.763	10.800	40.64

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第7页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
221	13010640	丙烯酸聚氨酯底漆		kg	36.628	19.630	719.01
222	13010650	丙烯酸聚氨酯中间漆		kg	72.614	20.000	1452.28
223	13010671	外墙用乳胶漆底漆		kg	5.810	12.700	73.79
224	13030290	沥青漆		kg	1.209	8.140	9.84
225	13030480	腻子粉		kg	600.113	1.020	612.12
226	13030600	环氧富锌底漆(封闭漆)		kg	6.000	24.280	145.67
227	13030660	真石漆		kg	216.320	5.580	1207.07
228	13030670	真石面漆		kg	16.224	16.370	265.59
229	13030690	外墙用乳胶漆面漆		kg	14.040	15.420	216.50
230	13030770	无光高级丙烯酸外墙涂料		kg	240.084	17.700	4249.49
231	13050070	防锈漆	红丹	kg	35.420	12.300	435.67
232	13050070	防锈漆	红丹	kg	0.022	8.410	0.18
233	13050100	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.140	9.910	1.39
234	13050110	酚醛防锈漆		kg	110.573	9.910	1095.78
235	13050110	酚醛防锈漆		kg	0.120	8.420	1.01
236	13050220	沥青绝缘漆		kg	0.554	13.180	7.30
237	13090010	氟碳金属面漆		kg	80.004	57.370	4589.81
238	13090070	氟碳漆用光面腻子粉		kg	392.675	3.050	1197.66
239	13090080	氟碳罩面清漆		kg	27.632	66.370	1833.92
240	13110020	热熔标线涂料		kg	2623.500	2.960	7765.56
241	13110030	热塑标线底漆		kg	139.080	3.940	547.98
242	13310050	石油沥青	10#	kg	40.316	2.960	119.34
243	13330200	高聚物改性沥青自粘卷材	3mm	m2	228.967	19.910	4558.74
244	13350210	模板嵌缝料		kg	0.076	4.000	0.30
245	13410030	嵌缝料		kg	15.600	4.470	69.73
246	14030050	汽油	90#	kg	63.354	7.560	478.95
247	14030050	汽油	90#	kg	0.300	6.160	1.85
248	14030060	汽油	92#	kg	5.724	9.030	51.69
249	14030060	汽油	92#	kg	11.628	8.940	103.95
250	14050060	油漆溶剂油		kg	60.123	7.260	436.49
251	14070001	白铅油		kg	0.280	6.160	1.72
252	14070130	机油	综合	kg	0.963	5.540	5.34
253	14070240	清油		kg	10.225	11.790	120.55
254	14070250	清油	C01-1	kg	0.064	6.270	0.40
255	14070270	水柏油		kg	12.720	12.830	163.20
256	14070270	水柏油		kg	2.111	12.830	27.08
257	14070290	熟桐油		kg	17.587	3.310	58.21
258	14090010	电力复合酯	综合	kg	0.596	25.400	15.14
259	14090020	电力复合酯	一级	kg	0.200	30.800	6.16

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第8页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
260	14230150	乌烟		kg	60.708		
261	14230240	颜料		kg	1022.067	5.310	5427.18
262	14330190	硬脂酸	一级	kg	0.554	7.790	4.31
263	14350080	醇酸漆稀释剂		kg	1.622	6.680	10.84
264	14350200	氟碳漆专用稀释剂		kg	21.940	14.650	321.42
265	14350210	氟碳专用固化剂		kg	7.252	24.780	179.71
266	14350400	稀释剂		kg	10.010	6.410	64.16
267	14350570	脱模剂		kg	100.991	2.920	294.89
268	14350570	脱模剂		kg	4.280	2.880	12.33
269	14350690	药剂		kg	96.370	21.450	2067.14
270	14350890	润滑剂		kg	2.080	4.120	8.57
271	14350970	环氧富锌漆稀释剂		kg	0.600	11.310	6.79
272	14351020	丙烯酸聚氨酯稀释剂		kg	65.270	12.200	796.29
273	14351030	丙烯酸聚氨酯固化剂		kg	19.508	13.520	263.74
274	14351100	减水剂	WR-S	kg	2946.913	3.570	10520.48
275	14390050	二氧化碳气体		m3	194.600	2.050	398.93
276	14390070	可燃气体(丙烷)		kg	37.626	2.880	108.36
277	14390180	氧气		m3	102.177	4.010	409.73
278	14390190	乙炔气		kg	8.954	21.350	191.17
279	14410760	粘合剂	507	kg	0.933	7.560	7.05
280	14410990	塑料专用水性胶水		kg	243.200	13.200	3210.24
281	14410990	专用水性胶水		kg	499.500	13.200	6593.40
282	15010420	石棉橡胶板	低压 δ 0.8-6	kg	3.558	7.270	25.87
283	17010430	焊接钢管	DN20	m	2.157	5.944	12.82
284	17010490	焊接钢管	DN50	m	197.925	17.578	3479.13
285	17030001	镀锌钢管		kg	11248.506	4.475	50337.06
286	17070030	无缝钢管	Φ22×2	m	0.216	5.750	1.24
287	17090080	铝合金方管	25×25×1.2	m	12.964	11.420	148.05
288	17090090	铝合金方管	100×44×1.8	m	14.840	51.160	759.21
289	17250001	塑料管		kg	2.100	7.950	16.70
290	17250010	电管PE32		m	384.190	2.000	768.38
291	17250010	电管PE75		m	618.000	5.000	3090.00
292	17251260	硬聚氯乙烯管	Φ15	m	49.680	2.220	110.29
293	17252180	HDPE双壁波纹管(8kN/m2)	Φ200	m	79.440	43.740	3474.71
294	17252630	PE给水管	Φ25	m	227.460	3.420	777.91
295	17252630	PE给水管	Φ32	m	213.180	4.270	910.28
296	17252640	PE给水管	Φ40	m	137.700	5.870	808.30
297	17252650	PE给水管	Φ50	m	408.000	8.960	3655.68

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第9页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
298	17252660	PE给水管	Φ63	m	391.680	14.730	5769.45
299	17270250	橡胶软管	DN20	m	0.984	9.980	9.82
300	17310780	输水软管	Φ25	m	0.432	3.580	1.55
301	18037100	固定卡子	Φ90	个	12.360	2.520	31.15
302	18092210	室外塑料给水管热熔管件	Φ32	个	122.256	4.310	526.92
303	18092220	室外塑料给水管热熔管件	Φ40	个	39.960	5.090	203.40
304	18092230	室外塑料给水管热熔管件	Φ50	个	114.400	6.850	783.64
305	18092240	室外塑料给水管热熔管件	Φ63	个	107.904	8.450	911.79
306	18150490	金属软管接头	DN15	个	78.280	0.810	63.41
307	18150970	黑玛钢活接头	DN25	个	50.500	4.960	250.48
308	18151000	黑玛钢活接头	DN50	个	15.150	14.600	221.19
309	18151100	金属软管活接头	Φ25	套	2.040	8.250	16.83
310	18151800	黑玛钢六角内接头	DN50	个	12.120	6.640	80.48
311	19002300	螺纹阀门	DN15	个	0.192	10.220	1.96
312	19002310	螺纹阀门	DN20	个	0.632	12.580	7.95
313	19002350	闸阀	DN50	个	15.150	156.620	2372.79
314	19030030	法兰蝶阀	DN80	个	8.000	334.610	2676.88
315	19090110	止回阀	DN80	个	4.000	609.510	2438.04
316	19410190	洒水栓	DN25	个	50.000	28.500	1425.00
317	20011500	伸缩接头	DN80	片	4.000	23.230	92.92
318	22450045	高压风管	Φ25-6P-20m	m	1.104	24.140	26.66
319	24010040	法兰水表	DN80	个	4.000	306.640	1226.56
320	24110190	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	块	0.741	53.430	39.57
321	24590040	压力表弯管	DN15	个	0.741	13.270	9.83
322	25000020	草坪灯	10W LED灯 AC220V 4000K IP65	套	12.120	460.000	5575.20
323	25000020	射树灯A	IP67 功率:24W/AC220V 光源:LED灯 色温:3000K 材料:灯体为压铸铝	套	12.120	128.000	1551.36
324	25000020	LED洗墙灯A(1000mm)	25° ×40° , 色温3000K, 电压24V , 功率24W, 光源: LED, IP66	套	61.408	424.779	26084.83
325	25000020	LED壁灯	25° , 色温3000K, 电压AV24V, 功率6W, 光源: LED, IP66	套	85.850	265.487	22792.06
326	25330710	庭院灯H=3.5m	36W LED灯 AC220V 4000K IP65	套	45.450	1480.000	67266.00
327	25570001	开关电源	AC220V/DC24V-350W	套	30.000	300.000	9000.00
328	27060030	钢管接地极	Φ50 2.5m	根	27.300	49.110	1340.70
329	27060040	角钢接地极	50×5 2.5m	根	61.000	37.500	2287.50
330	27060130	接地母线		m	26.390	6.470	170.74
331	27170170	自粘性塑料带	20×20000	卷	1.400	13.270	18.58

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第10页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
332	27170180	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	1.800	3.540	6.37
333	27170180	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	19.450	4.420	85.97
334	27170190	黄腊带	20mm×10m	卷	1.400	11.500	16.10
335	28010390	镀锡裸铜软绞线	TJRX 16MM2	kg	1.200	38.050	45.66
336	28030190	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线	ZC-RVV-2×4	m	1120.980	1.050	1177.03
337	28031880	穿多芯软导线	RVV-2×1.5	m	1952.640	4.560	8904.04
338	28031880	穿多芯软导线	RVV-2×1.0	m	140.400	3.900	547.56
339	28031940	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5	m	346.490	1.680	582.10
340	28031970	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6	m	8.160	3.910	31.91
341	28031970	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6	m	42.840	3.880	166.22
342	28032000	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-16	m	23.430	10.320	241.80
343	28110020	室内铜芯电力电缆敷设	WDZC-YJY-4×25+1×16 五芯电力电缆敷设 室外 敷设	m	20.200	105.570	2132.51
344	28110020	室内铜芯电力电缆敷设	WDZC-YJY-4×35+1×16 五芯电力电缆敷设 室外 敷设	m	151.500	140.790	21329.69
345	28110020	铜芯电力电缆敷设	ZC-YJV-3×6	m	361.580	17.340	6269.80
346	28270120	双绞线缆(管内穿放)	≤4对) CAT5E	m	1965.600	2.300	4520.88
347	28270120	双绞线缆(管内穿放)	≤4对) CAT6E	m	702.450	2.890	2030.08
348	29060320	金属软管	Φ25	m	0.824	2.900	2.39
349	29060370	金属软管	DN15	m	15.656	1.740	27.24
350	29060820	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	115.700	0.050	5.79
351	29060930	埋地敷设	PVC20	m	988.980	3.500	3461.43
352	29061390	难燃塑料管接头	20	个	192.198	0.150	28.83
353	29090180	铜接线端子	20A	个	156.919	1.680	263.62
354	29090310	铜接线端子	DT-16	个	6.120	2.500	15.30
355	29090330	铜接线端子	DT-35	个	22.560	3.580	80.76
356	29090510	塑料接线柱	双线	个	87.344	2.650	231.46
357	29090520	铜端子	6mm2	个	42.840	1.330	56.98
358	29090520	铜端子	6mm2	个	8.160	1.890	15.42
359	29090530	铜端子	16mm2	个	22.420	2.300	51.57
360	29110110	接线盒		个	53.040	2.140	113.51
361	29250020	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	32.139	30.170	969.62
362	29250090	镀锌电缆卡子	2×35	套	129.519	3.150	407.98
363	30030010	监视器配件（支架、高清线）		副	1.000	350.000	350.00
364	32070001	草皮		m2	39.900	7.430	296.46
365	32070001	小兔狼尾草	H:40cm, P: 15cm	株	2304.000	1.000	2304.00

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第11页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
366	32070001	银边山菅兰	H:35cm, P: 15cm	株	2548.000	1.300	3312.40
367	32070001	紫花翠芦莉	H:30cm, P: 15cm	株	12864.000	0.900	11577.60
368	32070001	花叶鹅掌柴	H:25cm, P: 15cm	株	2254.000	1.200	2704.80
369	32070001	肾蕨	H:25cm, P: 15cm	株	704.000	1.300	915.20
370	32070001	毛杜鹃	H:20cm, P: 15cm	株	4608.000	1.000	4608.00
371	32070001	大花芦莉	H:20cm, P: 15cm	株	1472.000	1.000	1472.00
372	32070001	大花芦莉	H:20cm, P: 15cm	株	2368.000	1.200	2841.60
373	32070001	紫鸭跖草	H:20cm, P: 15cm	株	2511.000	0.800	2008.80
374	32070001	麦冬	H:10cm, P: 10cm	株	128280.000	0.600	76968.00
375	32070001	紫花马缨丹肾蕨混种	H:25cm, P: 15cm	株	8384.000	1.200	10060.80
376	32070001	银边山菅兰	H:35cm, P: 15cm	株	441.000	1.200	529.20
377	32070001	金叶假连翘	H:35cm, P: 15cm	株	343.000	1.300	445.90
378	32070001	紫花马樱丹	H:35cm, P: 15cm	株	2688.000	1.100	2956.80
379	32070001	紫雪茄	H:20cm, P: 15cm	株	256.000	1.000	256.00
380	32070001	马尼拉		m2	5148.000	10.500	54054.00
381	32070001	红绒球	H:45cm, P: 15cm	株	12985.000	1.300	16880.50
382	32070001	橙花三角梅	H:30cm, P: 20cm	盆	2268.000	3.300	7484.40
383	32070001	粉花三角梅	H:30cm, P: 20cm	盆	1296.000	3.500	4536.00
384	32070001	紫花三角梅	H:30cm, P: 20cm	盆	2160.000	3.800	8208.00
385	32070001	红背桂	H:35cm, P: 20cm	株	2940.000	1.200	3528.00
386	32070001	红花三角梅	H:30cm, P: 20cm	盆	3600.000	4.600	16560.00
387	32270001	肥料		kg	30477.468	0.440	13410.09
388	33010040	吊杆		kg	78.684	6.190	487.05
389	33010280	钢支撑		kg	0.354	5.310	1.88
390	33010280	钢支撑		kg		5.290	
391	33010330	钢柱		t	3.590		
392	33010350	钢梁		t	2.070	8025.000	16611.75

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第12页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
393	33050060	铸铁爬梯		kg	186.648	6.900	1287.87
394	33410550	塑钢爬梯		步	12.120		
395	34050010	草板纸	80#	张	10.830	1.050	11.37
396	34070040	塑料手套	ST型	个	6.300	7.960	50.15
397	34090330	锯木屑		m3	1.734	88.500	153.46
398	34090350	白绸		m2	2.400	15.040	36.10
399	34110030	电		kW·h	116.134	0.680	78.97
400	34110030	电		kW·h	4.590	0.660	3.03
401	34110030	电		kW·h	6.000	0.680	4.08
402	34110080	水		m3	3959.416	3.010	11917.84
403	34110080	水		m3	5.872	3.010	17.67
404	34110080	水		m3	14.892	3.280	48.85
405	34130010	标志牌	塑料扁形	个	99.150	0.880	87.25
406	35010001	钢模板		kg	0.330	6.190	2.04
407	35010001	钢模板		kg	26.031	5.120	133.28
408	35010020	组合钢模板		kg	18.579	5.750	106.83
409	35010140	胶合板	18厚、一级、酚醛	m2	62.300	45.000	2803.49
410	35020001	钢模支撑		kg	15.470	6.190	95.76
411	35020060	蝴蝶扣		个	5.508	5.310	29.25
412	35020160	钢模板连接件		kg	1.836	5.750	10.56
413	35030001	底座		个	1.138	3.100	3.53
414	35030030	固定底座		个.月	6.232	0.620	3.86
415	35030050	可调托座		个.月	6.232	1.150	7.17
416	35030080	钢管	Φ48.3×3.6	t.月	3.570	106.190	379.05
417	35030090	钢管使用费		t.月	28.821	106.190	3060.51
418	35030100	脚手架钢管		kg	99.540	6.190	616.15
419	35030140	脚手管(扣)件		个	10.381	6.640	68.93
420	35030200	扣件		个.月	885.850	0.300	265.75
421	35030210	扣件、底座使用费		个.月	4467.960	0.300	1340.39
422	35030320	竹脚手板		m2	161.294	4.650	750.02
423	35050030	安全网		m2	12.703	7.080	89.94
424	35050070	密目安全网(阻燃)	1.5×6	m2	1447.950	3.810	5516.69
425	36010260	铸铁井盖井座		套	4.040	350.000	1414.00
426	37090020	钢垫板	δ 1-3	kg	11.000	5.820	64.02
427	400000000237	板枋材		m3	0.262	2137.000	560.75
428	400500100001	青砖	240×115×53MU10	块	1497.456	1.950	2920.04
429	40050070004	碎石	5~40mm	m3	52.265	120.000	6271.78

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第13页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
	5						
430	400501500001	石灰膏		m3	3.483	659.000	2295.10
431	401102900007	钢化玻璃	δ 10	m2	11.480	82.300	944.80
432	402500100049	白布		m2	0.800	4.780	3.82
433	402500100121	尼龙帽		个	28.519	0.130	3.71
434	402700500001	焊锡		kg	0.350	27.950	9.78
435	402700500089	焊剂		kg	1.102	4.890	5.39
436	420100100217	杉板枋		m3	0.268	2124.000	568.81
437	420100100259	杉木薄板	厚1.5-1.8CM 长4M以内	m3	3.861	2381.000	9193.04
438	420100100281	杉原木	Φ 18cm以内 长4m以内	m3	3.959	2124.000	8407.85
439	420100100285	杉原木	Φ 20cm以内 长4m以内	m3	7.945	2301.000	18281.91
440	420100100317	煅铁		kg	16.640	6.810	113.32
441	420100100433	杉原木	Φ 38CM以内 长7M以内	m3	7.072	12389.000	87617.49
442	420100100449	杉原木	Φ ≥40cm 特材 长8m以内	m3	5.820	8547.010	49743.60
443	420100100455	杉木特大方	截面226-576CM2 长5M以内	m3	1.141	6195.000	7070.35
444	420100100463	杉木特大方	截面226-576cm2 长2m以内	m3	0.912	4159.000	3791.34
445	420100100471	杉原木	Φ 32cm以内 长2m以内	m3	3.732	3540.000	13211.28
446	420100100603	铁件	综合	kg	2.447	6.851	16.77
447	420101300117	木模板松板材		m3	0.733	1991.000	1458.61
448	430500700015	钢丝网		m2	415.800	7.450	3097.71
449	430501100775	钢管支撑		kg	10.354	5.150	53.32
450	440101300093	钢管保护管	Φ 40×400	根	2.600	3.880	10.09
451	470100700007	沥青漆		kg	0.107	7.260	0.78
452	470900100185	橡胶石棉垫圈	δ 4	kg	0.551	5.730	3.16

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第14页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
453	480100300001	变压器油		kg	0.600	10.930	6.56
454	481100700005	乳胶		kg	16.500	9.290	153.29
455	481300100013	乙炔气		m3	0.028	28.460	0.79
456	49010001	定额人工费		元	13451.188	1.000	13451.19
457	49010030	其他材料费		%	2637.321	1.000	2637.32
458	49010030	其他材料费		%	1152.950	1.000	1152.95
459	49010040	其他材料费		元	15416.615	1.000	15416.62
460	49010040	其他材料费		元	4100.134	1.000	4100.13
461	49010240	膜材料附件		m2	215.000	53.100	11416.50
462	49010790	监控摄像设备(监控设备立杆	杆长3.5m)	根	41.082	520.000	21362.64
463	49011001	井盖、井算安装(检查井井盖、座	混凝土)700*700	套	10.000	150.000	1500.00
464	49011001	基肥		kg	41865.000	0.440	18420.60
465	49011001	摄像机抱杆支架		套	41.000	55.000	2255.00
466	49011003	新增店招（50宽*1.5厚不锈钢店招LOGO）		个	47.000	800.000	37600.00
467	49011004	宫粉紫荆	胸径13-14cm，H:4.5m，P: 2m 全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美	株	19.000	1400.000	26600.00
468	49011004	黄花风铃木	胸径13-14cm，H:3m，P: 2m 分层明显,具5层平展大枝以上,全冠假植苗,3级以上分枝,冠幅饱满,树型优美	株	25.000	1300.000	32500.00
469	49011004	造型罗汉松飘	胸径14-15cm，H:2.5-3m，P: 3-3.5m 特选,偏冠,造型飘逸,高度冠幅为准,全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美	株	3.000	5800.000	17400.00
470	49011004	造型红花继木桩景	胸径12-13cm，H:2.5-3m，P: 2.5-3m 特选,偏冠,造型飘逸,高度冠幅为准,全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美	株	3.000	4500.000	13500.00
471	49011004	鸡爪槭	胸径8-9cm，H:2m，P: 1.8m 全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美	株	2.000	820.000	1640.00

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第15页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
472	49011004	墨西哥落羽杉	胸径13-14cm, H:5m, P: 2m 全冠假植苗, 3级以上分枝, 冠幅饱满, 树型优美	株	16.000	880.000	14080.00
473	49011004	秋枫	胸径15-16cm, H:3.5m, P: 2.5m 枝下高1.8-2.2米, 全冠假植苗, 3级以上分枝, 冠幅饱满, 树型优美	株	25.000	1500.000	37500.00
474	49011004	红花鸡蛋花	胸径11-12cm, H:3m, P: 2.8m 全冠假植苗, 冠幅饱满, 树型优美	株	8.000	800.000	6400.00
475	49011004	蓝花楹	胸径15-16cm, H:3.8m, P: 1.5m 全冠假植苗, 3级以上分枝, 冠幅饱满, 树型优美	株	67.000	1466.000	98222.00
476	49011004	南洋楹	胸径19-20cm, H:5.5m, P: 3m 全冠假植苗, 冠幅饱满, 树型优美	株	48.000	1800.000	86400.00
477	49011004	木棉	腹径30-35, H:5m, P: 3m 全冠假植苗, 3级以上分枝, 冠幅饱满, 树型优美	株	9.000	1600.000	14400.00
478	49011004	小叶榄仁	胸径13-14cm, H:7.5m, P: 2m 分层明显, 具5层平展大枝以上, 全冠假植苗, 3级以上分枝, 冠幅饱满, 树型优美	株	25.000	1560.000	39000.00
479	49011004	香樟	胸径15-17cm, H:3.5m, P: 2.8m 枝下高1.8-2米, 全冠假植苗, 3级以上分枝, 树型优美	株	15.000	1800.000	27000.00
480	49011004	日本晚樱	胸径8-9cm, H:2.5-3m, P: 1.5m 多花, 全冠假植苗, 3级以上分枝, 冠幅饱满, 树型优美	株	62.000	1200.000	74400.00
481	49011004	大香樟	胸径30-32cm, H:9m, P: 5m 特选, 全冠假植苗, 4级以上分枝, 冠幅饱满, 树型优美	株	2.000	5300.000	10600.00
482	49011004	丛生四季桂	胸径10-12cm, H:2.5m, P: 2m 低分枝, 冠幅伞形, 高度冠幅为准, 全冠假植苗, 冠幅饱满, 树型优美	株	5.000	1500.000	7500.00
483	49011021	摇摇乐 (弹簧+塑料: 1000*640*750mm)		个	3.000	450.000	1350.00
484	49011021	扭腰器 (碳素钢管: 1500*1400*1300mm)		个	1.000	800.000	800.00
485	49011021	儿童活动器械 (碳素钢管: 4800*4000*4300mm)		个	1.000	12000.000	12000.00

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第16页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
486	49019263	玻璃钢坐凳		个	5.000	1500.000	7500.00
487	49019263	打卡相框		个	1.000	12500.000	12500.00
488	49019263	景观廊架		个	2.000	8900.000	17800.00
489	49019263	龟甲冬青球A	H: 80-100cm, P: 100cm 球型, 不脱脚, 冠幅饱满不偏冠, 袋苗		9.000	120.000	1080.00
490	49019263	龟甲冬青球A	H: 80cm, P: 80cm 球型, 不脱脚, 冠幅饱满不偏冠, 袋苗		10.000	100.000	1000.00
491	49019263	丛生紫薇	H: 180-200cm, P: 150cm 多株拼丛, 花淡粉, 以高度冠幅为准, 袋苗, 全冠, 冠幅饱满, 树型优美		15.000	420.000	6300.00
492	49019263	红花继木球	H: 110-120cm, P: 110-120cm 球型, 不脱脚, 冠幅饱满不偏冠, 袋苗		20.000	130.000	2600.00
493	49019263	金叶女贞球	H: 110-120cm, P: 110-120cm 球型, 不脱脚, 冠幅饱满不偏冠, 袋苗		12.000	120.000	1440.00
494	49019263	互动墙		个	1.000	50000.000	50000.00
495	49019263	户外白色不锈钢“鲸鱼”滑梯意向图		个	1.000	85000.000	85000.00
496	49019263	玫瑰花灯		个	3.000	1200.000	3600.00
497	49019263	成品漫步机		个	2.000	1500.000	3000.00
498	49019263	肩关节康复器		个	2.000	1800.000	3600.00
499	49019263	高低杆		个	2.000	1200.000	2400.00
500	49019263	镇标		个	1.000	1800.000	1800.00
501	49019263	指示牌		个	20.000	1500.000	30000.00
502	49019263	同安红三角梅	H: 120-150cm, P: 80cm		10.000	280.000	2800.00
503	49019263	核心价值观小品		个	3.000	28000.000	84000.00
504	49019263	警示牌		个	18.000	1800.000	32400.00
505	49019263	展示牌		个	16.000	1500.000	24000.00
506	49019263	海桐球	H: 130-150cm, P: 130-150cm 球型, 不脱脚, 冠幅饱满不偏冠, 袋苗		8.000	420.000	3360.00
507	49019263	入口标识		个	1.000	45000.000	45000.00
508	49019263	异形水磨石坐凳		个	3.000	1500.000	4500.00
509	49019264	石桌石凳		套	1.000	1800.000	1800.00
510	49019265	肩关节康复器		个	2.000	1000.000	2000.00
511	49019265	漫步机		个	2.000	1200.000	2400.00
512	49019265	高低杠		个	1.000	800.000	800.00
513	49019267	仿竹篱笆		m	110.000	200.000	22000.00
514	49019268	垃圾箱		个	16.000	850.000	13600.00
515	49019270	雕刻及其他装饰		项	1.000	180000.000	180000.00

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第17页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
516	49019271	双丙聚氨酯密封处理		m2	1110.000	12.000	13320.00
517	49019272	充电桩设备		个	6.000	12500.000	75000.00
518	570700100003	砌筑水泥砂浆	M5(32.5)	m3	13.041	191.376	2495.73
519	570700100005	砌筑混合砂浆	M7.5(32.5)	m3	0.025	198.276	5.00
520	570700900001	石灰粘土砂浆 1:0.3:4		m3	1.329	288.447	383.46
521	5707009000055	乌烟麻刀石灰浆		m3	2.024	667.095	1349.93
522	5707009000075	麻刀石灰浆		m3	1.082	667.095	722.06
523	57290001	监控设备柜		个	10.000	800.000	8000.00
524	57290001	前端设备柜		个	1.000	105.000	105.00
525	80010020	水泥砂浆	1:2(32.5)	m3	0.061	294.488	18.08
526	80010020	水泥砂浆	1:2(32.5)	m3	0.117	294.488	34.38
527	80010020	水泥砂浆	1:2(32.5)	m3	0.001	375.419	0.19
528	80010030	水泥砂浆	1:2.5(32.5)	m3	0.434	282.111	122.44
529	80010030	水泥砂浆	1:2.5(32.5)	m3	7.020	282.111	1980.42
530	80010040	水泥砂浆	1:3(32.5)	m3	112.986	254.166	28717.30
531	80010160	砌筑水泥砂浆	M7.5(32.5)	m3	3.740	198.276	741.63
532	80010170	砌筑水泥砂浆	M10(32.5)	m3	0.216	212.421	45.88
533	80010210	砌筑水泥砂浆	M7.5(42.5)	m3	5.029	196.926	990.38
534	80010220	砌筑水泥砂浆	M10(42.5)	m3		212.096	
535	80010340	干硬性水泥砂浆	1:3	m3	4.865	290.600	1413.89
536	80010350	现拌砌筑砂浆	M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.284	177.016	50.27
537	80010350	现拌砌筑砂浆	M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.310	177.016	54.84
538	80010460	现拌抹灰砂浆	1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	1.229	538.351	661.42
539	80010460	现拌抹灰砂浆	1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	4.158	538.351	2238.46
540	80010480	现拌抹灰砂浆	1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	5.307	333.301	1768.90
541	80010480	现拌抹灰砂浆	1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	2.101	333.301	700.37
542	80010490	现拌抹灰砂浆	1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	17.237	298.792	5150.22
543	80010500	现拌抹灰砂浆	1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	25.750	267.742	6894.41
544	80010680	预拌同配比砂浆	C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.242	323.880	78.51
545	80010680	预拌同配比砂浆	C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.303		

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第18页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
546	80010680	预拌同配比砂浆	C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.061	310.330	18.81
547	80050150	现拌混合砂浆	M5(42.5)	m3	15.212	163.368	2485.12
548	80110110	素水泥浆		m3	5.701	519.093	2959.09
549	80150080	冷底子油	30:70	kg	95.990	6.233	598.31
550	80210005	普通混凝土	C15(32.5) 砾石20mm 塌落度10-30mm	m3	3.045	242.333	737.90
551	80213570	预拌非泵送普通混凝土	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	10.150	312.620	3173.09
552	80213575	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	10.100	352.600	3561.26
553	80213575	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	30.375	337.860	10262.50
554	80213575	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	535.940	337.860	181072.69
555	80213580	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	11.069	347.570	3847.39
556	80213580	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	150.732	347.570	52389.92
557	80213580	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	10.150	408.760	4148.91
558	80213585	预拌非泵送普通混凝土	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	0.980	364.340	356.94
559	80213765	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm	m3	50.288	387.380	19480.53
560	80216010	预拌非泵送彩色透水混凝土	C25(42.5) 碎石5~10mm	m3	56.499	856.160	48372.18
561	80270160	透水水泥混凝土	C25(42.5)	m3		372.130	
562	80310020	灰土	3:7	m3	14.280	179.020	2556.41
三		设备					
1	23050001	加压潜泵	DN110 Q=12.0L/S, H=40m, N=11kW	套	1.000	3250.000	3250.00
2	79011001	4路时控器		台	1.000	1800.000	1800.00
3	79011001	4G四路无线智能终端		台	1.000	2800.000	2800.00
4	79011001	4口POE交换机		台	7.000	360.000	2520.00
5	79011001	24口千兆交换机		台	3.000	2100.000	6300.00
6	79011001	枪式彩色摄像机	400W全彩	台	41.000	885.000	36285.00
7	79011001	8口千兆交换机		台	3.000	480.000	1440.00
8	79011001	42寸液晶显示器		台	1.000	3180.000	3180.00
9	79011001	成套配电箱安装	配电箱APcdz1	台	1.000	5800.000	5800.00
10	79011001	成套配电箱安装	配电箱ALxt	台	1.000	6800.000	6800.00
11	79011001	成套配电箱安装	配电箱ALjg1/ALjg2	台	2.000	5200.000	10400.00
12	79011001	成套配电箱安装	配电箱ALjg3	台	1.000	5200.000	5200.00
13	79011001	成套配电箱安装	配电箱ALjg4	台	1.000	5200.000	5200.00

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第19页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
14	79011001	成套配电箱安装	配电箱ALJg5	台	1.000	5200.000	5200.00
15	79011002	光纤收发器		台	10.000	450.000	4500.00
16	79011002	嵌入式网络硬盘录像机		台	1.000	3560.000	3560.00
17	79011002	监控专用硬盘		台	8.000	1150.000	9200.00
18	79011002	组合型成套箱式变电站安装 (带高压开关柜 变压器容量 100kV·A以下)		台	1.000	81146.020	81146.02
19	79011008	橡胶垫		个	984.000	8.000	7872.00
20	79019263	字宽30,3厚PVC蓝色广告字		个	74.000	120.000	8880.00
21	79019263	字宽30,3厚PVC蓝色广告字		个	51.000	180.000	9180.00
四		施工机具					
1	620000000679	彩色监视器		台班	8.200	4.890	40.10
2	621300100071	电动打磨机		台班	1.440	12.670	18.24
3	622300100675	施工机具使用费		元	277.300	1.000	277.30
4	622300100677	光纤测试仪		台班	3.000	278.840	836.52
5	622300100741	网络测试仪		台班	0.780	152.750	119.15
6	98050001	数字万用表	F-87	台班	1.682	5.050	8.49
7	98050050	真有效值万用表	工业用	台班	7.541	6.030	45.47
8	98050200	相位表		台班	0.789	10.330	8.15
9	98110100	高压绝缘电阻测试仪		台班	0.775	39.840	30.87
10	98110180	接地电阻测试仪	钳形	台班	0.110	13.310	1.46
11	98170020	对讲机		台班	16.485	5.510	90.83
12	98350021	电缆测试仪	JH5132	台班	0.841	8.600	7.23
13	98470140	笔记本电脑		台班	48.800	10.240	499.71
14	98470520	打印机	宽行	台班	0.260	5.790	1.51
15	98470740	振荡器		台班	0.789	18.200	14.36
16	99010020	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1m3	台班	0.500	1389.507	694.75
17	99010030	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1.25m3	台班	0.090	1172.270	105.50
18	99010030	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1.25m3	台班	16.370	1425.036	23327.13
19	99010130	轮胎式单斗挖掘机	液压 斗容量0.6m3	台班	5.628	742.390	4178.17
20	99010140	履带式液压挖掘机(带液压 锤)	HM960	台班	0.252	1711.200	430.98
21	99050010	电动滚筒式混凝土搅拌机	出料容量400L	台班	0.194	251.784	48.85
22	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	45.084	162.197	7312.49
23	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	0.522	162.370	84.79
24	99050740	平板式混凝土振捣器		台班	6.660	8.970	59.74

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第20页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
25	99050880	混凝土抹平机	功率 5.5kW	台班	0.126	21.786	2.75
26	99070030	履带式推土机	功率75kW	台班	0.072	761.660	55.02
27	99070030	履带式推土机	功率75kW	台班	13.063	873.639	11412.12
28	99070040	履带式推土机	功率90kW	台班	0.500	955.552	477.78
29	99070270	轮胎式装载机	斗容量1.0m3	台班	4.855	914.341	4439.40
30	99070280	轮胎式装载机	斗容量1.5m3	台班	2.183	1043.708	2278.62
31	99070510	载货汽车	装载质量4t	台班	14.244	531.563	7571.45
32	99070520	载货汽车	装载质量5t	台班	0.586	384.650	225.40
33	99070520	载货汽车	装载质量5t	台班	0.653	543.701	355.06
34	99070530	载货汽车	装载质量6t	台班	4.154	563.399	2340.36
35	99070540	载货汽车	装载质量8t	台班	8.506	622.627	5296.31
36	99070670	自卸汽车	装载质量15t	台班	0.090	884.080	79.49
37	99070670	自卸汽车	装载质量15t	台班	100.305	958.354	96127.43
38	99070730	平板拖车组	装载质量20t	台班	0.306	1166.124	357.06
39	99070750	平板拖车组	装载质量40t	台班	1.000	1531.079	1531.08
40	99070870	机动翻斗车	装载质量1t	台班	2.565	284.339	729.41
41	99070990	轨道平车	装载质量10t	台班	1.194	80.367	95.96
42	99090300	汽车式起重机	提升质量5t	台班	0.558	332.520	185.61
43	99090300	汽车式起重机	提升质量5t	台班	7.573	500.068	3786.96
44	99090310	汽车式起重机	提升质量8t	台班	10.445	837.291	8745.19
45	99090320	汽车式起重机	提升质量10t	台班	0.150	906.821	136.02
46	99090360	汽车式起重机	提升质量25t	台班	0.371	1178.129	436.86
47	99090560	门式起重机	提升质量10t	台班	0.974	499.602	486.42
48	99090570	门式起重机	提升质量20t	台班	0.369	670.797	247.80
49	99090640	叉式起重机	提升质量5t	台班	0.041	614.628	24.89
50	99091170	电动卷扬机	单筒慢速 牵引力50kN	台班		168.615	
51	99110020	手动液压叉车		台班	5.000	182.740	913.70
52	99110030	小型工程车		台班	14.558	534.990	7788.14
53	99130200	振动压路机	工作质量15t	台班	1.396	971.360	1355.92
54	99130280	电动夯实机	夯实能力20~62N.m	台班	58.552	27.160	1590.28
55	99130650	自行式热熔划线车		台班	3.644	216.490	788.84
56	99130660	热熔釜熔解车		台班	3.644	462.250	1684.32
57	99130670	手推式热熔底漆车		台班	3.644	265.640	967.93
58	99170010	钢筋调直机	直径40mm	台班	4.090	28.860	118.05
59	99170020	钢筋切断机	直径40mm	台班	2.604	38.824	101.09
60	99170040	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	6.842	23.829	163.03
61	99190180	端部铣床		台班	0.302	138.460	41.85
62	99190270	摇臂钻床	钻孔直径50mm	台班		20.258	0.01
63	99190300	摇臂钻床	Z3050×16/1	台班	0.118	134.380	15.92
64	99190310	数控平板钻床	CDMP2012	台班	0.118	306.090	36.26

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第21页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
65	99190320	数控转角带锯床	SAW1260	台班	0.118	235.600	27.91
66	99190420	剪板机	厚度×宽度 40×3100mm	台班	0.197	712.649	140.73
67	99190440	型钢剪断机	剪断宽度500mm	台班		379.224	0.04
68	99190470	钢材电动煨弯机	弯曲直径500~1800mm	台班	1.092	76.558	83.60
69	99190770	刨边机	加工长度12000mm	台班	0.437	664.311	290.00
70	99190800	管子切断机	Φ150	台班	2.560	31.610	80.92
71	99190800	管子切断机	Φ150	台班	1.204	31.356	37.75
72	99190860	管子切断套丝机	Φ159	台班	0.570	20.039	11.42
73	99191220	台式砂轮机		台班	1.946	46.000	89.52
74	99191440	液压矫正机	YJZ-60B	台班	0.154	376.840	58.17
75	99191820	石料切割机		台班	71.851	17.000	1221.47
76	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.013	24.130	0.31
77	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	6.773	23.964	162.32
78	99210010	木工圆锯机	直径600mm	台班	0.560	32.205	18.03
79	99210040	木工平刨床	刨削宽度300mm	台班	3.360	9.942	33.41
80	99210060	木工单面压刨床	刨削宽度 600mm	台班	4.121	30.071	123.91
81	99230050	砂轮切割机	Φ400	台班	0.103	5.460	0.56
82	99230070	金刚石磨光机		台班	14.420	18.970	273.55
83	99230100	氧割设备		台班	33.800	104.830	3543.25
84	99230140	数控切割机	CNC/GDZ-400	台班	0.533	219.680	117.11
85	99250001	交流弧焊机	容量21kVA	台班	1.005	54.770	55.02
86	99250001	交流弧焊机	容量21kVA	台班	17.320	54.398	942.15
87	99250010	交流弧焊机	容量30kVA	台班	0.202	89.460	18.04
88	99250020	交流弧焊机	容量32kVA	台班	11.310	79.463	898.69
89	99250040	交流弧焊机	容量42kVA	台班	3.920	110.645	433.73
90	99250110	直流弧焊机	容量 32kV·A	台班	4.045	83.653	338.42
91	99250150	对焊机	容量75kVA	台班	1.028	102.380	105.26
92	99250210	氩弧焊机	电流500A	台班	1.440	88.110	126.88
93	99250240	二氧化碳气体保护焊机	电流500A	台班	4.229	119.267	504.34
94	99250310	电渣焊机	电流1000A	台班	0.408	151.545	61.83
95	99250500	埋弧焊接机		台班	1.436	279.030	400.69
96	99250510	埋弧气刨机	ZX5-1000	台班	0.790	111.180	87.81
97	99250560	电焊机		台班	0.941	60.840	57.22
98	99270140	焊剂烘干机	YJJ-A-300	台班	0.395	38.970	15.39
99	99310030	洒水车	罐容量4000L	台班	33.164	600.511	19915.26
100	99330060	风动凿岩机	手持式	台班	26.230	11.151	292.49
101	99430170	电动空气压缩机	排气量0.6m3/min	台班	0.093	34.592	3.22
102	99430180	电动空气压缩机	排气量1m3/min	台班	0.851	47.139	40.11
103	99430220	电动空气压缩机	排气量10m3/min	台班	0.464	341.133	158.35
104	99430260	内燃空气压缩机	排气量3m3/min	台班	13.253	250.988	3326.29

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-新东村

第22页 共22页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
105	99440010	电动单级离心清水泵	出口直径Φ100	台班	0.183	31.424	5.75
106	99440460	试压泵	压力3MPa	台班	0.755	16.431	12.41
107	99450550	其他机械费		元	1910.613	1.000	1910.61
108	99450770	恒温箱		台班	0.395	59.560	23.52
109	99450780	电焊条恒温箱		台班	0.044	53.185	2.34
110	99450790	电焊条烘干箱	容积450×350×450	台班	0.448	15.830	7.10
111	99450810	电焊条烘干箱	容积600×500×750	台班	0.044	24.892	1.10

工程项目造价汇总表

工程名称:南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费 (元)
1	环库绿化景观提升	1185289.00	28131.00
2	村容村貌提升	10831.00	310.00
合 计		1196120.00	28441.00

单项工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村 环库绿化景观提升 第1页 共2页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	1. 步道提升	446146.00	12779.00
2	2. 园路挡墙	106815.00	3060.00
3	3. 花池提升	59545.00	1706.00
4	4. 绿化提升	367180.00	6488.00
5	5. 智慧导览导视系统及夜景	205603.00	4098.00
合 计		1185289.00	28131.00

单项工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村 村容村貌提升

第2页 共2页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	1. 垃圾桶	10831.00	310.00
合 计		10831.00	310.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村 环库绿化景观提升 1. 步道提升

第1页 共6页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	430275.00
1.1	园林建筑	430275.00
2	措施项目费	15871.00
2.1	总价措施项目费	15871.00
2.1.1	安全文明施工费	12779.00
2.1.2	其他总价措施费	2108.00
2.1.3	扬尘防治措施费	984.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		446146.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村 环库绿化景观提升 2. 园路挡墙 第2页 共6页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	103014.00
1.1	园林建筑	103014.00
2	措施项目费	3801.00
2.1	总价措施项目费	3801.00
2.1.1	安全文明施工费	3060.00
2.1.2	其他总价措施费	505.00
2.1.3	扬尘防治措施费	236.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		106815.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村 环库绿化景观提升 3. 花池提升

第3页 共6页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	57427.00
1.1	园林建筑	57427.00
2	措施项目费	2118.00
2.1	总价措施项目费	2118.00
2.1.1	安全文明施工费	1706.00
2.1.2	其他总价措施费	281.00
2.1.3	扬尘防治措施费	131.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		59545.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村 环库绿化景观提升 4. 绿化提升 第4页 共6页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	358436.00
1.1	绿化种植	358436.00
2	措施项目费	8744.00
2.1	总价措施项目费	8744.00
2.1.1	安全文明施工费	6488.00
2.1.2	其他总价措施费	1756.00
2.1.3	扬尘防治措施费	500.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		367180.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村 环库绿化景观提升 5. 智慧
导览导视系统及夜景

第5页 共6页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	200662.00
1.1	电气工程	160564.00
1.2	排水工程	40098.00
2	措施项目费	4941.00
2.1	总价措施项目费	4941.00
2.1.1	安全文明施工费	4098.00
2.1.2	其他总价措施费	843.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		205603.00

单位工程造价汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村 村容村貌提升 1.垃圾桶 第6页 共6页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	10446.00
1.1	园林建筑	10446.00
2	措施项目费	385.00
2.1	总价措施项目费	385.00
2.1.1	安全文明施工费	310.00
2.1.2	其他总价措施费	51.00
2.1.3	扬尘防治措施费	24.00
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
合 计=1+2+3		10831.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
环库绿化景观提升							
1. 步道提升							
园林建筑							
1	050201001019	园路	(1)600*300*50厚青石板 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)120厚C20混凝土结构层 (4)150厚级配碎石垫层 (5)素土夯实，夯实度≥93%	m2	665.000	373.40	248311.00
2	041001002001	拆除人行道	(1)?50~80鹅卵石平铺(拆除)	m2	582.650	6.13	3571.64
3	041001003001	拆除基层	(1)C20混凝土垫层 (2)10cm	m2	582.650	12.52	7294.78
4	041001003002	拆除基层	(1)碎石灌砂垫层 (2)15cm	m2	582.650	3.69	2149.98
5	040103002001	余方弃置	(1)石渣 (2)自行考虑	m3	209.754	31.01	6504.47
6	050307017003	展示牌	(1)展示牌 (2)5厚120X120镀锌方通立柱 (3)2.5厚不锈钢板外包,喷砂面 (4)3厚80X80镀锌方通 (5)2厚20X20镀锌方通 (6)2.5厚镀锌钢板外包,深灰色氟碳漆饰面 (7)2厚40X20镀锌方通 (8)C20细石混凝土浇筑 (9)10厚300X300预埋钢板,与4 12预埋筋焊接,L=200 (10)250厚350X350 C20混凝土基础 (11)素土夯实	个	1.000	43255.83	43255.83
7	050307017004	解说牌	(1)展示牌 (2)5厚70X70镀锌方通立柱 (3)3厚70X70镀锌方通@1000 (4)2.5厚镀锌钢板外包,深灰色氟碳漆饰面 (5)C20细石混凝土浇筑 (6)10厚300X300预埋钢板,与4 12预埋筋焊接,L=200 (7)250厚350X350 C20混凝土基础 (8)素土夯实	个	1.000	14991.51	14991.51
8	050201001020	园路	(1)草坪种植铺设 (2)50*50*100厚植草	m2	470.000	177.76	83547.20

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			格 草坪种植沙土压实填充 (3)150厚级配碎石垫层 (4)100厚碎石垫层 (5)土工布 (120g/m²) (6)素土夯实 (夯实系数大于0.93)				
9	050201003001	路牙铺设	(1)100*100*100厚芝麻灰弹石 镶边 (2)C20混凝土卧牢 (3)150厚C20混凝土垫层	m	208.000	99.27	20648.16
2. 园路挡墙							
园林建筑							
10	050307016004	挡墙	(1)30-40厚青色毛石片饰面 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)30-40厚青色毛石片饰面 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌砂垫层 (7)素土夯实, 夯实度≥93%	m3	83.700	1230.75	103013.78
3. 花池提升							
园林建筑							
11	050307016005	花池	(1)30-40厚青色毛石片饰面 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)30-40厚青色毛石片饰面 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌砂垫层 (7)素土夯实, 夯实度≥93%	m3	36.000	1595.20	57427.20
4. 绿化提升							
绿化种植							
12	050102001001	栽植乔木	(1)鸡爪槭 (2)胸径8-9cm (3)高度:2m, 冠幅:1.8m (4)带土球 (5)成活养护半年, 日常养护半年	株	81.000	1135.95	92011.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(6)全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株				
13	050102002001	栽植灌木	(1)丛生紫薇 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 180-200cm (5)P: 150cm (6)多株拼丛,花淡粉,以高度冠幅为准,袋苗,全冠,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	63.000	659.28	41534.64
14	050102002002	栽植灌木	(1)茶花 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 110-130cm (5)P: 80-100cm (6)全冠容器苗,精品苗,冠幅饱满,树型优美,大于三级分枝 (7)10kg/株	株	50.000	333.94	16697.00
15	050102007039	栽植色带	(1)成活养护半年,日常养护半年 (2)36株/m2 (3)九里香 (4)H:30-35cm, P: 25-30cm (5)5kg/m2	m2	148.200	88.46	13109.77
16	050102007040	栽植色带	(1)成活养护半年,日常养护半年 (2)36株/m2 (3)墨西哥鼠尾草 (4)H:25-30cm, P: 20-25cm (5)5kg/m2	m2	1445.800	79.60	115085.68
17	050102012001	铺种草皮	(1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)马尼拉 (3)满铺	m2	1092.400	29.87	32629.99
18	050101010005	整理绿化用地	(1)绿地整理(整理绿化地)客土回填	m2	2686.400	4.24	11390.34
19	050101009005	种植土回(换)填	(1)符合设计要求 (2)30cm	m3	805.920	44.64	35976.27
5. 智慧导览导视系统及夜景							
电气工程							
		景观电气					
20	030404017001	配电箱	(1)景观配电箱AL-JQ (2)基础槽钢制作、安装 (3)M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 (4)100厚C15素混凝土	台	1.000	4952.68	4952.68

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			垫层 (5)100厚C20素混凝土 压顶 (6)280*20厚烧面灰麻饰面				
21	040805004001	景观照明灯	(1)庭院灯H=3.5m 50W LED灯 AC220V 4000K IP65 (2)C20基础(预拌非泵送普通混凝土) (3)镀锌扁钢-25*4 (4)镀锌扁钢-40*4 L=110 (5)角钢接地极	套	16.000	2596.15	41538.40
22	040504001005	砌筑井	(1)排水井垫层(砂砾石) (2)排水井垫层(砂碎石) (3)砌筑井壁(砖砌井壁矩形) (4)C20现浇现拌普通混凝土井室盖板(现拌普通混凝土井室盖板)	座	9.000	976.50	8788.50
23	030411001002	配管	(1)材质:硬塑料管 (2)规格:PE32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、油漆、接地	m	200.000	18.84	3768.00
24	030411001004	配管	(1)材质:硬塑料管 (2)规格:PE25 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、油漆、接地	m	640.000	14.69	9401.60
25	030408001004	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZC-YJY (3)规格:4×25+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:室外 (6)电压等级(kV):1KV	m	205.000	147.88	30315.40
26	030408001005	电力电缆	(1)规格:YJV-3*4 (2)名称:电缆	m	656.000	23.99	15737.44
27	030408001002	电力电缆	(1)规格:YJV-2*4 (2)名称:电缆	m	25.250	19.25	486.06
28	030408001003	电力电缆	(1)规格:YJV-5*10 (2)名称:电缆	m	225.220	64.06	14427.59
29	030411004001	配线	(1)JHS-4*2.5	m	115.140	19.86	2286.68
30	030411004002	配线	(1)RVS -2X4	m	261.140	19.86	5186.24
31	030411006001	接线盒	(1)防水盒子 (2)明装	个	26.000	15.09	392.34
32	030506006001	背景音乐系统试运行	(1)名称:公共广播、背景音乐系统试运行(系统试运行)	系统	1.000	15252.82	15252.82
33	040101002002	挖沟槽土方	(1)三类土	m3	505.550	7.42	3751.18

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2) 2m以内				
34	040103001005	填方	(1) 符合设计要求 (2) 原土 (3) 符合设计要求	m3	504.640	8.48	4279.35
排水工程							
35	040101002001	挖沟槽土方	(1) 三类土 (2) 2m以内	m3	235.515	7.43	1749.88
36	040103001003	填方	(1) 符合设计要求 (2) 机制砂 (3) 符合设计要求	m3	26.370	106.51	2808.67
37	040103001004	填方	(1) 符合设计要求 (2) 原土 (3) 符合设计要求	m3	208.770	8.51	1776.63
38	031001006006	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN25 (3) 1.25Mpa	m	84.285	14.31	1206.12
39	031001006008	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN40 (3) 1.25Mpa	m	14.365	18.73	269.06
40	031001006009	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN50 (3) 1.25Mpa	m	135.645	24.12	3271.76
41	031001006010	塑料管	(1) 热熔连接 (2) PE100管DN63 (3) 1.25Mpa	m	142.215	33.14	4713.01
42	031001006011	塑料管	(1) HDPE双壁波纹管管 DN200	m	80.000	80.99	6479.20
43	040504001003	砌筑井	(1) C15混凝土垫层 (2) C25现浇底板 (3) C25预拌非泵送细石 混凝土盖板 (4) 砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (5) 预制混凝土(圆钢筋 Φ10以外) (6) 井盖、井箅安装(检 查井井盖、座 普通铸 铁) (7) 井盖、井箅安装(安 全防坠网) (8) 井盖、井箅安装(塑 钢爬梯踏步) (9) 05S502 16页	座	1.000	3852.76	3852.76
44	031003013001	水表	(1) 水表组(闸阀 DN80 2个, 水表LXS-80 1个, 防止倒流器 DN80 1个)	组/个	1.500	2448.12	3672.18
45	031003001003	螺纹阀门	(1) 截止阀 DN50	个	9.000	276.88	2491.92
46	031003001004	螺纹阀门	(1) 快速取水阀DN25 (2) C20基础 (3) 卵石透水层	个	12.000	79.06	948.72
47	030109011001	潜水泵	(1) 加压潜水泵, DN110 (2) Q=12.0L/S, H=40m, N =11kW	台	1.500	4268.23	6402.35

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
环库绿化景观提升													
1. 步道提升													
园林建筑													
1	050201001019	园路 (1)600*300*50厚青石板 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (3)120厚C20混凝土结构层 (4)150厚级配碎石垫层 (5)素土夯实，夯实度≥93%	m2	665.000	95.06	207.35		1.44	19.32	19.39		30.84	373.40
1.1	50103037T	600*300*50厚青石板	m2	665.000	69.50	140.98		1.19	13.46	13.51		21.48	260.12
1.2	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	79.800	68.19	361.20		1.17	27.38	27.48		43.69	529.11
1.3	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	99.750	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
1.4	50103001	园路土基整理路床	m2	665.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
2	041001002001	拆除人行道 (1)?50~80鹅卵石平铺(拆除)	m2	582.650	4.98				0.32	0.32		0.51	6.13
2.1	40104023	拆除人行道(普通粘土砖 侧铺)	m2	582.650	4.98				0.32	0.32		0.51	6.13
3	041001003001	拆除基层 (1)C20混凝土垫层 (2)10cm	m2	582.650	8.85	0.03		1.31	0.65	0.65		1.03	12.52
3.1	40104019	拆除人行道(现浇混凝土面(垫)层 厚10cm以内)	m2	582.650	8.85	0.03		1.31	0.65	0.65		1.03	12.52
4	041001003002	拆除基层 (1)碎石灌砂垫层 (2)15cm	m2	582.650	0.14			2.86	0.19	0.19		0.30	3.69
4.1	40101153T	挖掘机挖石碴(装车) 机械拆除道路	m3	87.398	0.95			19.07	1.27	1.28		2.03	24.60
5	040103002001	余方弃置 (1)石渣 (2)自行考虑	m3	209.754	0.65			24.58	1.61	1.61		2.56	31.01
5.1	40101155	机械装石方(装载机装车 石渣)	m3	209.754	0.47			3.55	0.26	0.26		0.41	4.95
5.2	40101162T	自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距5km以内)	m3	209.754	0.18			21.03	1.35	1.35		2.15	26.06

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
6	050307017003	展示牌 (1)展示牌 (2)5厚120X120镀锌方通立柱 (3)2.5厚不锈钢板外包,喷砂面 (4)3厚80X80镀锌方通 (5)2厚20X20镀锌方通 (6)2.5厚镀锌钢板外包,深灰色氟碳漆饰面 (7)2厚40X20镀锌方通 (8)C20细石混凝土浇筑 (9)10厚300X300预埋钢板,与4 12预埋筋焊接,L=200 (10)250厚350X350 C20混凝土基础 (11)素土夯实	个	1.000	76.57	35115.68		7.05	2238.68	2246.28		3571.58	43255.83
6.1	05B001T	展示牌	个	1.000		35000.00			2226.00	2233.56		3551.36	43010.92
6.2	40304018	铁件、拉杆制作安装(铁件 预埋铁件)	t	0.020	3583.69	3998.45		352.65	504.65	506.37		805.12	9750.93
6.3	40305004T	C20基础(预拌非泵送普通混凝土)	m3	0.096	50.97	371.95			26.90	26.99		42.91	519.72
7	050307017004	解说牌 (1)展示牌 (2)5厚70X70镀锌方通立柱 (3)3厚70X70镀锌方通@1000 (4)2.5厚镀锌钢板外包,深灰色氟碳漆饰面 (5)C20细石混凝土浇筑 (6)10厚300X300预埋钢板,与4 12预埋筋焊接,L=200 (7)250厚350X350 C20混凝土基础 (8)素土夯实	个	1.000	76.57	12115.68		7.05	775.88	778.51		1237.83	14991.51
7.1	05B001T	解说牌	个	1.000		12000.00			763.20	765.79		1217.61	14746.60
7.2	40304018	铁件、拉杆制作安装(铁件 预埋铁件)	t	0.020	3583.69	3998.45		352.65	504.65	506.37		805.12	9750.93
7.3	40305004T	C20基础(预拌非泵送普通混凝土)	m3	0.096	50.97	371.95			26.90	26.99		42.91	519.72
8	050201001020	园路 (1)草坪种植铺设 (2)50*50*100厚植草格 草坪种植沙土压实填充 (3)150厚级配碎石垫层	m2	470.000	53.59	90.91		0.15	9.20	9.23		14.68	177.76

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(4)100厚碎石垫层 (5)土工布（120g/㎡） (6)素土夯实（夯实系数大于0.93）											
8.1	50103009T	嵌草面层(嵌草砖 厚12cm)	m2	470.000	37.70	48.15			5.46	5.48		8.71	105.50
8.2	50101167T	草皮类(铺植草皮 嵌草砖)	m2	470.000	2.34	3.01			0.34	0.34		0.54	6.57
8.3	50103005T	垫层(碎石)	m3	70.500	25.13	158.95		0.60	11.75	11.79		18.74	226.96
8.4	50103005	垫层(碎石)	m3	47.000	25.13	159.12		0.60	11.76	11.80		18.76	227.17
8.5	50103001	园路路基整理路床	m2	470.000	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
9	050201003001	路牙铺设 (1)100*100*100厚芝麻灰弹石 镶边 (2)C20混凝土卧牢 (3)150厚C20混凝土垫层	m	208.000	27.54	52.80		0.44	5.14	5.15		8.20	99.27
9.1	50103067T	路沿、路牙(路沿石 直线)	m	208.000	12.39	20.71			2.11	2.11		3.36	40.68
9.2	50103073T	C20预拌非泵送普通混凝土路沿、路牙(侧缘砼基座)	m3	4.160	380.50	376.33		17.83	49.27	49.44		78.60	951.97
9.3	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	14.144	68.19	361.20		1.17	27.38	27.48		43.69	529.11
9.4	50103001	园路路基整理路床	m2	83.200	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
2. 园路挡墙													
园林建筑													
10	050307016004	挡墙 (1)30-40厚青色毛石片饰面 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)30-40厚青色毛石片饰面 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌砂垫层 (7)素土夯实, 夯实度≥93%	m3	83.700	516.94	479.05		5.52	63.69	63.91		101.63	1230.75
10.1	10104001	实心砖墙(实心标准砖墙)	m3	83.700	323.53	239.48		4.66	36.10	36.23		57.60	697.60
10.2	10112084T	外墙面面砖(每块面积≤0.01m2 水泥砂浆粘贴面砖灰缝5mm)	m2	148.800	80.50	100.75		0.18	11.54	11.58		18.41	222.96

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
10.3	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	20.088	68.19	21.66		1.17	5.79	5.81		9.24	111.86
10.4	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	30.132	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
10.5	50103001	园路路基整理路床	m2	111.368	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
3. 花池提升													
园林建筑													
11	050307016005	花池 (1)30-40厚青色毛石片饰面 (2)1:3水泥砂浆砌筑机砖 (3)20厚1:3水泥砂浆粘结层 (4)30-40厚青色毛石片饰面 (5)100厚C20混凝土垫层 (6)150厚碎石灌砂垫层 (7)素土夯实,夯实度≥93%	m3	36.000	648.66	643.00		6.42	82.56	82.83		131.72	1595.20
11.1	10104001	实心砖墙(实心标准砖墙)	m3	36.000	323.53	239.48		4.66	36.10	36.23		57.60	697.60
11.2	10112084T	外墙面面砖(每块面积≤0.01m2 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝5mm)	m2	64.000	80.50	100.75		0.18	11.54	11.58		18.41	222.96
11.3	10111121T	石板材(零星项目石板材楼地面 水泥砂浆结合 层)	m2	48.000	98.79	122.96		0.68	14.15	14.19		22.57	273.34
11.4	50103006T	C20垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	8.640	68.19	21.66		1.17	5.79	5.81		9.24	111.86
11.5	50103002T	垫层(碎石灌砂)	m3	12.960	67.40	153.51		0.71	14.10	14.14		22.49	272.35
11.6	50103001	园路路基整理路床	m2	47.900	7.27				0.46	0.46		0.74	8.93
4. 绿化提升													
绿化种植													
12	050102001001	栽植乔木 (1)鸡爪槭 (2)胸径8-9cm (3)高度:2m,冠幅:1.8m (4)带土球 (5)成活养护半年,日常养护半年 (6)全冠假植苗,冠幅饱满,树型优美 (7)10kg/株	株	81.000	83.29	831.66		9.35	58.81	59.01		93.83	1135.95

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
12.1	50101081	栽植乔木（带土球） 土球直径50cm以内	株	81.000	18.72	0.23			1.21	1.21		1.92	23.29
12.2	50102013T	单排、独立落叶乔木 米径10cm以内 假植苗 （含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	81.000	64.57	7.03		9.35	5.15	5.17		8.21	99.48
12.3	501BC001T	鸡爪槭 胸径8-9cm，H:2m，P: 1.8m 全冠假 植苗，冠幅饱满，树型优美	株	81.000		820.00			52.15	52.33		83.20	1007.68
12.4	501BC001	基肥	kg	810.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
13	050102002001	栽植灌木 (1)丛生紫薇 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 180-200cm (5)P: 150cm (6)多株拼丛，花淡粉，以高度冠幅为准，袋苗， 全冠，冠幅饱满，树型优美 (7)10kg/株	株	63.000	80.42	430.38		25.60	34.14	34.25		54.49	659.28
13.1	50101121	栽植灌木（带土球） 土球直径80cm以内	株	63.000	55.06	0.45		21.15	4.88	4.89		7.78	94.21
13.2	50102080T	落叶灌木 高度200cm以内 假植苗（含容器苗 、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	63.000	25.36	5.53		4.45	2.25	2.26		3.59	43.44
13.3	501EB001T	丛生紫薇 H: 180-200cm，P: 150cm 多株拼 丛，花淡粉，以高度冠幅为准，袋苗，全冠，冠幅 饱满，树型优美	株	63.000		420.00			26.71	26.80		42.62	516.13
13.4	501BC001	基肥	kg	630.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
14	050102002002	栽植灌木 (1)茶花 (2)带土球 (3)成活养护期半年日常养护期半年 (4)H: 110-130cm (5)P: 80-100cm (6)全冠容器苗，精品苗，冠幅饱满，树型优 美，大于三级分枝 (7)10kg/株	株	50.000	38.62	229.91		3.13	17.30	17.36		27.62	333.94
14.1	50101118	栽植灌木（带土球） 土球直径50cm以内	株	50.000	20.80	0.28			1.34	1.35		2.14	25.91

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
14.2	50102079T	落叶灌木 高度150cm以内 假植苗（含容器苗、袋装苗）成活养护期半年日常养护期半年	株	50.000	17.82	5.23		3.13	1.67	1.67		2.66	32.18
14.3	501EB001T	茶花 H：110-130cm，P：80-100cm 全冠容器苗，精品苗，冠幅饱满，树型优美，大于三级分枝	株	50.000		220.00			13.99	14.04		22.32	270.35
14.4	501BC001	基肥	kg	500.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
15	050102007039	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)36株/m2 (3)九里香 (4)H:30-35cm，P：25-30cm (5)5kg/m2	m2	148.200	12.43	56.24		3.28	4.58	4.60		7.33	88.46
15.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	148.200		49.73			3.16	3.17		5.05	61.11
15.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	148.200	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
15.3	501BC001	基肥	kg	741.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
16	050102007040	栽植色带 (1)成活养护半年，日常养护半年 (2)36株/m2 (3)墨西哥鼠尾草 (4)H:25-30cm，P：20-25cm (5)5kg/m2	m2	1445.800	12.43	49.04		3.28	4.12	4.14		6.59	79.60
16.1	50101156T	栽植地被植物 高40cm以内 片植	m2	1445.800		42.53			2.70	2.71		4.31	52.25
16.2	50102118T	栽植地被植物 片植 地栽苗成活养护期半年日常养护期半年	m2	1445.800	12.43	4.31		3.28	1.27	1.28		2.03	24.60
16.3	501BC001	基肥	kg	7229.000		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
17	050102012001	铺种草皮 (1)成活养护期半年日常养护期半年 (2)马尼拉 (3)满铺	m2	1092.400	10.15	11.89		2.25	1.55	1.55		2.48	29.87
17.1	50101162T	草皮类(铺植草皮 满铺)	m2	1092.400	1.87	8.36			0.65	0.65		1.04	12.57
17.2	50102121T	草坪类(草坪 满铺) 假植苗（含容器苗、袋	m2	1092.400	8.28	2.21		2.25	0.81	0.81		1.29	15.65

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		装苗）成活养护期半年日常养护期半年											
17.3	501BC001	基肥	kg	3277.200		0.44			0.03	0.03		0.05	0.55
18	050101010005	整理绿化用地 (1)绿地整理(整理绿化地) 客土回填	m2	2686.400	2.86			0.59	0.22	0.22		0.35	4.24
18.1	50101001T	绿地整理(整理绿化地) 客土回填	m2	2686.400	2.86			0.59	0.22	0.22		0.35	4.24
19	050101009005	种植土回(换)填 (1)符合设计要求 (2)30cm	m3	805.920	0.41	31.80		4.11	2.31	2.32		3.69	44.64
19.1	50101002T	绿地整理(回填土)	m3	805.920	0.41	31.80		4.11	2.31	2.32		3.69	44.64
5. 智慧导览导视系统及夜景													
电气工程													
		景观电气											
20	030404017001	配电箱 (1)景观配电箱AL-JQ (2)基础槽钢制作、安装 (3)M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 (4)100厚C15素混凝土垫层 (5)100厚C20素混凝土压顶 (6)280*20厚烧面灰麻饰面	台	1.000	490.46	3799.57	3500.00	107.63	87.01	59.08		408.92	4952.68
20.1	30402074T	成套配电箱安装(落地式)	台	1.000	243.56	3518.44	3500.00	102.51	35.32	23.99		353.14	4276.96
20.2	30407001	基础槽钢制作、安装	m	2.500	13.56	21.04		1.31	3.48	2.36		3.76	45.51
20.3	30404018	焊铜接线端子(导线截面≤16mm2)	个	5.000	2.00	4.04			0.59	0.40		0.63	7.66
20.4	10104001T	实心砖墙(实心标准砖墙)	m3	0.284	323.53	246.73		4.66	55.71	37.84		60.16	728.63
20.5	40305002T	C15基础(垫层 预拌非泵送普通混凝土)	m3	0.117	33.16	317.94			34.02	23.11		36.74	444.97
20.6	40106028T	C20压顶(现浇预拌非泵送普通混凝土)	m3	0.020	169.29	435.71		20.32	60.59	41.15		65.44	792.50
20.7	10112193T	石材墙面(外墙粘贴石材 水泥砂浆粘贴)	m2	1.072	96.88	86.14		0.11	17.75	12.05		19.16	232.09
21	040805004001	景观照明灯 (1)庭院灯H=3.5m 50W LED灯 AC220V 4000K IP65 (2)C20基础(预拌非泵送普通混凝土)	套	16.000	321.77	1682.19		44.50	198.50	134.83		214.36	2596.15

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(3)镀锌扁钢-25*4 (4)镀锌扁钢-40*4 L=110 (5)角钢接地极											
21.1	40905116T	庭院灯H=3.5m 36W LED灯 AC220V 4000K IP65	套	1.000	241.13	1557.84		25.40	176.78	120.07		190.91	2312.13
21.2	40902067T	基础制作 (C20预拌非泵送普通混凝土基础)	m3	0.216	132.03	374.88		43.84	53.37	36.25		57.63	698.00
21.3	40906007T	镀锌扁钢-25*4	m	1.000	16.83	3.39		0.22	1.98	1.35		2.14	25.91
21.4	40906007T	镀锌扁钢-40*4 L=110	m	0.110	16.83	3.39		0.22	1.98	1.35		2.14	25.91
21.5	40906003	接地极（板）制作安装(角钢接地极 普通土)	根	1.000	33.44	39.61		9.39	7.99	5.43		8.63	104.49
22	040504001005	砌筑井 (1)排水井垫层(砂砾石) (2)排水井垫层(砂碎石) (3)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (4)C20现浇现拌普通混凝土井室盖板(现拌普通混凝土井室盖板)	座	9.000	214.53	552.51		3.46	74.66	50.72		80.62	976.50
22.1	40501002T	排水井垫层(碎石)	m3	0.117	80.81	91.92		1.69	16.90	11.48		18.25	221.05
22.2	40501004	排水井垫层(砂碎石)	m3	0.140	78.78	130.33		1.69	20.43	13.87		22.06	267.16
22.3	40501007T	砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)	m3	0.394	209.71	1191.88		4.21	136.22	92.52		147.11	1781.65
22.4	40501025T	勾缝及抹灰(砖墙 抹灰 井内侧)	m2	2.800	26.67	3.26		0.40	2.94	2.00		3.17	38.44
22.5	40501103T	C20预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚10cm以内)	m3	0.065	330.49	483.94		0.32	78.95	53.62		85.26	1032.58
22.6	40304001T	预制混凝土(圆钢筋 φ10以内)	t	0.003	1047.18	3770.32		74.18	474.00	321.94		511.89	6199.51
22.7	40501113	安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.1m3以内))	m3	0.065	186.51	30.97			21.07	14.31		22.76	275.62
23	030411001002	配管 (1)材质:硬塑料管 (2)规格:PE32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐、油漆、接地	m	200.000	9.34	5.52			1.44	0.98		1.56	18.84
23.1	30412181T	砖、混凝土结构明配(外径≤32mm)	m	200.000	9.34	5.52			1.44	0.98		1.56	18.84

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
24	030411001004	配管 (1) 材质:硬塑料管 (2) 规格:PE25 (3) 名称:电气配管 (4) 接地要求:防腐、油漆、接地	m	640.000	8.49	3.11			1.12	0.76		1.21	14.69
24.1	30412179T	砖、混凝土结构明配(外径≤20mm)	m	640.000	8.49	3.11			1.12	0.76		1.21	14.69
25	030408001004	电力电缆 (1) 名称:电力电缆 (2) 型号:WDZC-YJY (3) 规格:4×25+1×16mm2 (4) 材质:铜芯 (5) 敷设方式、部位:室外 (6) 电压等级(kV):1KV	m	205.000	4.30	111.20		1.18	11.31	7.68		12.21	147.88
25.1	30409137T	室内铜芯电力电缆敷设 WDZC-YJY-4×25+1×16 五芯电力电缆敷设 室外敷设	m	205.000	4.30	111.20		1.18	11.31	7.68		12.21	147.88
26	030408001005	电力电缆 (1) 规格:YJV-3*4 (2) 名称:电缆	m	656.000	2.76	15.15		1.02	1.83	1.25		1.98	23.99
26.1	30409135T	YJV-3*4	m	656.000	2.76	15.15		1.02	1.83	1.25		1.98	23.99
27	030408001002	电力电缆 (1) 规格:YJV-2*4 (2) 名称:电缆	m	25.250	2.76	11.41		1.02	1.47	1.00		1.59	19.25
27.1	30409135T	YJV-2*4	m	25.250	2.76	11.41		1.02	1.47	1.00		1.59	19.25
28	030408001003	电力电缆 (1) 规格:YJV-5*10 (2) 名称:电缆	m	225.220	2.76	46.76		1.02	4.90	3.33		5.29	64.06
28.1	30409135T	YJV-5*10	m	225.220	2.76	46.76		1.02	4.90	3.33		5.29	64.06
29	030411004001	配线 (1) JHS-4*2.5	m	115.140	0.96	14.71			1.52	1.03		1.64	19.86
29.1	30413028T	JHS-4*2.5	单线	115.140	0.96	14.71			1.52	1.03		1.64	19.86
30	030411004002	配线	m	261.140	0.96	14.71			1.52	1.03		1.64	19.86

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
		(1)RVS -2X4											
30.1	30413028T	RVS -2X4	单线	261.140	0.96	14.71			1.52	1.03		1.64	19.86
31	030411006001	接线盒 (1)防水盒子 (2)明装	个	26.000	6.48	5.43			1.15	0.78		1.25	15.09
31.1	30413194T	接线盒安装(明装普通接线盒)	个	26.000	6.48	5.43			1.15	0.78		1.25	15.09
32	030506006001	背景音乐系统试运行 (1)名称:公共广播、背景音乐系统试运行(系统试运行)	系统	1.000	11788.99			246.14	1166.20	792.08		1259.41	15252.82
32.1	30506142	公共广播、背景音乐系统试运行(系统试运行)	系统	1.000	11788.99			246.14	1166.20	792.08		1259.41	15252.82
33	040101002002	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内	m3	505.550	2.99			2.87	0.57	0.39		0.61	7.42
33.1	40101008T	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%	m3	0.050	52.11				5.05	3.43		5.45	66.04
33.2	40101055	挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土)	m3	0.950	0.40			3.02	0.33	0.23		0.36	4.34
34	040103001005	填方 (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求	m3	504.640	2.62	0.36		3.71	0.65	0.44		0.70	8.48
34.1	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填碾压)	m3	504.640	2.62	0.36		3.71	0.65	0.44		0.70	8.48
排水工程													
35	040101002001	挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内	m3	235.515	2.99			2.87	0.57	0.39		0.61	7.43
35.1	40101008T	人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5%	m3	11.776	52.11				5.05	3.43		5.45	66.04
35.2	40101055	挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土)	m3	223.739	0.40			3.02	0.33	0.23		0.36	4.34

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
36	040103001003	填方 (1)符合设计要求 (2)机制砂 (3)符合设计要求	m3	26.370	2.12	80.11		1.82	8.14	5.53		8.79	106.51
36.1	40101108T	槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实)	m3	26.370	2.12	80.11		1.82	8.14	5.53		8.79	106.51
37	040103001004	填方 (1)符合设计要求 (2)原土 (3)符合设计要求	m3	208.770	2.62	0.39		3.71	0.65	0.44		0.70	8.51
37.1	40101106	槽、坑回填土(人机配合回填碾压)	m3	208.770	2.62	0.39		3.71	0.65	0.44		0.70	8.51
38	031001006006	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN25 (3)1.25Mpa	m	84.285	6.47	4.82		0.01	1.09	0.74		1.18	14.31
38.1	31001237T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内	m	84.285	6.47	4.82		0.01	1.09	0.74		1.18	14.31
39	031001006008	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN40 (3)1.25Mpa	m	14.365	7.14	7.63		0.01	1.43	0.97		1.55	18.73
39.1	31001238T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内	m	14.365	7.14	7.63		0.01	1.43	0.97		1.55	18.73
40	031001006009	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN50 (3)1.25Mpa	m	135.645	7.77	11.25		0.02	1.84	1.25		1.99	24.12
40.1	31001239T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内	m	135.645	7.77	11.25		0.02	1.84	1.25		1.99	24.12
41	031001006010	塑料管 (1)热熔连接 (2)PE100管DN63 (3)1.25Mpa	m	142.215	8.53	17.60		0.02	2.53	1.72		2.74	33.14
41.1	31001240T	室外塑料给水管(热熔连接) 外径63mm以内	m	142.215	8.53	17.60		0.02	2.53	1.72		2.74	33.14
42	031001006011	塑料管 (1)HDPE双壁波纹管管DN200	m	80.000	12.39	46.03		5.48	6.19	4.21		6.69	80.99

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
42.1	31001308T	室外塑料排水管(胶圈接口) 外径200mm以内	m	80.000	12.39	46.03		5.48	6.19	4.21		6.69	80.99
43	040504001003	砌筑井 (1)C15混凝土垫层 (2)C25现浇底板 (3)C25预拌非泵送细石混凝土盖板 (4)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) (5)预制混凝土(圆钢筋 Φ10以外) (6)井盖、井算安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (7)井盖、井算安装(安全防坠网) (8)井盖、井算安装(塑钢爬梯踏步) (9)05S502 16页	座	1.000	979.17	2036.49		24.33	294.58	200.07		318.11	3852.76
43.1	40501005T	C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土)	m3	0.340	175.37	330.38		0.70	49.08	33.33		53.00	641.86
43.2	40501005T	C25预拌非泵送普通混凝土现浇底板	m3	0.555	175.37	366.57		0.70	52.58	35.71		56.78	687.71
43.3	40501104T	C25预拌非泵送普通混凝土(矩形盖板 板厚20cm以内)	m3	0.220	327.83	487.92		0.32	79.08	53.71		85.40	1034.26
43.4	40501114	安装(渠道盖板 矩形盖板(每块体积在0.3m3以内))	m3	0.220	115.85	18.95		22.19	15.21	10.33		16.43	198.96
43.5	40501007	砌筑井壁(砖砌井壁 矩形)	m3	2.890	209.71	303.43		4.21	50.13	34.05		54.14	655.67
43.6	40304007T	现浇混凝土(螺纹钢筋 Φ10以外)	t	0.061	598.45	3497.49		61.88	402.89	273.64		435.09	5269.44
43.7	40304002	预制混凝土(圆钢筋 Φ10以外)	t	0.004	701.64	3687.33		92.55	434.26	294.95		468.97	5679.70
43.8	40304003T	预制混凝土(螺纹钢筋 Φ10以外)	t	0.037	578.95	3507.25		65.86	402.33	273.26		434.49	5262.14
43.9	40501039T	井盖、井算安装(检查井井盖、座 普通铸铁)	套	1.000	51.39	374.43			41.26	28.02		44.56	539.66
43.10	40501045	井盖、井算安装(塑钢爬梯踏步)	步	3.000	2.14				0.21	0.14		0.22	2.71
44	031003013001	水表 (1)水表组(闸阀 DN80 2个, 水表LXS-80 1个, 防止倒流器 DN80 1个)	组/个	1.500	253.58	1668.83		9.26	187.18	127.13		202.14	2448.12
44.1	31005324T	水表组(水表1个、蝶阀2个、止回阀1个、伸缩接头1个)	组	1.500	253.58	1668.83		9.26	187.18	127.13		202.14	2448.12
45	031003001003	螺纹阀门 (1)截止阀 DN50	个	9.000	31.85	184.53		2.09	21.17	14.38		22.86	276.88

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

序号	项目编码	项目名称及特征描述	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工费	材料费	其中： 设备费	施工机 具使用 费	企业管理 费	利润	规费	税金	
45.1	31005006T	闸阀 DN50	个	9.000	31.85	184.53		2.09	21.17	14.38		22.86	276.88
46	031003001004	螺纹阀门 (1)快速取水阀DN25 (2)C20基础 (3)卵石透水层	个	12.000	13.73	48.65			6.04	4.11		6.53	79.06
46.1	31005489T	喷泉喷头(普通喷头 洒水栓 DN25)	个	12.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
46.2	40305004T	C20基础(预埋非泵送普通混凝土)	m3	0.360	50.97	356.93			39.53	26.85		42.69	516.97
46.3	40106002T	滤沟、滤层(砂滤层)	m3	0.480	21.89	108.31			12.62	8.57		13.63	165.02
47	030109011001	潜水泵 (1)加压潜水泵, DN110 (2)Q=12.0L/S, H=40m, N=11kW	台	1.500	475.21	3315.78	3250.00	31.64	55.49	37.69		352.42	4268.23
47.1	30108122T	加压潜泵, DN110 Q=12.0L/S, H=40m, N=11kW	台	1.500	291.33	3256.60	3250.00	24.89	31.28	21.25		326.28	3951.63
47.2	30406018	交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤13kw)	台	1.500	183.88	59.18		6.75	24.21	16.44		26.14	316.60
48	030901003001	水喷淋(雾)喷头 (1)水喷淋(雾)喷头	个	8.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
48.1	31005489T	喷泉喷头(普通喷头 洒水栓 DN25)	个	8.000	11.33	33.61			4.35	2.96		4.70	56.95
村容村貌提升													
1. 垃圾桶													
园林建筑													
49	050307017002	垃圾箱 (1)垃圾箱 (2)做法详LD-14.02图7	个	10.000		850.00			54.06	54.24		86.25	1044.55
49.1	05B001	垃圾箱	个	10.000		850.00			54.06	54.24		86.25	1044.55

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第1页 共8页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			263074.29
二		材料					
1	01000030	型钢	综合	kg	5.560	3.363	18.70
2	01010030	钢筋	Φ10以内	kg	1.028	3.070	3.15
3	01010080	螺纹钢	HRB335Φ20以内	t	0.063	3275.000	207.77
4	01010210	螺纹钢	HRB400Φ20以内	t	0.038	3275.000	126.02
5	01030110	镀锌铁丝	16#	kg	0.346	8.340	2.88
6	01030140	镀锌铁丝	22#	kg	0.412	9.270	3.82
7	01030190	镀锌铁丝	Φ2.2~1.2	kg	3.360	8.220	27.62
8	01090200	圆钢	Φ10以内	kg	9.720	3.530	34.31
9	01090240	圆钢	Φ6	t	0.028	3600.000	99.14
10	01090300	圆钢	Φ12	t	0.004	3450.000	14.35
11	01130140	扁钢	45×4	kg	4.160	3.611	15.02
12	01130190	镀锌扁钢	综合	kg	5.993	4.270	25.59
13	01130240	镀锌扁钢	40×4	m	1.760	3.120	5.49
14	01130240	镀锌扁钢	25×4	m	16.000	3.120	49.92
15	01150020	六角空心钢	Φ22-25	kg	1.864	3.080	5.74
16	01190020	槽钢	综合	m	2.525	17.440	44.04
17	01290110	钢板	综合	kg	0.250	3.566	0.89
18	01290230	钢板	δ10-12	kg	26.920	3.500	94.22
19	01290570	普通钢板	0#-3# δ1.6-1.9	kg	0.150	3.522	0.53
20	01291750	热轧厚钢板	δ8.0~15	kg	1.466	3.900	5.72
21	01291790	热轧厚钢板	δ12~20	kg	2.015	3.880	7.82
22	01530010	封铅	含铅65% 锡35%	kg	7.796	48.670	379.45
23	02010180	橡胶板	δ1-3	kg	0.358	3.860	1.38
24	02051940	橡胶密封圈(室内排水)	DN200	个	13.440	8.360	112.36
25	02070240	橡胶垫	δ2	m2	1.142	3.420	3.91
26	02090050	塑料薄膜		m2	17.135	0.420	7.20
27	02130050	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	33.912	0.120	4.07
28	02270001	白布		kg	4.048	26.360	106.71
29	02270100	土工布		m2	0.013	4.600	0.06
30	02270110	土工布	300G	m2	0.071	4.870	0.34
31	02270260	棉纱		kg	1.605	5.220	8.38
32	02270310	破布		kg	0.066	5.800	0.38
33	03010440	铁钉		kg	20.388	9.930	202.45
34	03010550	圆钉		kg	5.996	9.930	59.54
35	03010750	木螺钉	M4×65	个	2620.928	0.100	262.09
36	03012600	地脚螺栓M18		套	65.280	15.000	979.20

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第2页 共8页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
37	03014970	六角螺栓		kg	2.952	6.460	19.07
38	03015420	膨胀螺栓	M6	个	145.035	6.150	891.97
39	03015460	膨胀螺栓	M10	套	37.720	1.540	58.09
40	03016970	六角螺栓带螺母、垫圈	M16×65~80	套	74.160	0.620	45.98
41	03130280	焊锡丝		kg	0.260	24.340	6.33
42	03130300	松香焊锡丝	综合	m	0.150	1.170	0.18
43	03130370	电焊条	结422 Φ3.2	kg	4.395	6.860	30.15
44	03130650	焊锡膏		kg	0.050	36.990	1.85
45	03130790	冲击钻头	Φ6~8	个	18.284	5.130	93.80
46	03130830	冲击钻头	Φ8	个	0.906	4.780	4.33
47	03130850	冲击钻头	Φ12	只	0.236	8.850	2.09
48	03130920	合金钻头	Φ10 一字型	个	1.165	5.470	6.37
49	03130970	合金钢钻头	Φ10	个	2.284	3.660	8.36
50	03131110	锯条	综合	根	5.544	0.440	2.44
51	03131120	钢锯条		根	26.176	0.230	6.02
52	03131180	砂轮片	Φ400	片	0.025	15.040	0.38
53	03131240	尼龙砂轮片	Φ100	片	0.156	2.110	0.33
54	03131270	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.237	8.880	2.10
55	03131320	石料切割锯片		片	2.793	14.160	39.55
56	03131360	塑料胀管	Φ6-8	个	2647.600	0.040	105.90
57	03131420	砂纸		张	0.036	0.250	0.01
58	03131480	铁砂布		张	1.771	0.880	1.56
59	03131490	铁砂布	0#-2#	张	0.500	0.810	0.41
60	03131590	低碳钢焊条	综合	kg	0.270	7.100	1.92
61	03131600	低碳钢焊条	J422 综合	kg	0.180	7.100	1.28
62	03131630	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	2.136	7.100	15.17
63	03131890	锡基钎料		kg	0.376	42.480	15.98
64	03210610	零星卡具		kg	0.864	5.730	4.95
65	03210660	平垫铁	综合	kg	0.300	4.480	1.34
66	04010001	水泥	32.5	kg	9723.607	0.345	3354.64
67	04010010	水泥	42.5	kg	174.295	0.370	64.49
68	04010170	散装水泥	42.5	kg	39988.732	0.345	13796.11
69	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	21.164	111.650	2362.93
70	04030150	中(粗)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	0.994	111.650	111.00
71	04030150	中(粗)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	0.700	111.650	78.19
72	04030174	机制砂	用于回填、垫层	m3	43.283	67.960	2941.52
73	04030174	机制砂	用于回填、垫层	m3	27.119	67.960	1843.01
74	04030174	机制砂	用于回填、垫层	m3	30.932	67.960	2102.14

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第3页 共8页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
75	04030230	净干砂（机制砂）		m3	95.488	111.650	10661.25
76	04050200	碎石	Φ5-10（细石）	m3	32.180	120.000	3861.57
77	04050240	碎石	Φ5-31.5	m3	68.058	120.000	8167.00
78	04050250	碎石	Φ5-40	m3	159.634	120.000	19156.10
79	04050290	碎石	Φ20-40	m3	62.322	120.000	7478.64
80	04050410	碎石（级配）		m3	93.483	119.870	11205.81
81	04050430	卵石		m3	0.540	96.360	51.99
82	04090030	粉煤灰	II级	kg	5835.212	0.180	1050.34
83	04090360	粘土膏		m3	2.612	29.010	75.77
84	04090370	种植土		m3	746.222	34.340	25625.27
85	04110090	芝麻灰弹石 镶边	100*100*100厚	m	208.000	20.000	4160.00
86	04130170	青砖	240×115×53 MU10	块	1932.215	1.950	3767.82
87	04130450	植草砖	500×500×10	m2	479.400	42.640	20441.62
88	04130540	烧结煤矸石普通砖	240×115×53	块	66519.130	0.370	24612.08
89	04130720	水泥实心砖	240×115×53 MU10	块	1574.761	0.350	551.17
90	05030220	松木锯材		m3	1.690	1379.000	2330.68
91	05050050	胶合板	13厚	m2	0.379	26.550	10.07
92	08030001	青色毛石片	30-40	m2	247.890	106.000	26276.37
93	08030100	烧面灰麻饰面	280*20厚	m2	1.093	80.000	87.48
94	08030140	青石板	600*300*50厚	m2	678.300	130.000	88179.00
95	13010160	酚醛调和漆		kg	0.075	11.970	0.90
96	13010390	煤焦沥青漆	L01-17	kg	2.504	10.620	26.59
97	13030290	沥青漆		kg	0.338	8.140	2.75
98	13050100	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.020	9.910	0.20
99	13050220	沥青绝缘漆		kg	1.142	13.180	15.05
100	13350210	模板嵌缝料		kg	0.021	4.000	0.08
101	14030060	汽油	92#	kg	9.617	9.030	86.84
102	14070001	白铅油		kg	0.105	6.160	0.65
103	14070130	机油	综合	kg	0.432	5.540	2.39
104	14070250	清油	C01-1	kg	0.024	6.270	0.15
105	14090010	电力复合酯	综合	kg	0.095	25.400	2.41
106	14330190	硬脂酸	一级	kg	1.142	7.790	8.90
107	14350570	脱模剂		kg	16.787	2.920	49.02
108	14350690	药剂		kg	43.110	21.450	924.71
109	14350890	润滑剂		kg	2.080	4.120	8.57
110	14351100	减水剂	WR-S	kg	328.925	3.570	1174.26
111	14390180	氧气		m3	2.114	4.010	8.48

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第4页 共8页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
112	14390190	乙炔气		kg	0.705	21.350	15.04
113	14410760	粘合剂	507	kg	0.840	7.560	6.35
114	15010420	石棉橡胶板	低压 δ 0.8-6	kg	1.368	7.270	9.95
115	17010430	焊接钢管	DN20	m	0.608	5.944	3.62
116	17070030	无缝钢管	Φ22×2	m	0.108	5.750	0.62
117	17250001	塑料管		kg	0.300	7.950	2.38
118	17252180	HDPE双壁波纹管(8kN/m2)	Φ200	m	79.440	43.740	3474.71
119	17252630	PE给水管	Φ25	m	85.971	3.420	294.02
120	17252640	PE给水管	Φ40	m	14.652	5.870	86.01
121	17252650	PE给水管	Φ50	m	138.358	8.960	1239.69
122	17252660	PE给水管	Φ63	m	145.059	14.730	2136.72
123	17270250	橡胶软管	DN20	m	0.278	10.650	2.96
124	17310780	输水软管	Φ25	m	0.216	3.580	0.77
125	18092210	室外塑料给水管热熔管件	Φ32	个	23.853	4.310	102.80
126	18092220	室外塑料给水管热熔管件	Φ40	个	4.252	5.090	21.64
127	18092230	室外塑料给水管热熔管件	Φ50	个	38.794	6.850	265.74
128	18092240	室外塑料给水管热熔管件	Φ63	个	39.962	8.450	337.68
129	18150970	黑玛钢活接头	DN25	个	20.200	4.960	100.19
130	18151000	黑玛钢活接头	DN50	个	9.090	14.600	132.71
131	18151100	金属软管活接头	Φ25	套	3.060	8.250	25.25
132	18151800	黑玛钢六角内接头	DN50	个	7.272	6.640	48.29
133	19002300	螺纹阀门	DN15	个	0.072	10.220	0.74
134	19002310	螺纹阀门	DN20	个	0.180	12.580	2.26
135	19002350	闸阀	DN50	个	9.090	156.620	1423.68
136	19030030	法兰蝶阀	DN80	个	3.000	334.610	1003.83
137	19090110	止回阀	DN80	个	1.500	609.510	914.27
138	19410190	洒水栓	DN25	个	20.000	28.500	570.00
139	20011500	伸缩接头	DN80	片	1.500	23.230	34.85
140	22450045	高压风管	Φ25-6P-20m	m	0.233	24.140	5.63
141	24010040	法兰水表	DN80	个	1.500	306.640	459.96
142	24110190	弹簧压力表	Y-100 0-1.6MPa	块	0.306	53.430	16.32
143	24590040	压力表弯管	DN15	个	0.306	13.270	4.05
144	25330710	庭院灯H=3.5m	36W LED灯 AC220V 4000K IP65	套	16.160	1480.000	23916.80
145	27060040	角钢接地极	50×5 2.5m	根	16.000	37.500	600.00
146	27170170	自粘性塑料带	20×20000	卷	0.200	13.270	2.65
147	27170180	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	4.249	3.540	15.04
148	27170180	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	0.300	4.420	1.33
149	27170190	黄腊带	20mm×10m	卷	0.120	4.870	0.58
150	27170190	黄腊带	20mm×10m	卷	2.100	11.500	24.15

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第5页 共8页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
151	28000010	JHS-4*2.5		m	120.897	13.850	1674.42
152	28000010	RVS	-2X4	m	274.197	13.850	3797.63
153	28110020	室内铜芯电力电缆敷设	WDZC-YJY-4×25+1×16 五芯电力电缆敷设 室外 敷设	m	207.050	105.570	21858.27
154	28110020	YJV-3*4		m	662.560	11.200	7420.67
155	28110020	YJV-2*4		m	25.503	7.500	191.27
156	28110020	YJV-5*10		m	227.472	42.500	9667.57
157	29060320	金属软管	Φ25	m	1.236	2.900	3.58
158	29060930	PE32		m	212.000	4.200	890.40
159	29060930	PE25		m	678.400	2.000	1356.80
160	29061390	难燃塑料管接头	20	个	134.400	0.150	20.16
161	29061410	难燃塑料管接头	32	个	42.000	0.420	17.64
162	29061470	难燃塑料管卡子	20	个	1075.200	0.130	139.78
163	29061490	难燃塑料管卡子	32	个	243.600	0.270	65.77
164	29061540	难燃塑料管三通	20	个	20.480	0.220	4.51
165	29061560	难燃塑料管三通	32	个	6.400	0.400	2.56
166	29061610	难燃塑料管伸缩接头	20	个	13.440	3.970	53.36
167	29061630	难燃塑料管伸缩接头	32	个	4.200	6.940	29.15
168	29061680	难燃塑料管弯头	20	个	13.440	0.310	4.17
169	29061700	难燃塑料管弯头	32	个	4.200	0.400	1.68
170	29090300	铜接线端子	DT-10	个	2.540	1.770	4.50
171	29090310	铜接线端子	DT-16	个	2.540	2.500	6.35
172	29110110	接线盒		个	26.520	5.140	136.31
173	29250020	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	62.968	30.170	1899.75
174	29250090	镀锌电缆卡子	2×35	套	267.279	3.150	841.93
175	32070001	草皮		m ²	1380.240	7.430	10255.18
176	32070001	九里香	H:30-35cm, P: 25-30cm	株	5335.200	1.200	6402.24
177	32070001	墨西哥鼠尾草	H:25-30cm, P: 20-25cm	株	52048.800	1.000	52048.80
178	32270001	肥料		kg	13927.687	0.440	6128.18
179	33010280	钢支撑		kg	0.034	5.310	0.18
180	33010280	钢支撑		kg	0.064	5.290	0.34
181	33050060	铸铁爬梯		kg	30.084	6.900	207.58
182	33050060	铸铁爬梯		kg	24.519	6.840	167.71
183	33410550	塑钢爬梯		步	3.030		
184	34110030	电		kW·h	0.086	0.660	0.06
185	34110030	电		kW·h	33.324	0.680	22.66

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第6页 共8页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
186	34110030	电		kW·h	9.000	0.680	6.12
187	34110080	水		m3	16.210	3.690	59.82
188	34110080	水		m3	409.207	3.690	1509.98
189	34110080	水		m3	0.751	3.690	2.77
190	34110080	水		m3	827.935	3.010	2492.08
191	34110080	水		m3	32.482	3.280	106.54
192	34130010	标志牌	塑料扁形	个	68.533	0.880	60.31
193	35010001	钢模板		kg	0.017	6.190	0.11
194	35010020	组合钢模板		kg	3.842	5.750	22.09
195	35020001	钢模支撑		kg	3.145	6.190	19.47
196	35020160	钢模板连接件		kg	0.507	5.750	2.91
197	36010260	铸铁井盖井座		套	1.010	350.000	353.50
198	49010001	定额人工费		元	10258.944	1.000	10258.94
199	49010030	其他材料费		%	631.223	1.000	631.22
200	49010030	其他材料费		%	649.980	1.000	649.98
201	49010040	其他材料费		元	140.410	1.000	140.41
202	49010040	其他材料费		元	10.615	1.000	10.61
203	49011001	基肥		kg	13187.200	0.440	5802.37
204	49011004	鸡爪槭	胸径8-9cm, H:2m, P: 1.8m 全冠假植苗, 冠幅饱满, 树型优美	株	81.000	820.000	66420.00
205	49019263	丛生紫薇	H: 180-200cm, P: 150cm 多株拼丛, 花淡粉, 以高度冠幅为准, 袋苗, 全冠, 冠幅饱满, 树型优美		63.000	420.000	26460.00
206	49019263	茶花	H: 110-130cm, P: 80-100cm 全冠容器苗, 精品苗, 冠幅饱满, 树型优美, 大于三级分枝		50.000	220.000	11000.00
207	49019268	垃圾箱		个	10.000	850.000	8500.00
208	49019268	展示牌		个	1.000	35000.000	35000.00
209	49019268	解说牌		个	1.000	12000.000	12000.00
210	80010020	水泥砂浆	1:2(32.5)	m3	0.276	294.488	81.38
211	80010020	水泥砂浆	1:2(32.5)	m3	0.012	294.488	3.61
212	80010020	水泥砂浆	1:2(32.5)	m3	0.002	294.692	0.74
213	80010020	水泥砂浆	1:2(32.5)	m3	0.030	294.569	8.72
214	80010040	水泥砂浆	1:3(32.5)	m3	20.482	254.370	5210.08
215	80010150	砌筑水泥砂浆	M5(32.5)	m3	0.811	191.376	155.13
216	80010160	砌筑水泥砂浆	M7.5(32.5)	m3	0.059	198.276	11.70
217	80010210	砌筑水泥砂浆	M7.5(42.5)	m3	0.661	197.007	130.15
218	80010220	砌筑水泥砂浆	M10(42.5)	m3	0.085	212.096	18.12

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第7页 共8页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
219	80010220	砌筑水泥砂浆	M10(42.5)	m3	0.020	212.177	4.17
220	80010340	干硬性水泥砂浆	1:3	m3	1.469	290.600	426.83
221	80010460	现拌抹灰砂浆	1:1 M55(42.5) 砂子 4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.149	538.555	80.22
222	80010460	现拌抹灰砂浆	1:1 M55(42.5) 砂子 4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.007	538.351	3.75
223	80010480	现拌抹灰砂浆	1:2 M45(42.5) 砂子 4.75mm 稠度50~70mm	m3	1.319	333.505	440.01
224	80050150	现拌混合砂浆	M5(42.5)	m3	24.874	163.368	4063.56
225	80110110	素水泥浆		m3	0.718	519.297	372.75
226	80213570	预拌非泵送普通混凝土	C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	0.464	312.620	145.01
227	80213575	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	95.353	334.520	31897.54
228	80213575	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	4.417	352.600	1557.53
229	80213575	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	4.487	337.860	1516.08
230	80213580	预拌非泵送普通混凝土	C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	0.787	347.570	273.41
231	80270150	透水水泥混凝土	C20(42.5)	m3	29.159		
三		设备					
1	23050001	加压潜泵	DN110 Q=12.0L/S, H=40m, N=11kW	套	1.500	3250.000	4875.00
2	55090001	成套配电箱		台	1.000	3500.000	3500.00
四		施工机具					
1	98050060	真有效值万用表	数据存储型	台班	4.000	8.270	33.08
2	98110100	高压绝缘电阻测试仪		台班	1.599	39.840	63.71
3	98170020	对讲机		台班	10.000	5.510	55.10
4	98260010	声级计		台班	4.000	3.260	13.04
5	98470070	STIPA测试仪		台班	4.000	25.990	103.96
6	98470140	笔记本电脑		台班	4.000	10.240	40.96
7	99010030	履带式单斗挖掘机	液压 斗容量1.25m3	台班	2.037	1425.036	2903.21
8	99010130	轮胎式单斗挖掘机	液压 斗容量0.6m3	台班	2.149	742.390	1595.49
9	99050010	电动滚筒式混凝土搅拌机	出料容量400L	台班	0.233	251.784	58.76
10	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	7.338	162.197	1190.20
11	99070030	履带式推土机	功率75kW	台班	4.331	873.639	3783.51
12	99070270	轮胎式装载机	斗容量1.0m3	台班	1.854	914.341	1694.84
13	99070280	轮胎式装载机	斗容量1.5m3	台班	0.713	1043.708	744.33
14	99070510	载货汽车	装载质量4t	台班	0.050	531.563	26.58
15	99070520	载货汽车	装载质量5t	台班	0.952	543.701	517.51
16	99070530	载货汽车	装载质量6t	台班	0.245	563.399	138.23
17	99070540	载货汽车	装载质量8t	台班	3.425	622.627	2132.68

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：南安市九都镇“润泽库区、造福移民”工程-金圭村

第8页 共8页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
18	99070670	自卸汽车	装载质量15t	台班	4.602	958.354	4410.35
19	99070870	机动翻斗车	装载质量1t	台班	0.580	284.339	164.96
20	99090300	汽车式起重机	提升质量5t	台班	3.504	500.068	1752.11
21	99090310	汽车式起重机	提升质量8t	台班	1.340	837.291	1121.60
22	99090640	叉式起重机	提升质量5t	台班	0.061	614.628	37.34
23	99091170	电动卷扬机	单筒慢速 牵引力50kN	台班	0.010	168.615	1.62
24	99130200	振动压路机	工作质量15t	台班	1.413	971.360	1372.10
25	99130280	电动夯实机	夯击能力20~62N.m	台班	8.222	27.160	223.31
26	99170020	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.016	38.824	0.62
27	99170040	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.034	23.829	0.82
28	99190860	管子切断套丝机	Φ159	台班	0.342	20.039	6.85
29	99191820	石料切割机		台班	13.367	17.000	227.23
30	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.412	23.964	9.87
31	99210050	木工平刨床	刨削宽度500mm	台班	0.009	21.745	0.19
32	99210060	木工单面压刨床	刨削宽度 600mm	台班	0.005	30.071	0.14
33	99230050	砂轮切割机	Φ400	台班	0.056	5.460	0.30
34	99250001	交流弧焊机	容量21kVA	台班	3.097	54.398	168.44
35	99250010	交流弧焊机	容量30kVA	台班	0.051	89.460	4.60
36	99250110	直流弧焊机	容量 32kV·A	台班	0.164	83.653	13.75
37	99250150	对焊机	容量75kVA	台班	0.010	102.380	1.02
38	99250560	电焊机		台班	0.395	60.840	24.06
39	99310030	洒水车	罐容量4000L	台班	11.245	600.511	6752.59
40	99330060	风动凿岩机	手持式	台班	5.535	11.151	61.72
41	99430170	电动空气压缩机	排气量0.6m ³ /min	台班	0.140	34.592	4.83
42	99430260	内燃空气压缩机	排气量3m ³ /min	台班	2.797	250.988	701.94
43	99440010	电动单级离心清水泵	出口直径Φ100	台班	0.086	31.424	2.69
44	99440460	试压泵	压力3MPa	台班	0.319	16.431	5.24
45	99450780	电焊条恒温箱		台班	0.017	53.185	0.88
46	99450790	电焊条烘干箱	容积450×350×450	台班	0.016	15.830	0.26
47	99450810	电焊条烘干箱	容积600×500×750	台班	0.017	24.892	0.41
